标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
1			1 Coursewor initiation and project	3 个工作日	2026年9月7日	2026年9月9日				
2			2 Requireme engineerin	31 个工作日	2026年9月9日	2026年10月21日				
3			3 System design and	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日				
4			4 Backend platform and data	28 个工作日	2026年9月16日	2026年10月23日				
5			5 Map and place data	9 个工作日	2026年9月16日	2026年9月28日				

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
6			6 AI agent and Hermes	16 个工作日	2026年9月16日	2026年10月7日				
7			7 Frontend UI and	12 个工作日	2026年9月16日	2026年10月1日				
8			8 Integration and	6 个工作日	2026年9月16日	2026年9月23日				
9			9 Verification and defect	20 个工作日	2026年9月24日	2026年10月21日				
10			10 Coursewor deliverable and	23 个工作日	2026年9月23日	2026年10月23日				

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
11			11 Final acceptance documenta and	5 个工作日	2026年10月19日	2026年10月23日				
12			M10 Part 1 course deadline (contract 2026-10-0 missed)	0 个工作日	2026年9月29日	2026年9月29日				
13			M9 System test ready	0 个工作日	2026年10月6日	2026年10月6日				

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
14			M11 Mid-term teacher review (scheduled 2026-10-2 noon)	0 个工作日	2026年10月16日	2026年10月16日				
15			M12 Part 2 course deadline (contract 2026-11-0	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日				
16			M13 Coursewor delivery (plan)	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日				


项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

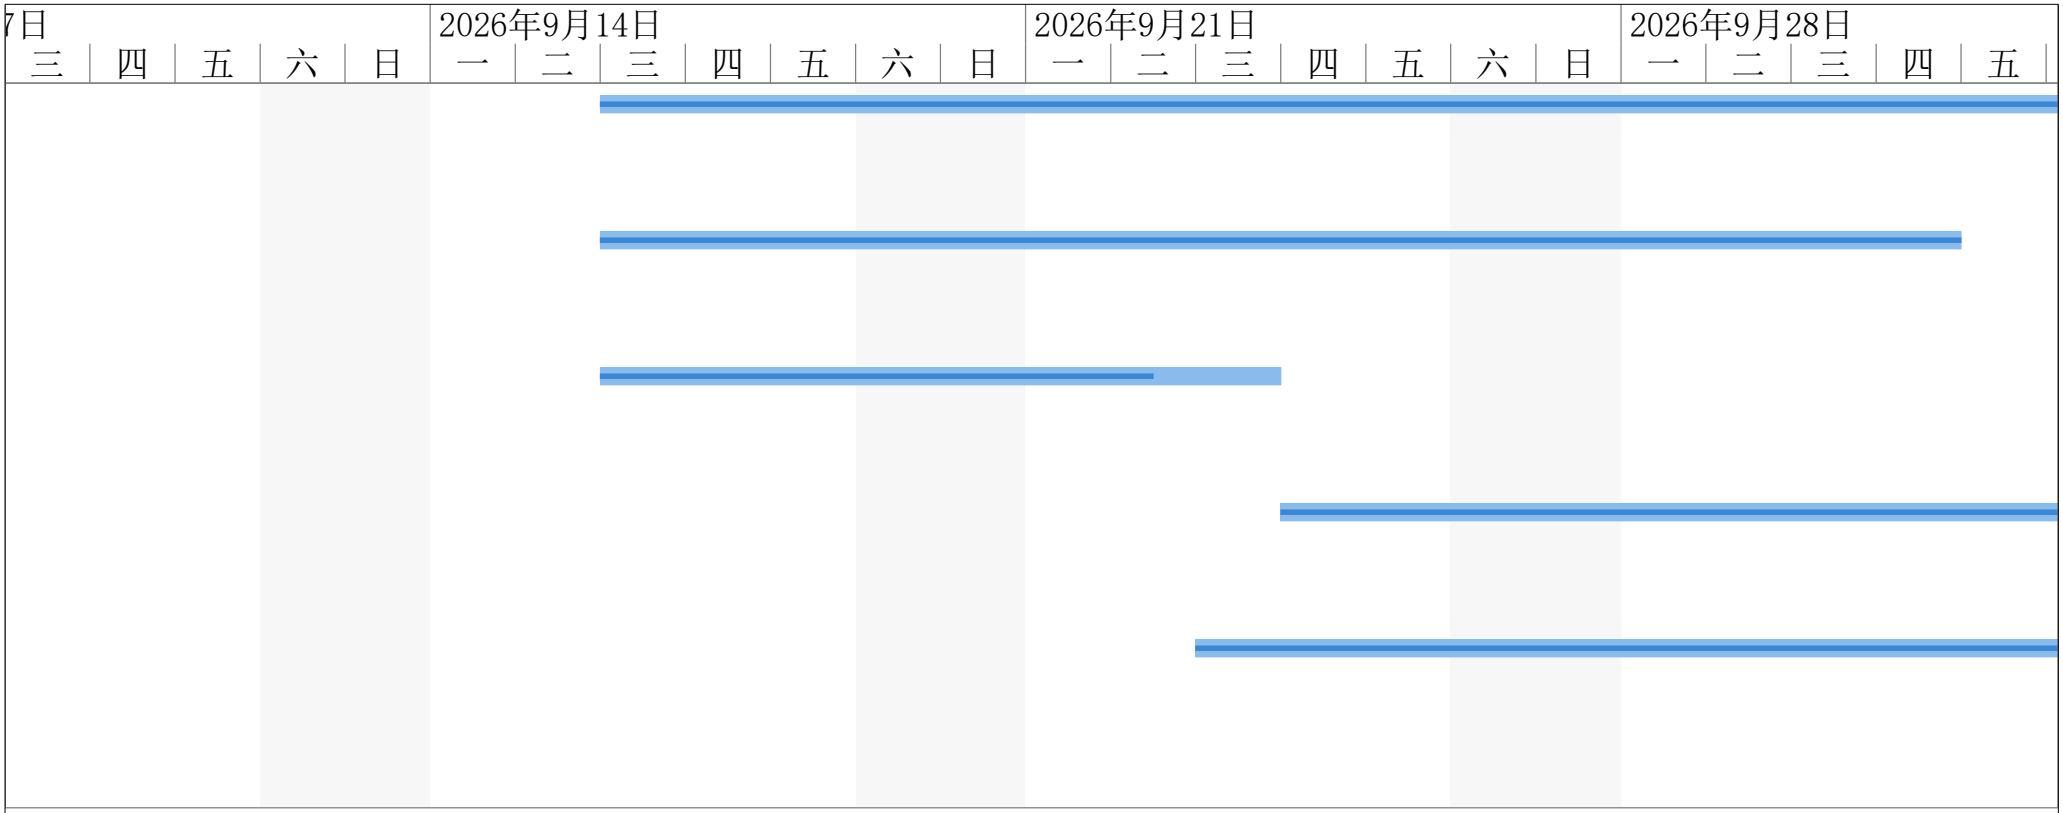

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

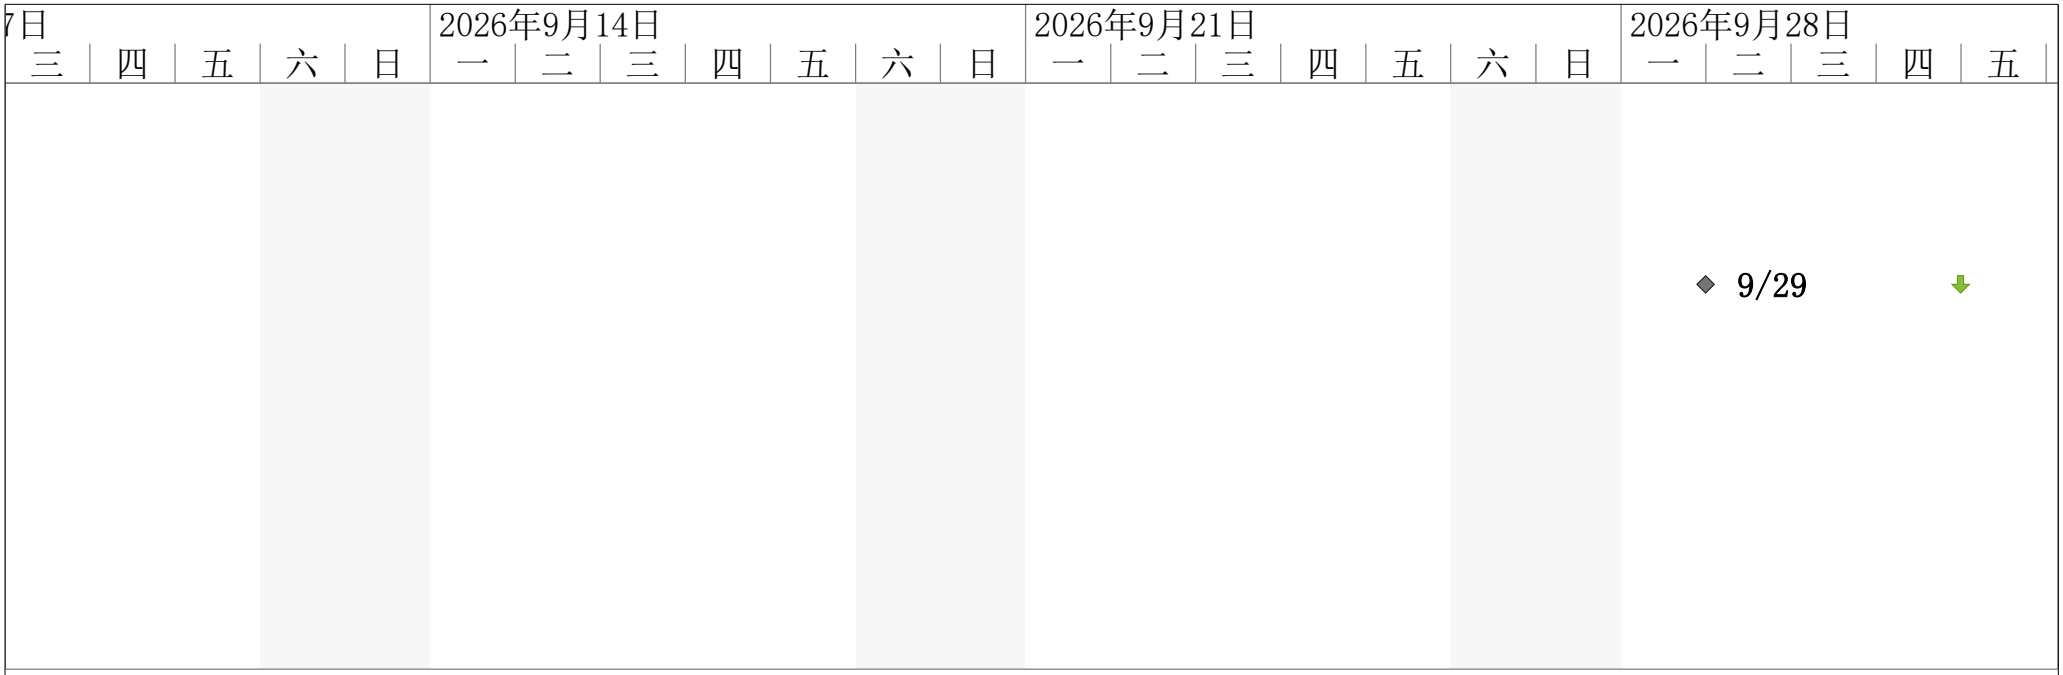


项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

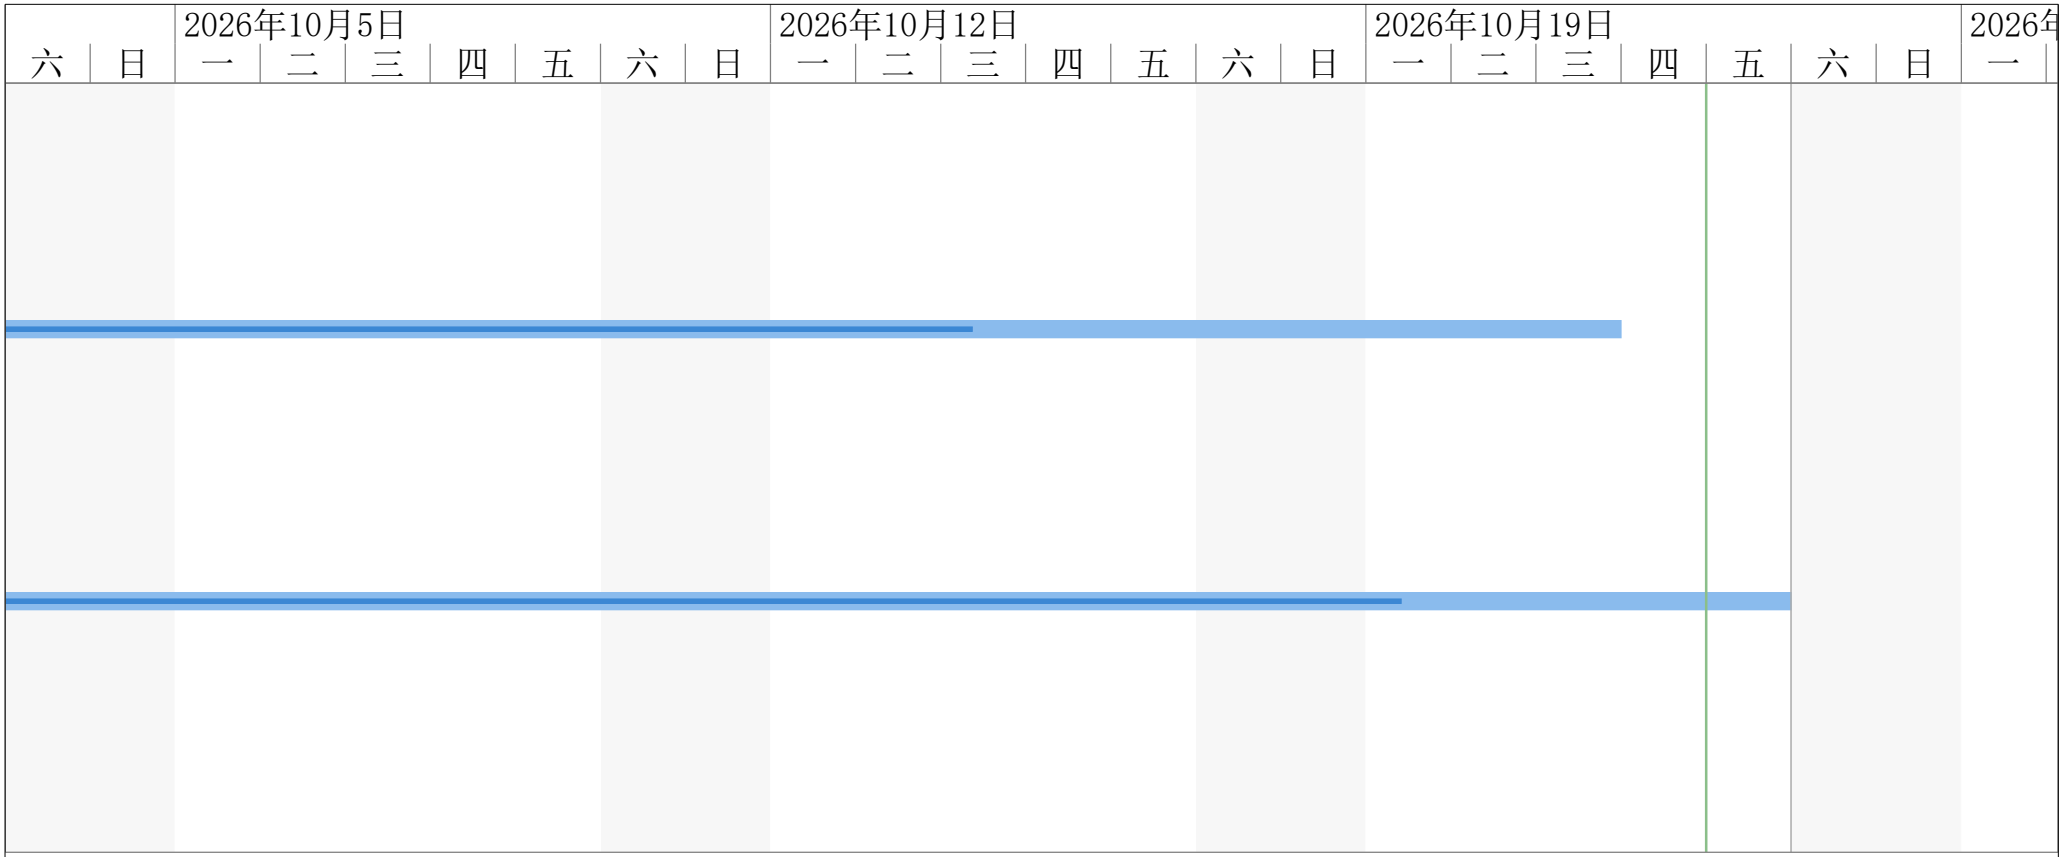

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

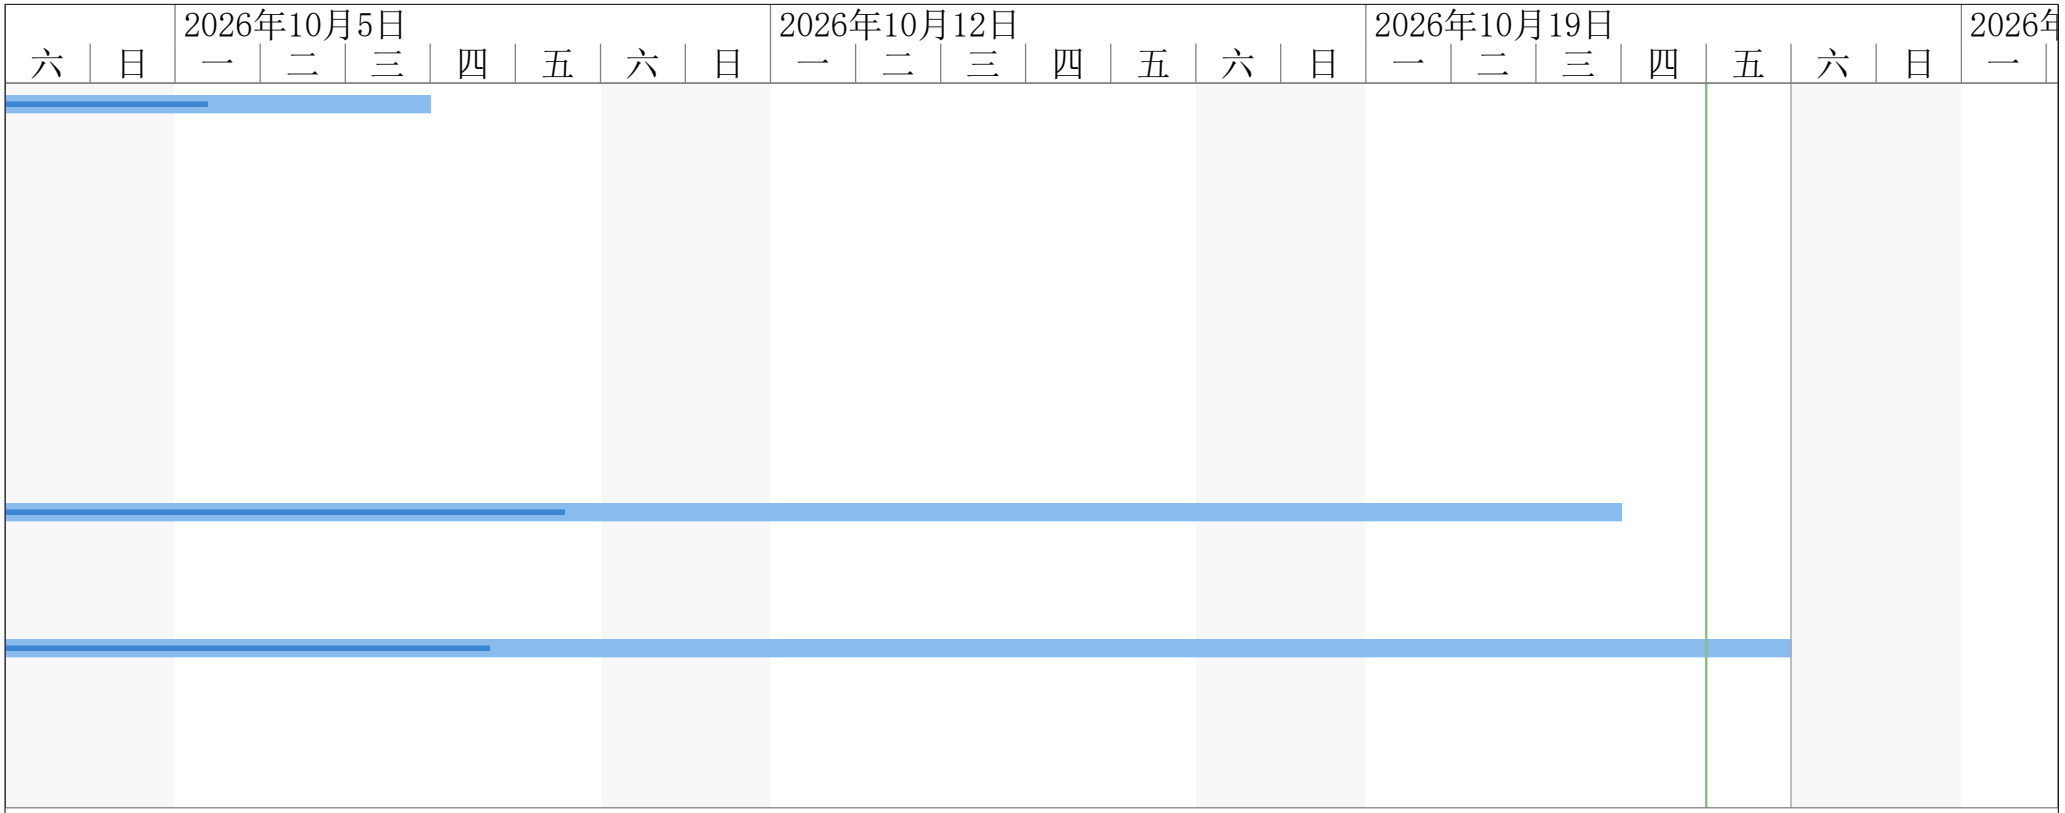


项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

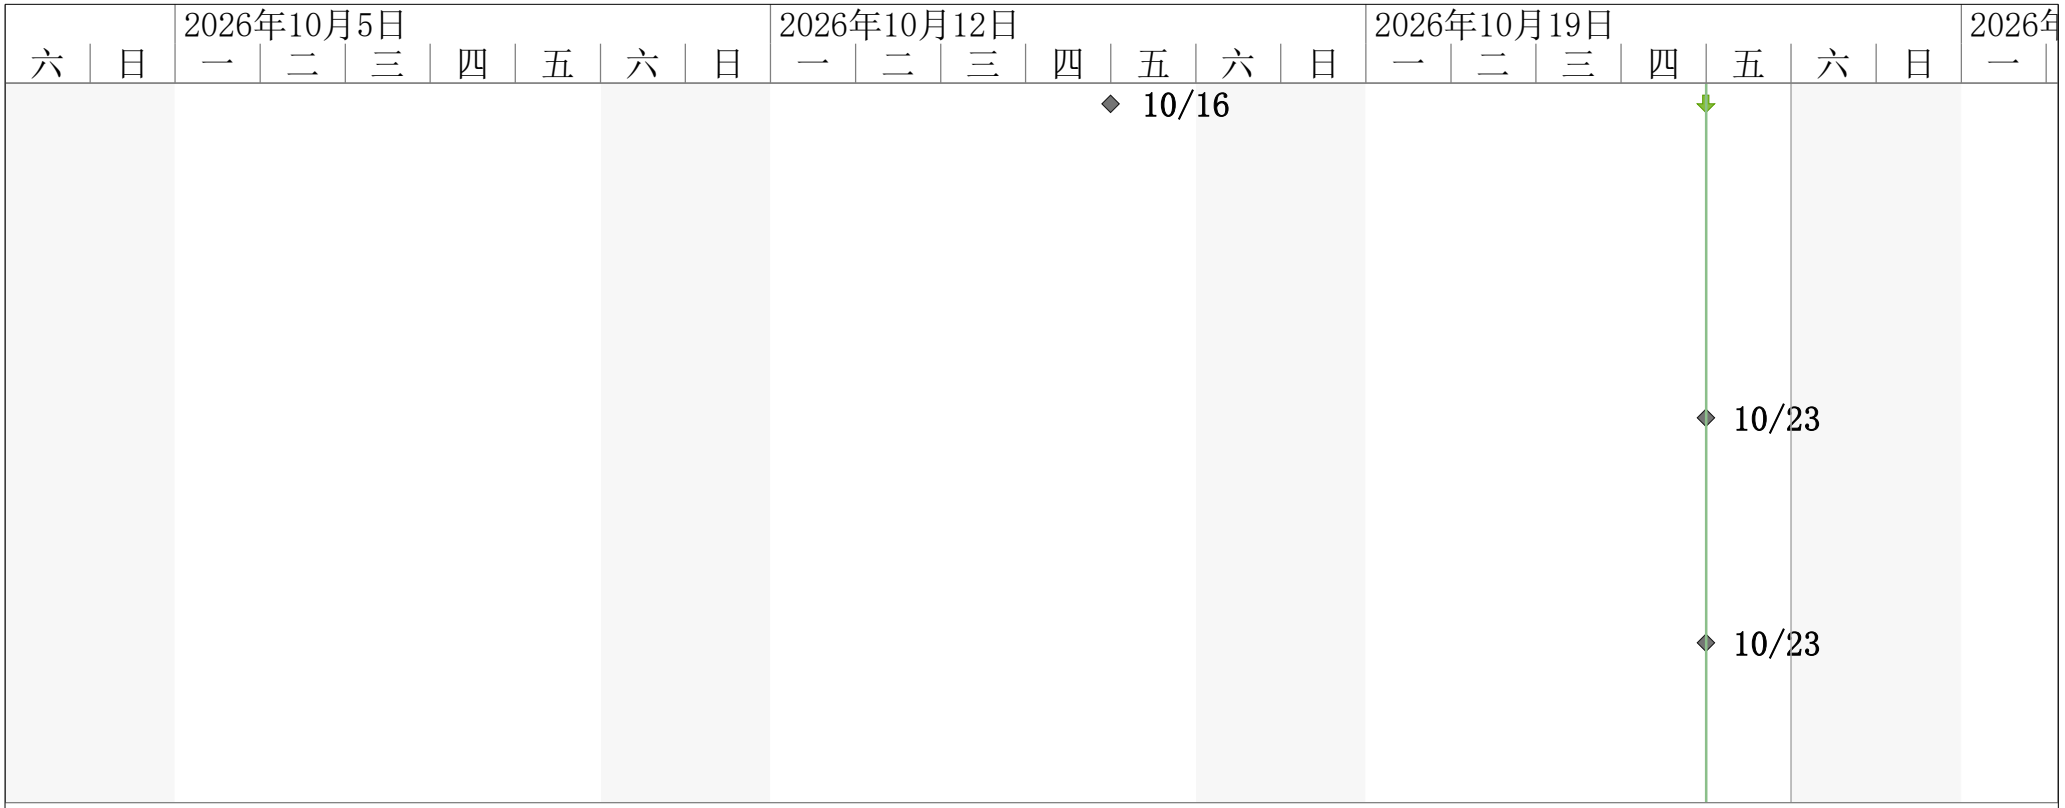

项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度
