
CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1	✓		**1 Coursew**	**3 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
2	✓		1.1 Read	1 个工作日	2026年9月	2026年9月		Yang Jianbin 08
3	✓		1.2 Selec	1 个工作日	2026年9月	2026年9月	2	Yang Jianbin 08
4	✓		1.3 Confi	2 个工作日	2026年9月	2026年9月	3SS	Yang Jianbin 08
5	✓		M1 Topic	0 个工作日	2026年9月	2026年9月	3	
6			**2 Require**	**31 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
7	✓		2.1 Resea	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	5	Yang Jianbin 08
8	✓		2.2 Write	5 个工作日	2026年9月	2026年9月	7SS	Yang Jianbin 08
9	✓		2.3 Dom	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	8SS	Yang Jianbin 08
10	✓		M2 Requ	0 个工作日	2026年9月	2026年9月	8,9	
11			2.4 Get t	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	60	Yang Jianbin 08
12	✓		**3 System**	**5 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
13	✓		3.1 Layer	5 个工作日	2026年9月	2026年9月	10	Yang Jianbin 08
14	✓		3.2 Interf	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	13SS	Yang Jianbin 08
15	✓		3.3 Micro	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	14SS	Wang Jiarui 08
16	✓		M3 Archi	0 个工作日	2026年9月	2026年9月	13,14,15	




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
17			**4 Backenc**	**28 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
18			4.1 FastA	10 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	13SS	Yang Jianbin 08
19			4.2 SQLA	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Yang Jianbin 08
20			4.3 Journ	12 个工作日	2026年9月1	2026年10月	18SS	Yang Jianbin 08
21			4.4 Twin,	6 个工作日	2026年9月2	2026年10月	19	Wang Jiarui 080
22			4.5 Comi	14 个工作日	2026年10月	2026年10月	21	Yang Jianbin 08
23			M4 Core	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	20,21	
24			**5 Map an**	**9 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
25			5.1 Geoc	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Wang Jiarui 080
26			5.2 Conte	3 个工作日	2026年9月1	2026年9月1	25SS	Wang Jiarui 080
27			5.3 Mobi	4 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	26SS	Wang Jiarui 080
28			5.4 Deter	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	25	Wang Jiarui 080
29			M5 Provi	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	26,28	
30			**6 AI agen**	**16 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
31			6.1 Inten	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	20SS	Wang Xinyue 0
32			6.2 Missi	6 个工作日	2026年9月2	2026年9月3	31	Wang Xinyue 0

日 | 2026年9月7日 一 二 三

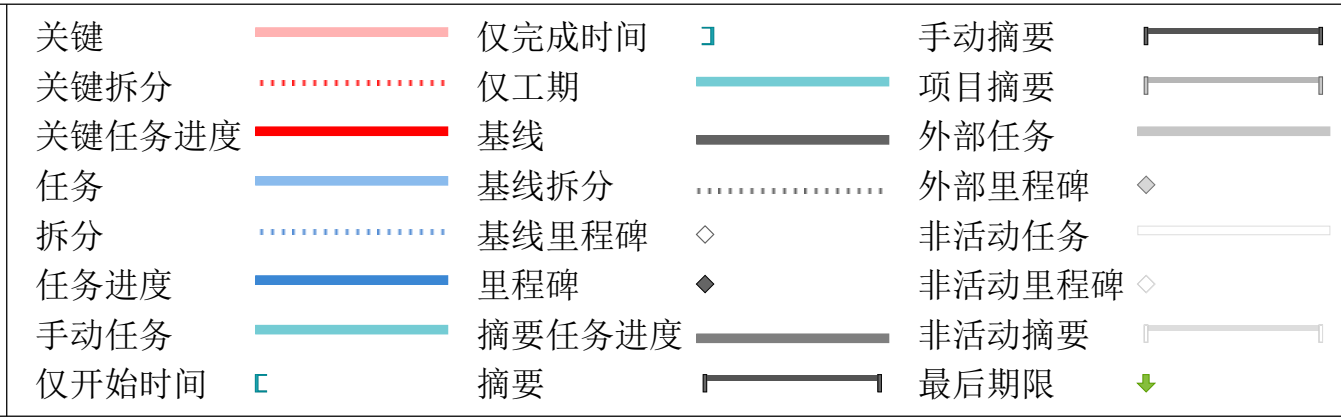


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
33		6.3 Tool	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	32SS	Wang Xinyue 0
34		6.4 Eleve	4 个工作日	2026年9月3	2026年10月	33	Wang Xinyue 0
35		6.5 Nativ	6 个工作日	2026年9月3	2026年10月	34SS	Codex co-deve
36		M6 Ager	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	34	
37		**7 Fronten**	**12 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
38		7.1 V8Ex	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Wang Xinyue 0
39		7.2 Mapl	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	38SS	Wang Xinyue 0
40		7.3 Copil	6 个工作日	2026年9月2	2026年10月	39	Wang Xinyue 0
41		M7 Front	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	40	
42		**8 Integrat**	**6 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
43		8.1 Auth	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	39SS	Yang Jianbin 08
44		8.2 Back	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	43SS	Codex co-deve
45		M8 Integ	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	43	
46		**9 Verifica**	**20 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
47		9.1 Backe	20 个工作日	2026年9月2	2026年10月	45SS	Qoder agent la
48		9.2 Front	20 个工作日	2026年9月2	2026年10月	47SS	Wang Xinyue 0

2026年9月7日 一 二 三 四 五 六 日


关键
关键拆分
关键任务进度
任务
拆分
任务进度
手动任务
仅开始时间
仅完成时间
仅工期
基线
基线拆分
基线里程碑
里程碑
摘要任务进度
摘要
手动摘要
项目摘要
外部任务
外部里程碑
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
最后期限

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
49			9.3 Close	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月3	48SS	Wang Jiarui 08(
50			9.4 Physi	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	49	Wang Xinyue 0
51			9.5 Verifi	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	47FF,48FF	Yang Jianbin 08
52			9.6 Final	2 个工作日	2026年10月	2026年10月	50SS	Qoder agent la
53			M9 Syste	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	50,52	
54			**10 Course**	**23 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
55			10.1 Part	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	16	Yang Jianbin 08
56			10.2 Mid	11 个工作日	2026年10月	2026年10月	41	Yang Jianbin 08
57			10.3 Part	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	Yang Jianbin 08
58			10.4 Part	5 个工作日	2026年10月	2026年10月	57SS	Wang Jiarui 08(
59			M10 Part	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	55	
60			M11 Mid	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	
61			M12 Part	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	58	
62			**11 Final a**	**5 个工作日**	**2026年10月**	**2026年10月**		
63			11.1 Evid	1 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	Yang Jianbin 08
64			11.2 Pub	1 个工作日	2026年10月	2026年10月	63	Yang Jianbin 08


日 | 2026年9月7日 一 | 二 | 三

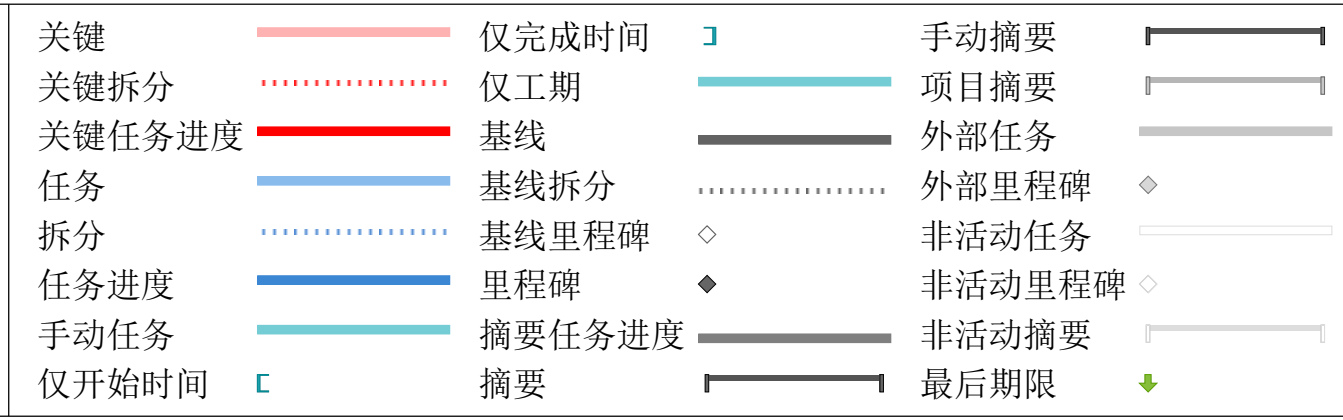

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二
65			M13 Fina	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	64,61			

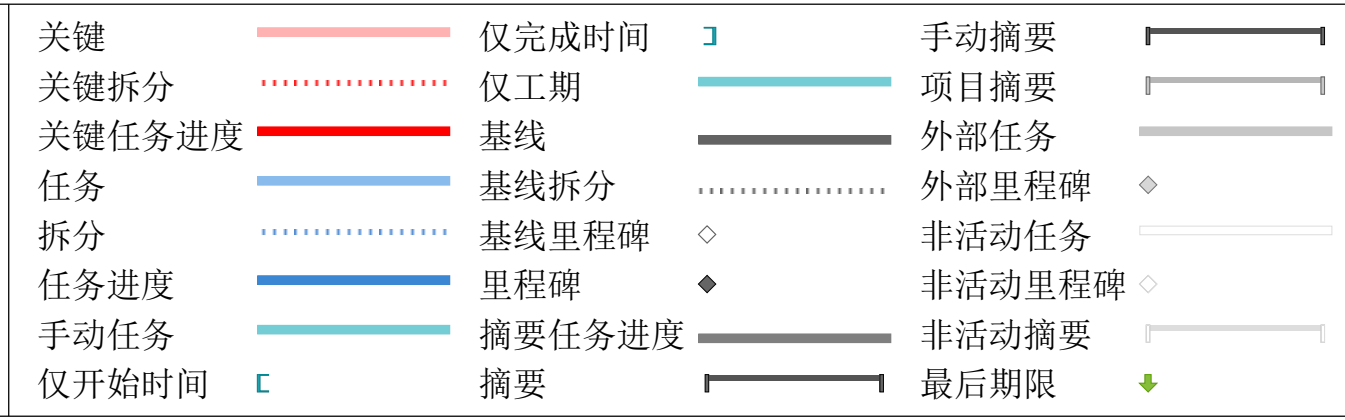


CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

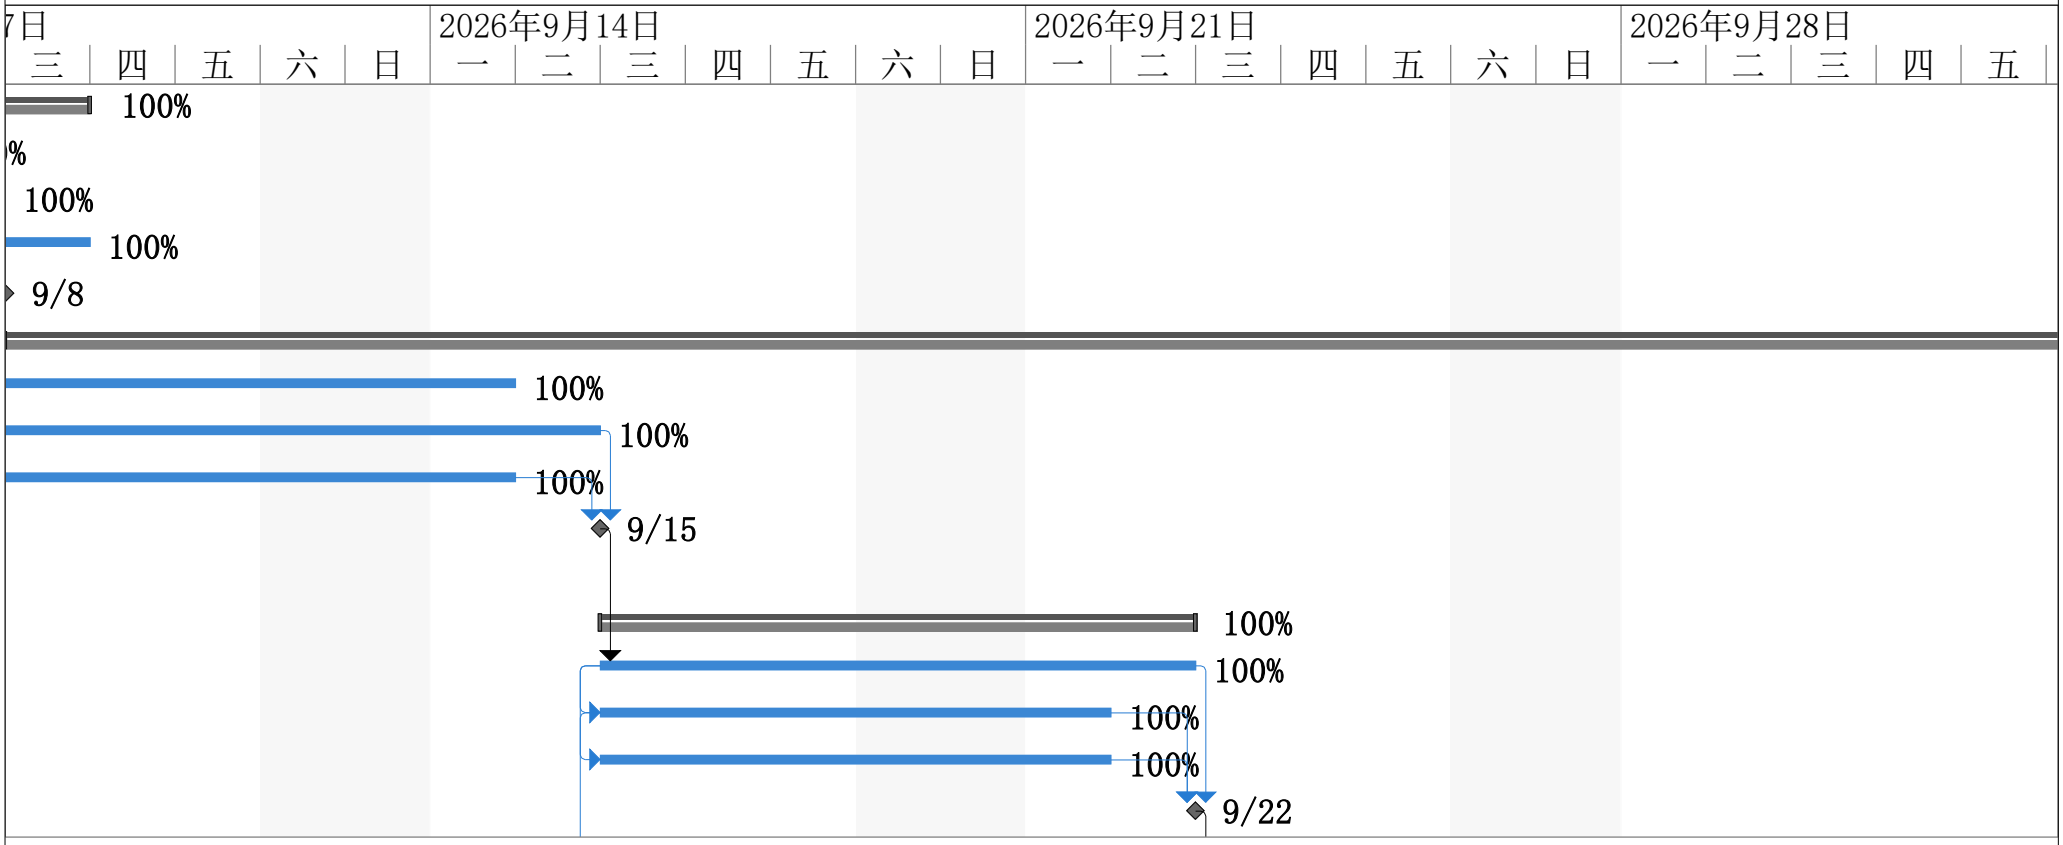


关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

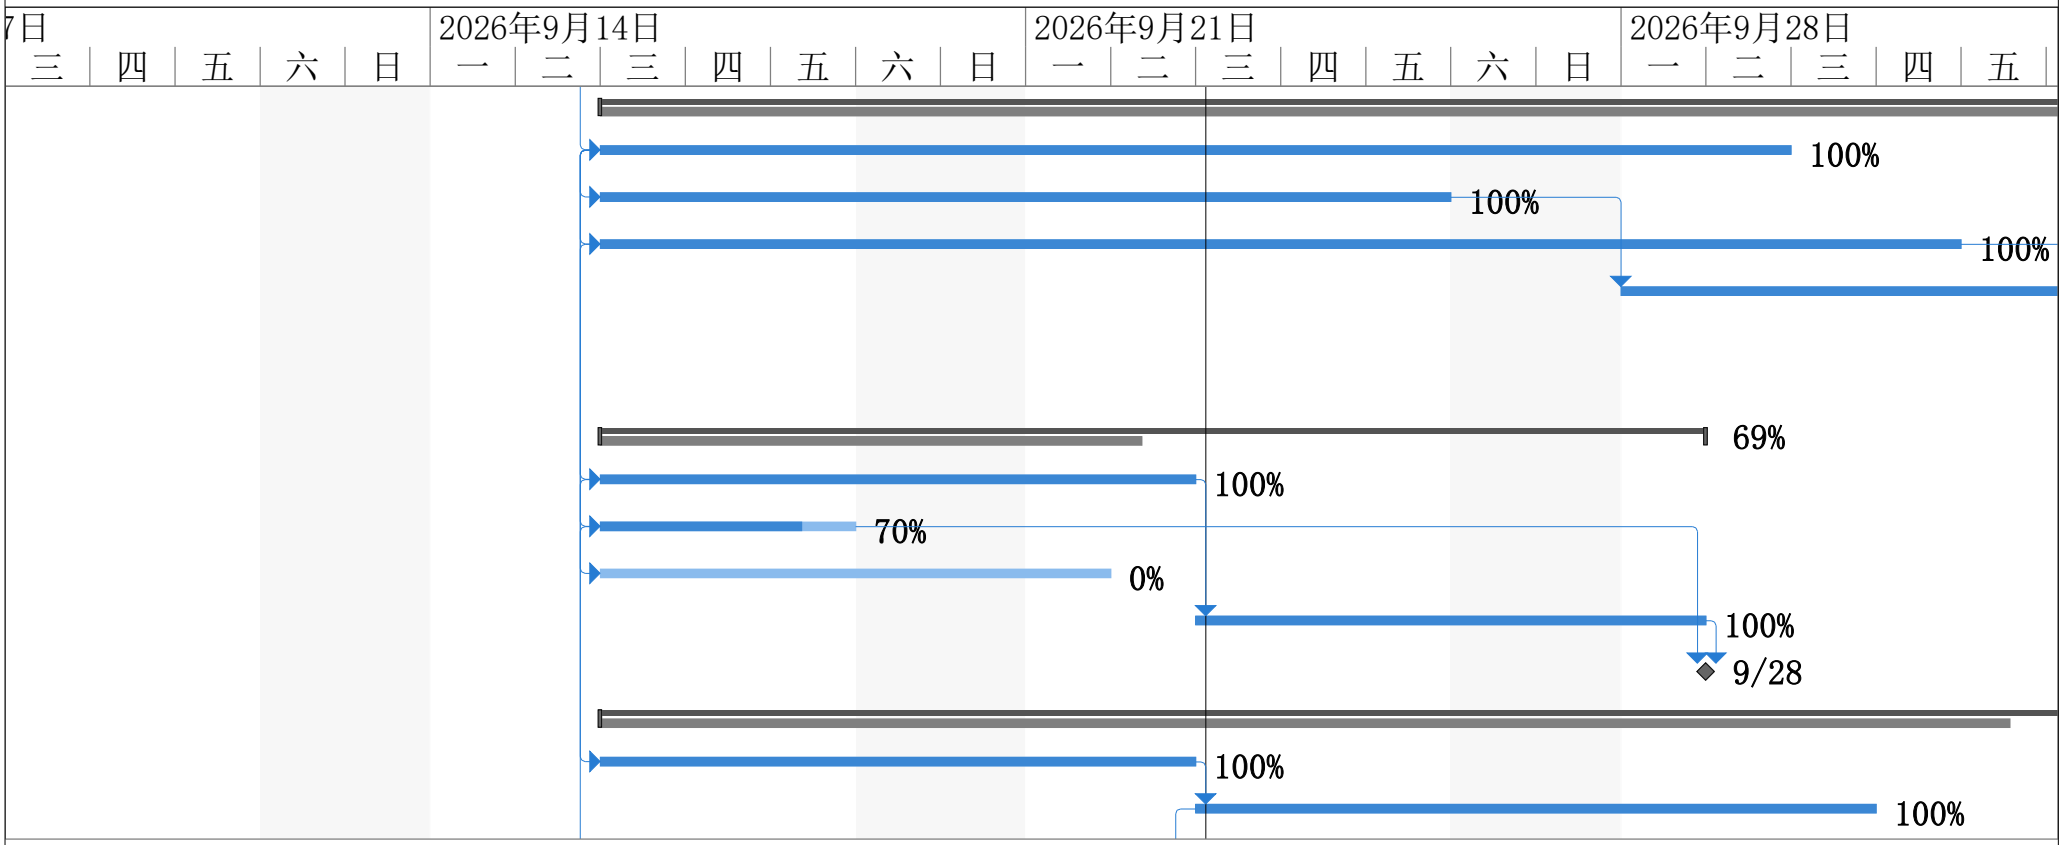


关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

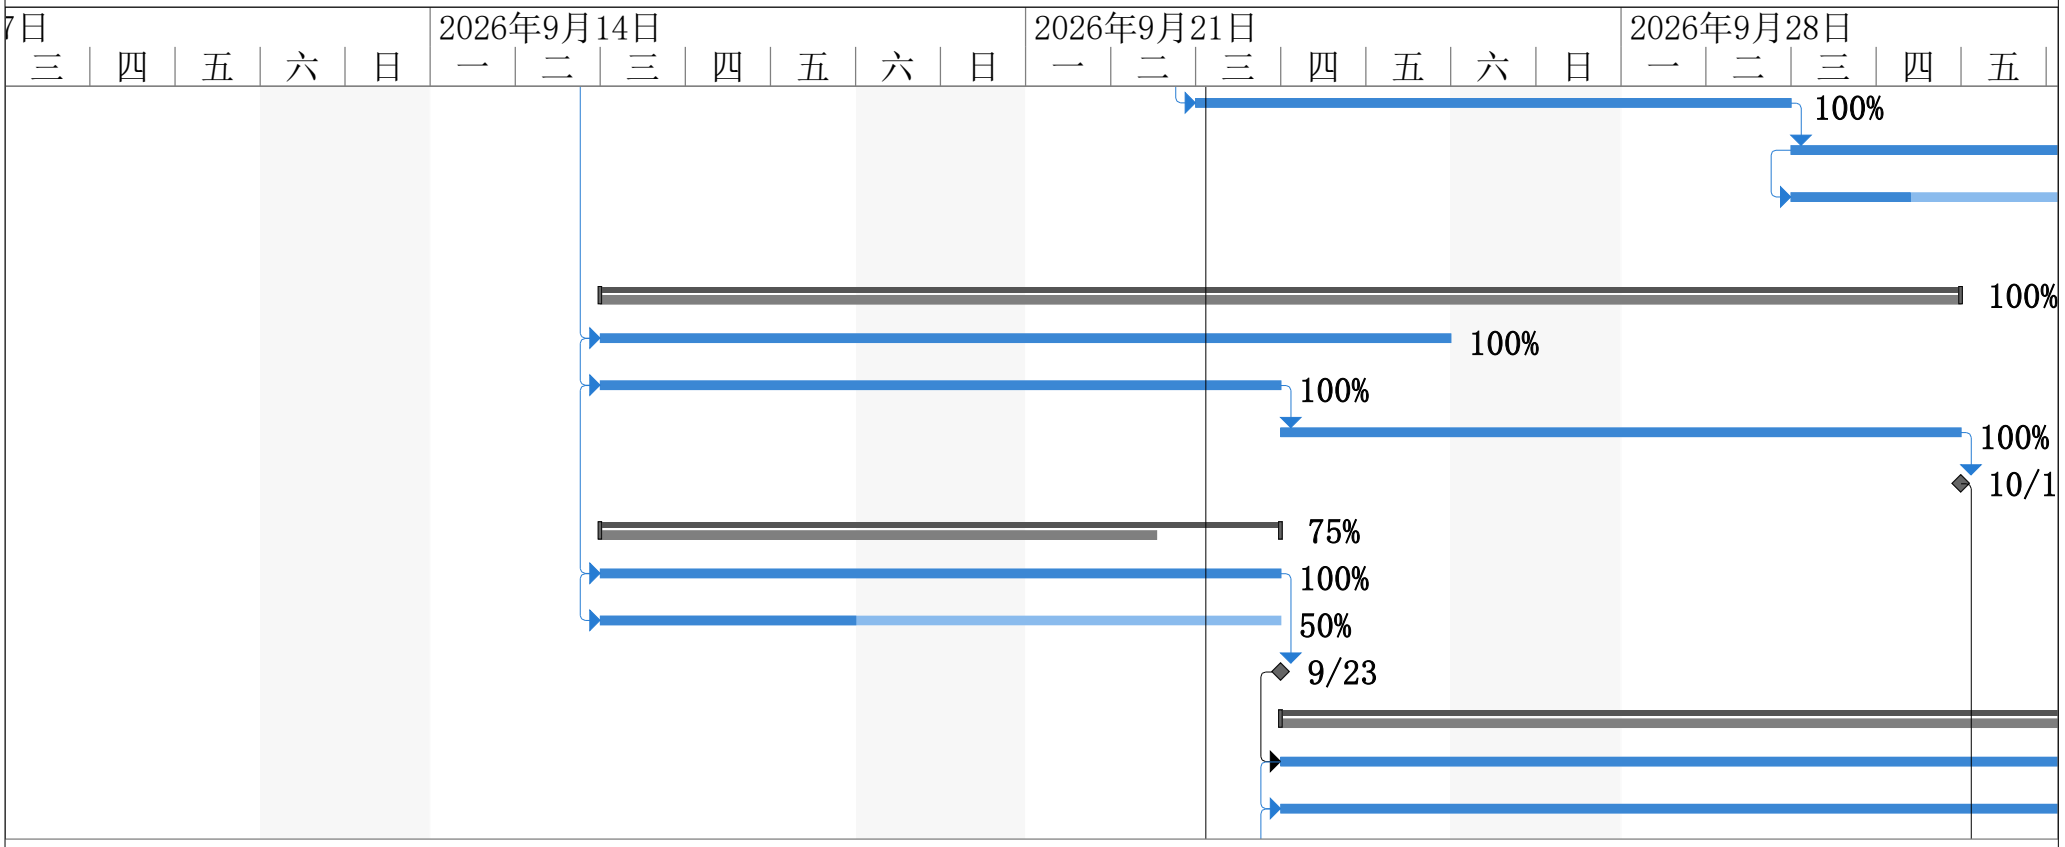

关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限


CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

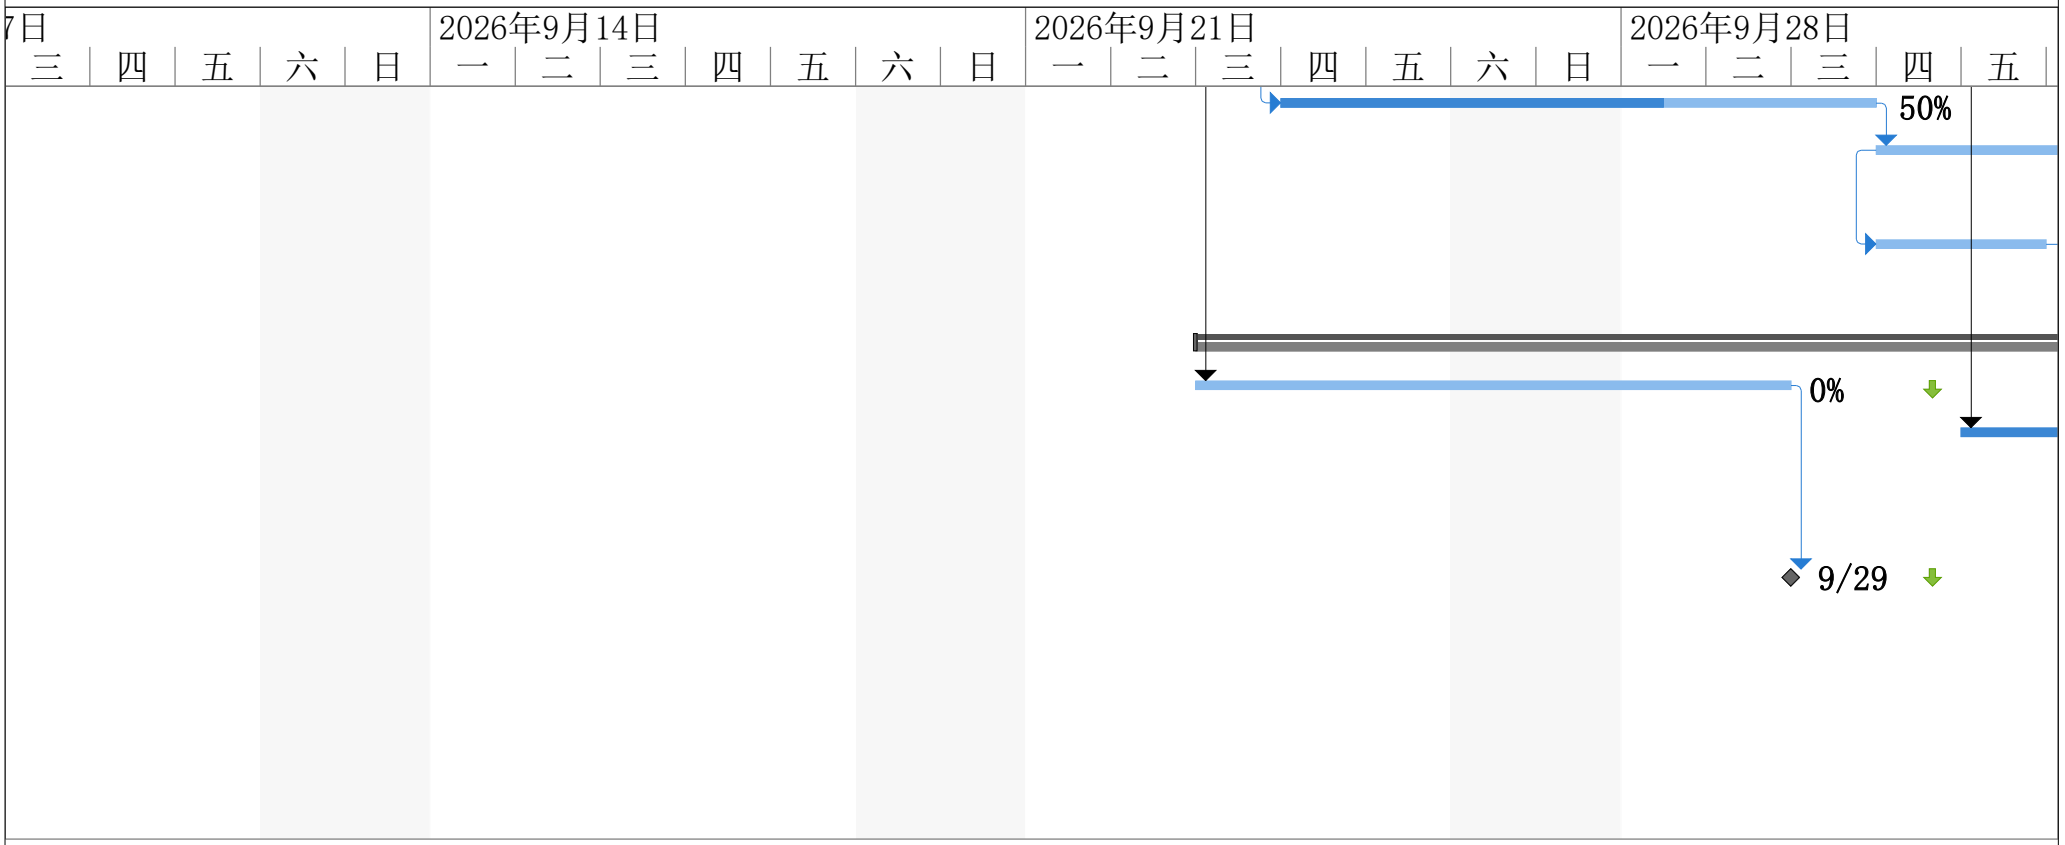


关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp



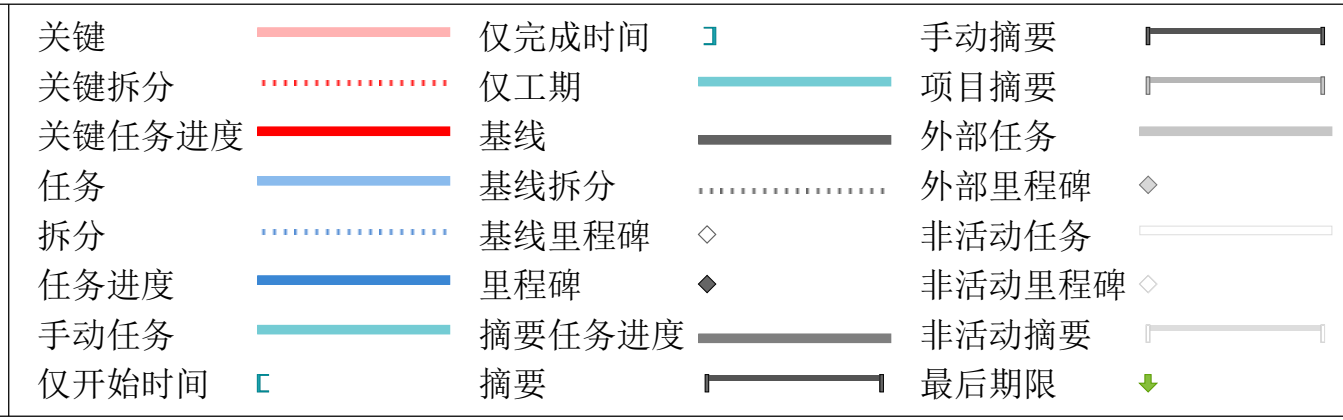

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

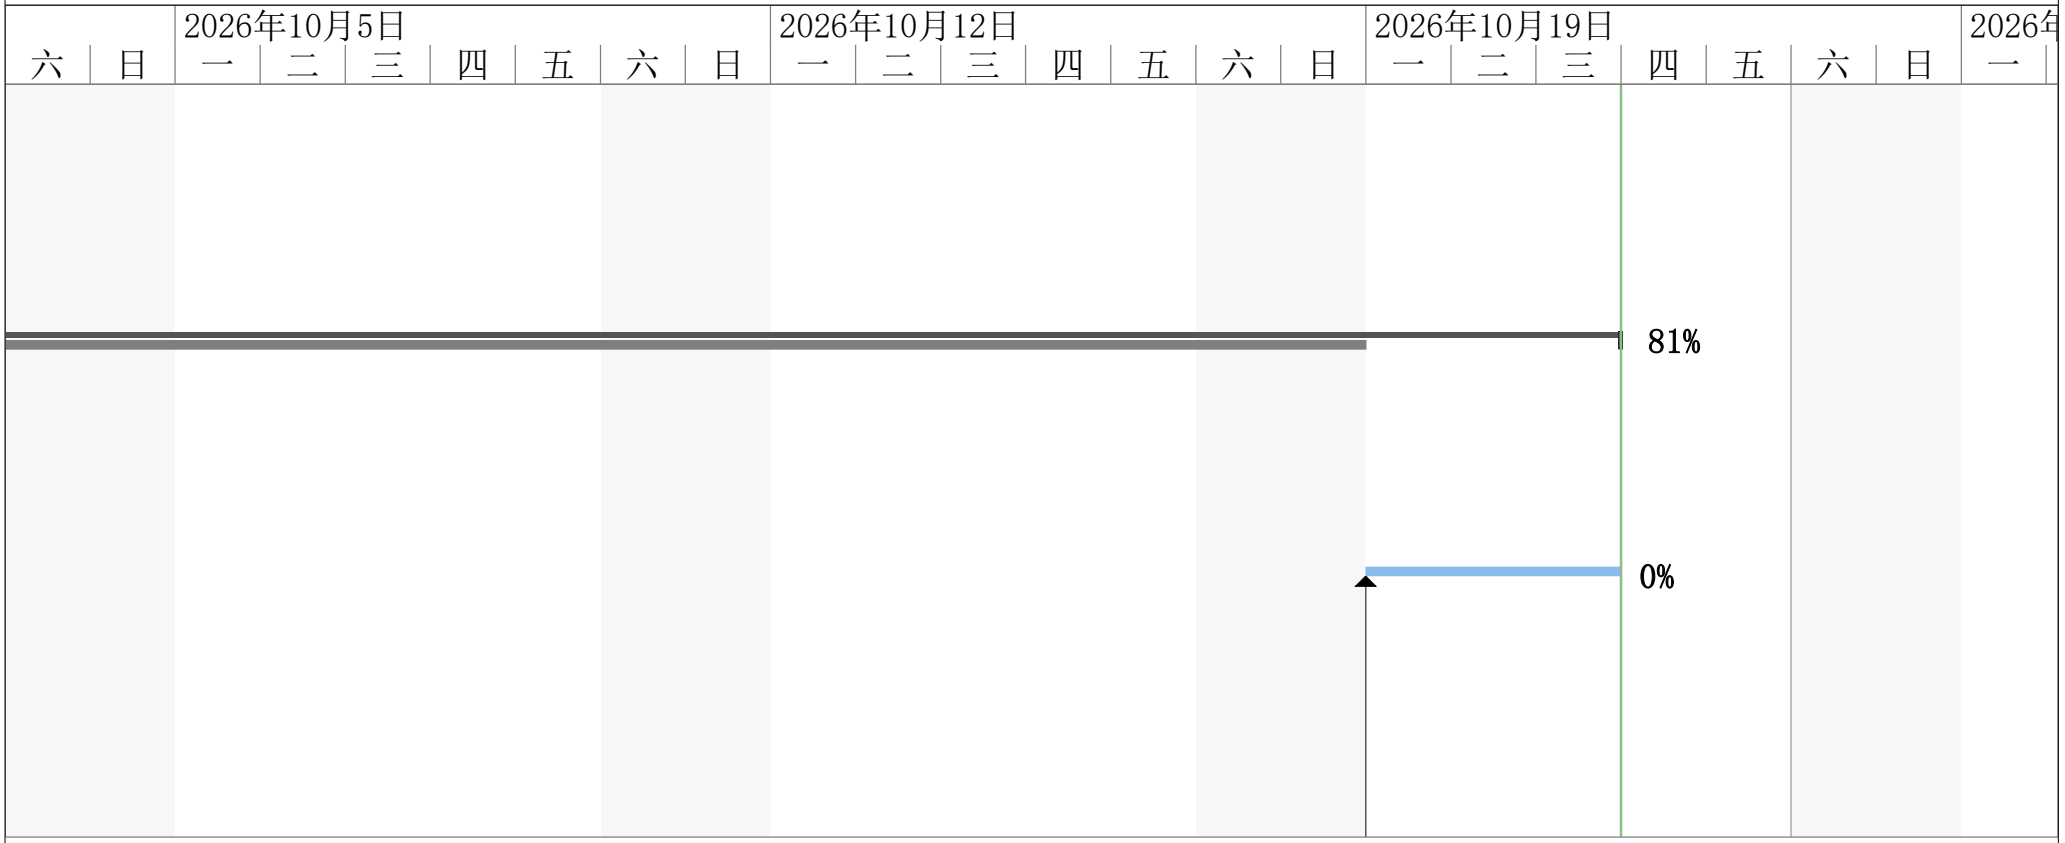

关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

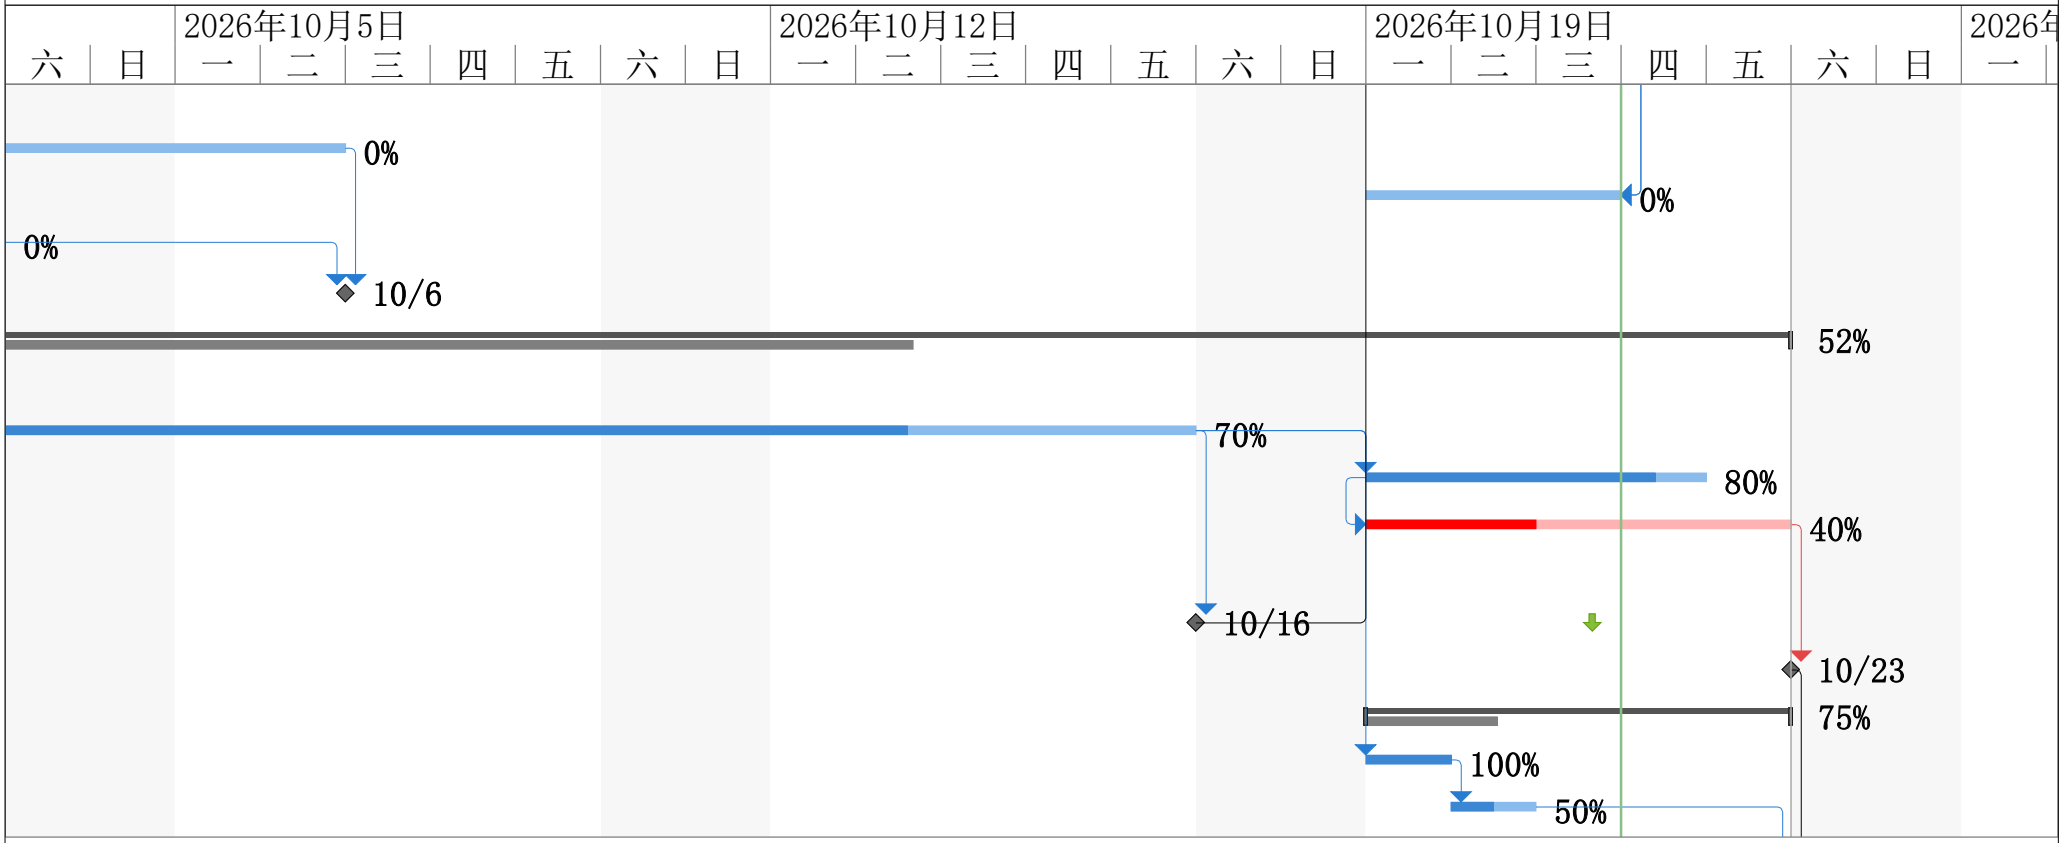

关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp



关键		仅完成时间		手动摘要	
关键拆分		仅工期		项目摘要	
关键任务进度		基线		外部任务	
任务		基线拆分		外部里程碑	
拆分		基线里程碑		非活动任务	
任务进度		里程碑		非活动里程碑	
手动任务		摘要任务进度		非活动摘要	
仅开始时间		摘要		最后期限	
