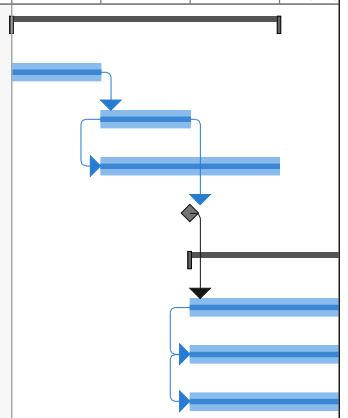
标识号		任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
1			**1 Coursewo**	**0 天**	**3 个工作**	**26年9月7日**	**26年9月9日**	
2			1.1 Read th	0 天	1 个工作	26年9月7日	26年9月7日	3
3			1.2 Select t	0 天	1 个工作	26年9月8日	26年9月8日	4SS,5
4			1.3 Confirn	0 天	2 个工作	26年9月8日	26年9月9日	
5			M1 Topic a	0 天	0 个工作	26年9月8日	26年9月8日	7
6			**2 Requirem**	**0 天**	**31 个工作**	**26年9月9日**	**年10月21日**	
7			2.1 Researc	0 天	4 个工作	26年9月9日	6年9月14日	8SS
8			2.2 Write th	0 天	5 个工作	26年9月9日	6年9月15日	9SS,10
9			2.3 Domair	0 天	4 个工作	26年9月9日	6年9月14日	10
10			M2 Requir	0 天	0 个工作	6年9月15日	6年9月15日	13
11			2.4 Get the	0 天	3 个工作	年10月19日	年10月21日	
12			**3 System de**	**0 天**	**5 个工作**	**6年9月16日**	**6年9月22日**	
13			3.1 Layered	0 天	5 个工作	6年9月16日	6年9月22日	14SS,16,18S
14			3.2 Interfac	0 天	4 个工作	6年9月16日	6年9月21日	15SS,16
15			3.3 Microsc	0 天	4 个工作	6年9月16日	6年9月21日	16
16			M3 Archite	0 天	0 个工作	6年9月22日	6年9月22日	55
17			**4 Backend p**	**0 天**	**28 个工作**	**年9月16日**	**年10月23日**	
18			4.1 FastAPI	0 天	10 个工作	6年9月16日	6年9月29日	19SS,20SS,2
19			4.2 SQLAlc	0 天	8 个工作	6年9月16日	6年9月25日	21



关键	项目摘要	手动摘要总成	
关键拆分	总成型关键任务	手动摘要	
任务	总成型关键任务拆分	仅开始时间	
拆分	非活动任务	仅完成时间	
里程碑	非活动里程碑	外部任务	
可宽延时间	非活动摘要	外部里程碑	
进度落后	手动任务	最后期限	
摘要	仅工期	进度	

标识号	任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
20		4.3 Journey	0 天	12 个工作	3年9月16日	3年10月1日	23,31SS
21		4.4 Twin, c	0 天	6 个工作	3年9月28日	3年10月5日	22,23
22		4.5 Comme	0 天	14 个工作	3年10月6日	年10月23日	
23		M4 Core b	0 天	0 个工作	3年10月5日	3年10月5日	
24		**5 Map and**	**0 天**	**9 个工作**	**3年9月16日**	**3年9月28日**	
25		5.1 Geococ	0 天	5 个工作	3年9月16日	3年9月22日	26SS,28
26		5.2 Contex	0 天	3 个工作	3年9月16日	3年9月18日	27SS,29
27		5.3 Mobilit	0 天	4 个工作	3年9月16日	3年9月21日	
28		5.4 Determ	0 天	4 个工作	3年9月23日	3年9月28日	29
29		M5 Provide	0 天	0 个工作	3年9月28日	3年9月28日	
30		**6 AI agent a**	**0 天**	**16 个工作**	**3年9月16日**	**3年10月7日**	
31		6.1 Intent c	0 天	5 个工作	3年9月16日	3年9月22日	32
32		6.2 Missior	0 天	6 个工作	3年9月23日	3年9月30日	33SS
33		6.3 Tool ga	0 天	5 个工作	3年9月23日	3年9月29日	34
34		6.4 Eleven	0 天	4 个工作	3年9月30日	3年10月5日	35SS,36
35		6.5 Native	0 天	6 个工作	3年9月30日	3年10月7日	
36		M6 Agent	0 天	0 个工作	3年10月5日	3年10月5日	
37		**7 Frontend**	**0 天**	**12 个工作**	**3年9月16日**	**3年10月1日**	
38		7.1 V8Expe	0 天	8 个工作	3年9月16日	3年9月25日	39SS

2026年9月7日

日 一 二 三 四

关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度

标识号	任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
39		7.2 MapLib	0 天	6 个工作日	3年9月16日	3年9月23日	40,43SS
40		7.3 Copilot	0 天	6 个工作日	3年9月24日	3年10月1日	41
41		M7 Fronter	0 天	0 个工作日	3年10月1日	3年10月1日	56
42		**8 Integratio**	**0 天**	**6 个工作日**	**3年9月16日**	**3年9月23日**	
43		8.1 Author	0 天	6 个工作日	3年9月16日	3年9月23日	44SS,45
44		8.2 Backpc	0 天	6 个工作日	3年9月16日	3年9月23日	
45		M8 Integra	0 天	0 个工作日	3年9月23日	3年9月23日	47SS
46		**9 Verificatic**	**0 天**	**20 个工作日**	**3年9月24日**	**3年10月21日**	
47		9.1 Backen	0 天	20 个工作日	3年9月24日	3年10月21日	48SS,51FF
48		9.2 Fronter	0 天	20 个工作日	3年9月24日	3年10月21日	49SS,51FF
49		9.3 Close t	0 天	5 个工作日	3年9月24日	3年9月30日	50
50		9.4 Physica	0 天	4 个工作日	3年10月1日	3年10月6日	52SS,53
51		9.5 Verifica	0 天	3 个工作日	3年10月19日	3年10月21日	
52		9.6 Final re	0 天	2 个工作日	3年10月1日	3年10月2日	53
53		M9 System	0 天	0 个工作日	3年10月6日	3年10月6日	
54		**10 Coursew**	**0 天**	**23 个工作日**	**3年9月23日**	**3年10月23日**	
55		10.1 Part 1	0 天	5 个工作日	3年9月23日	3年9月29日	59
56		10.2 Mid-t	0 天	11 个工作日	3年10月2日	3年10月16日	57,60,63
57		10.3 Part 2	0 天	4 个工作日	3年10月19日	3年10月22日	58SS

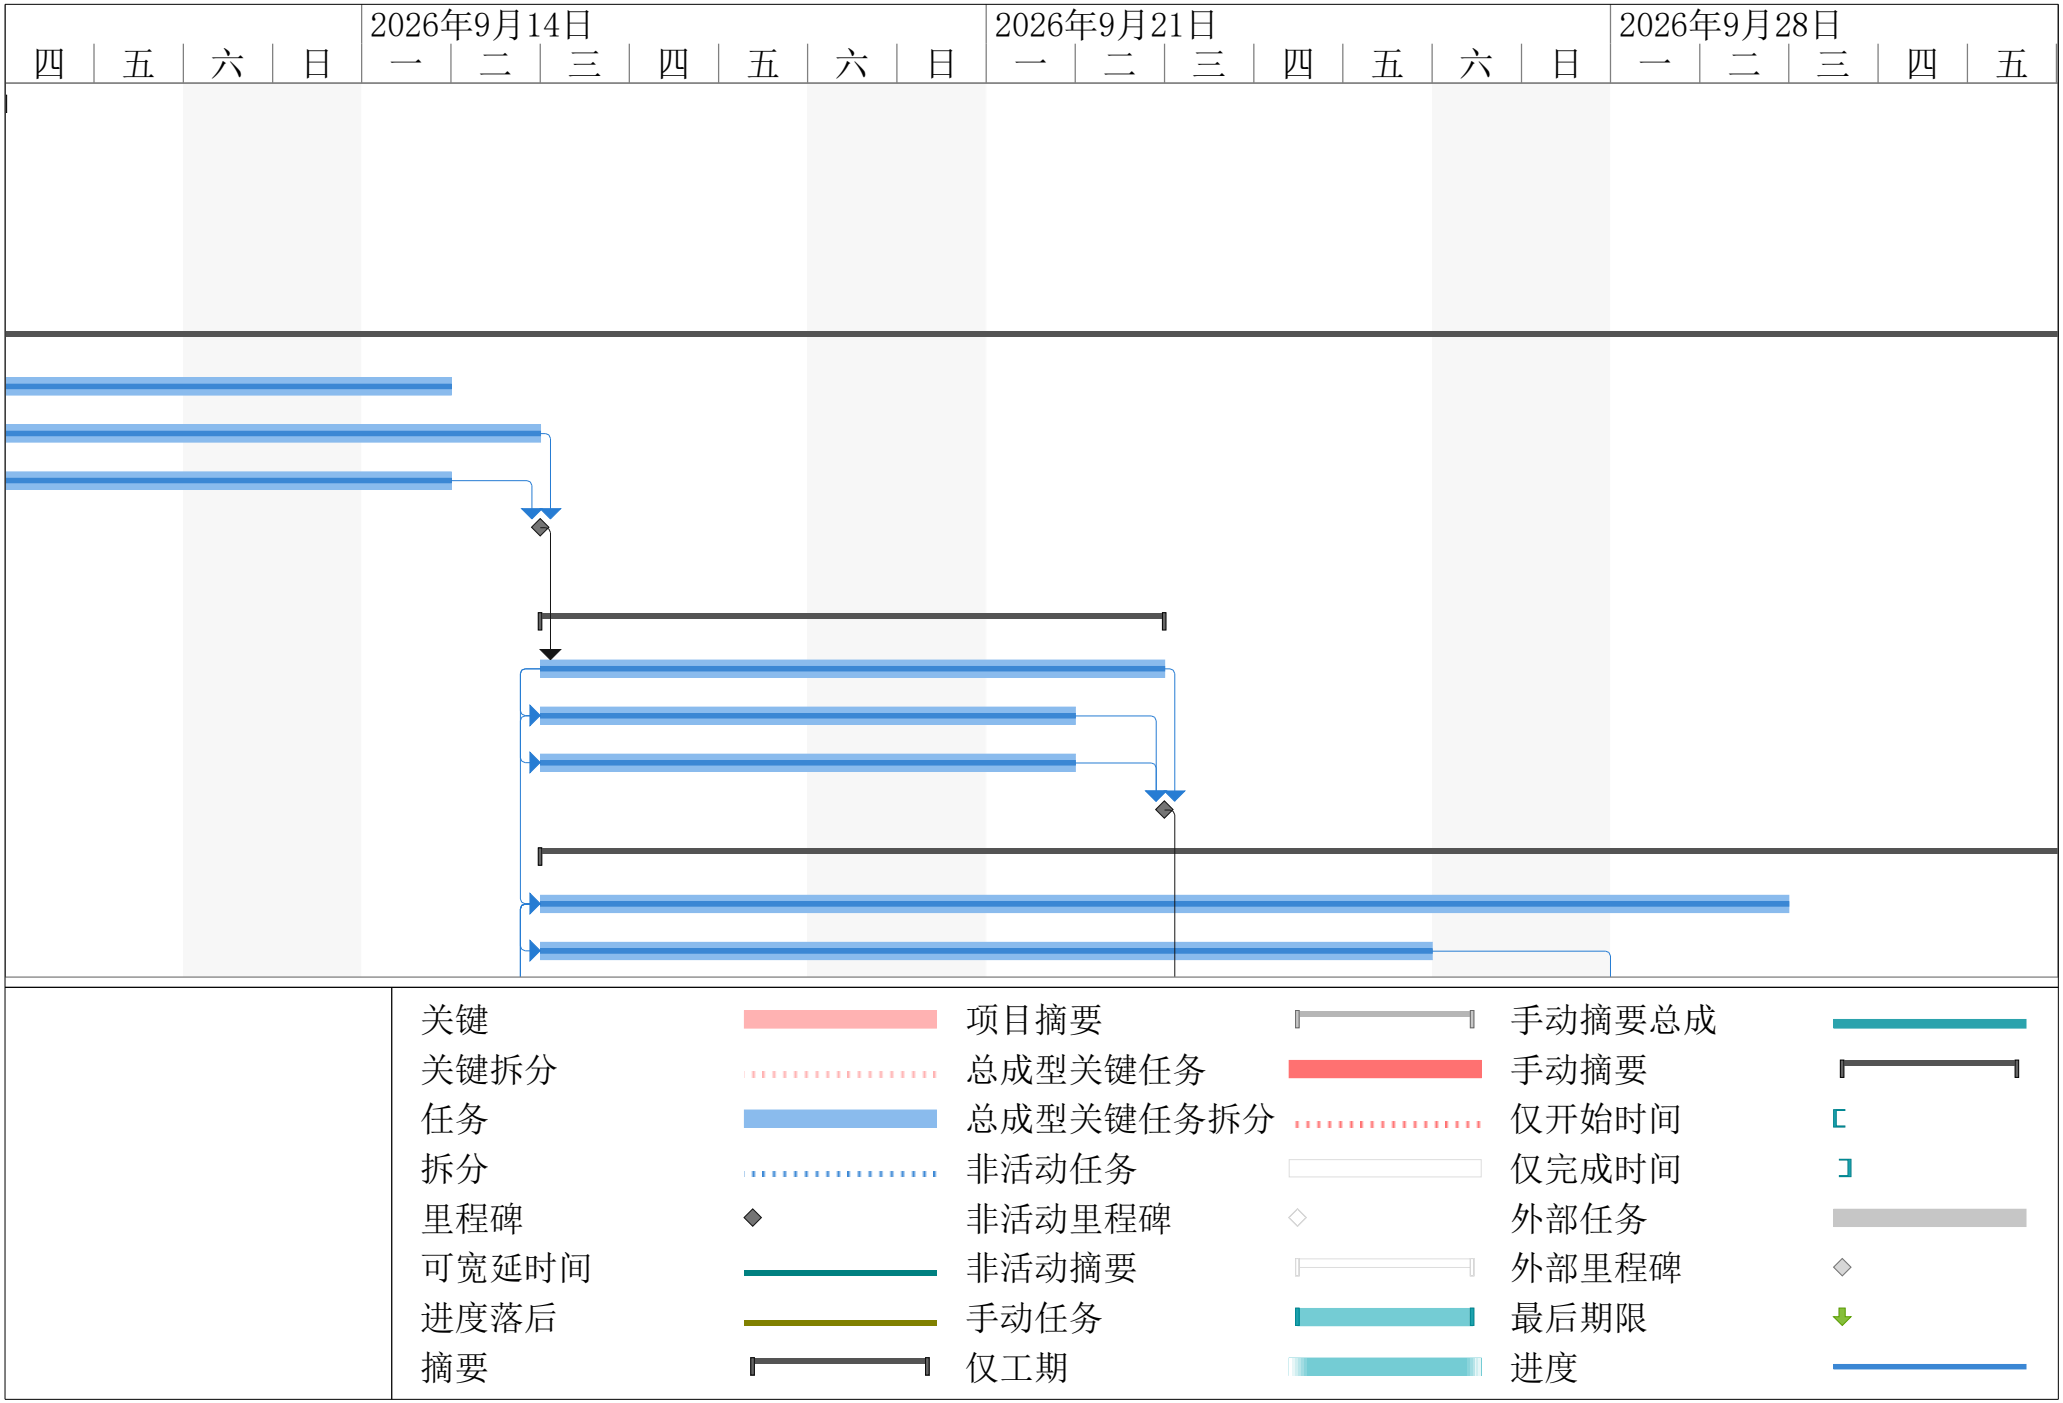
日 | 2026年9月7日 一 二 三 四

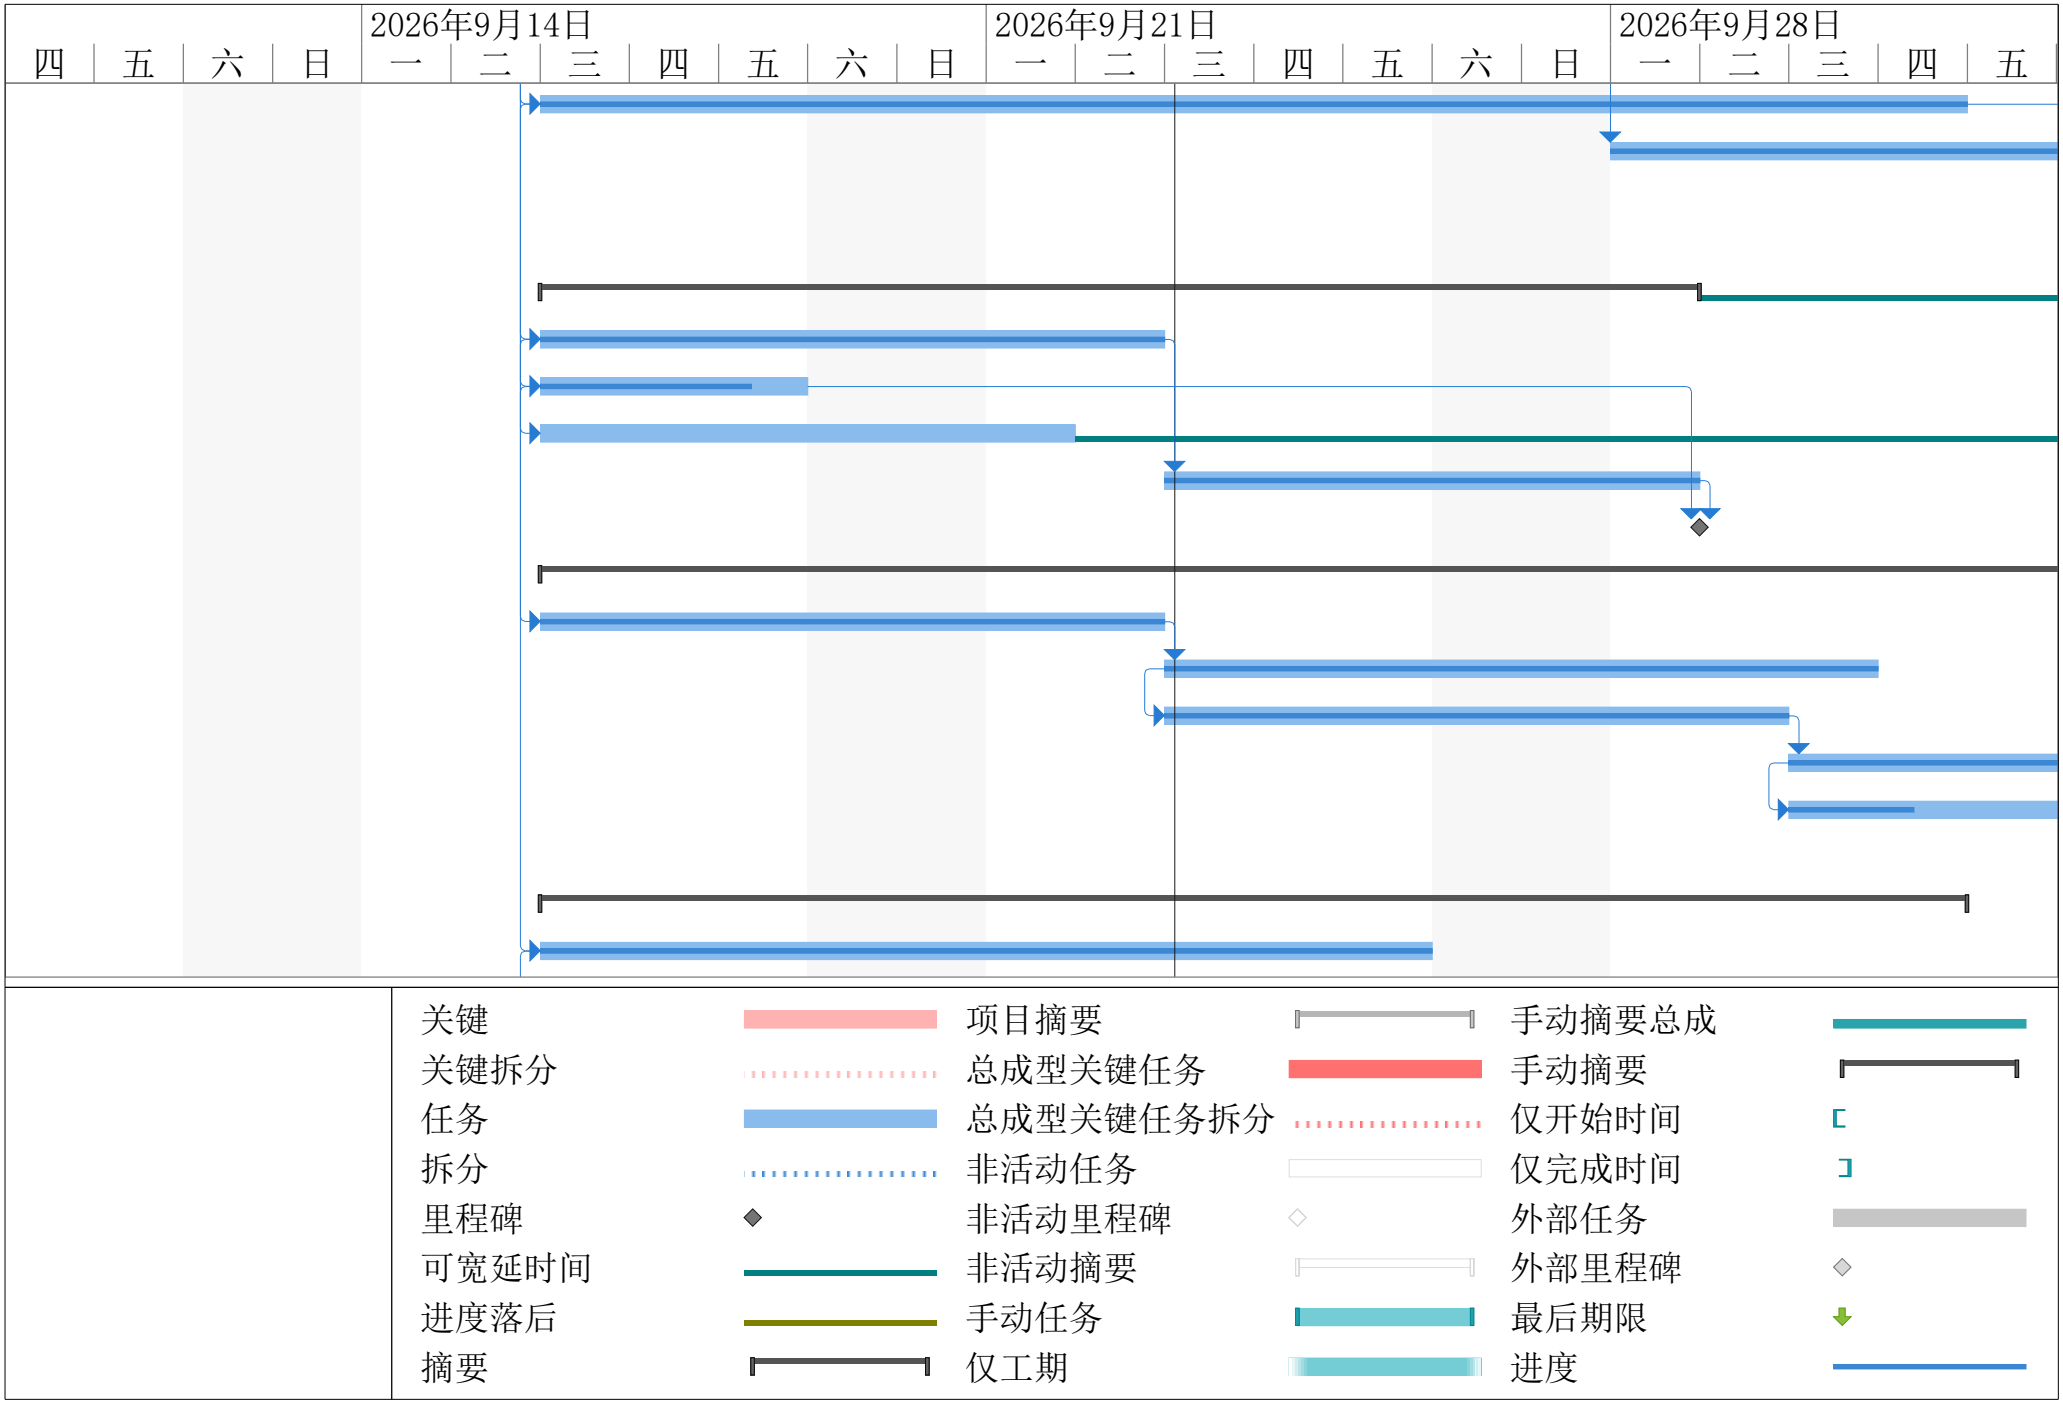
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度

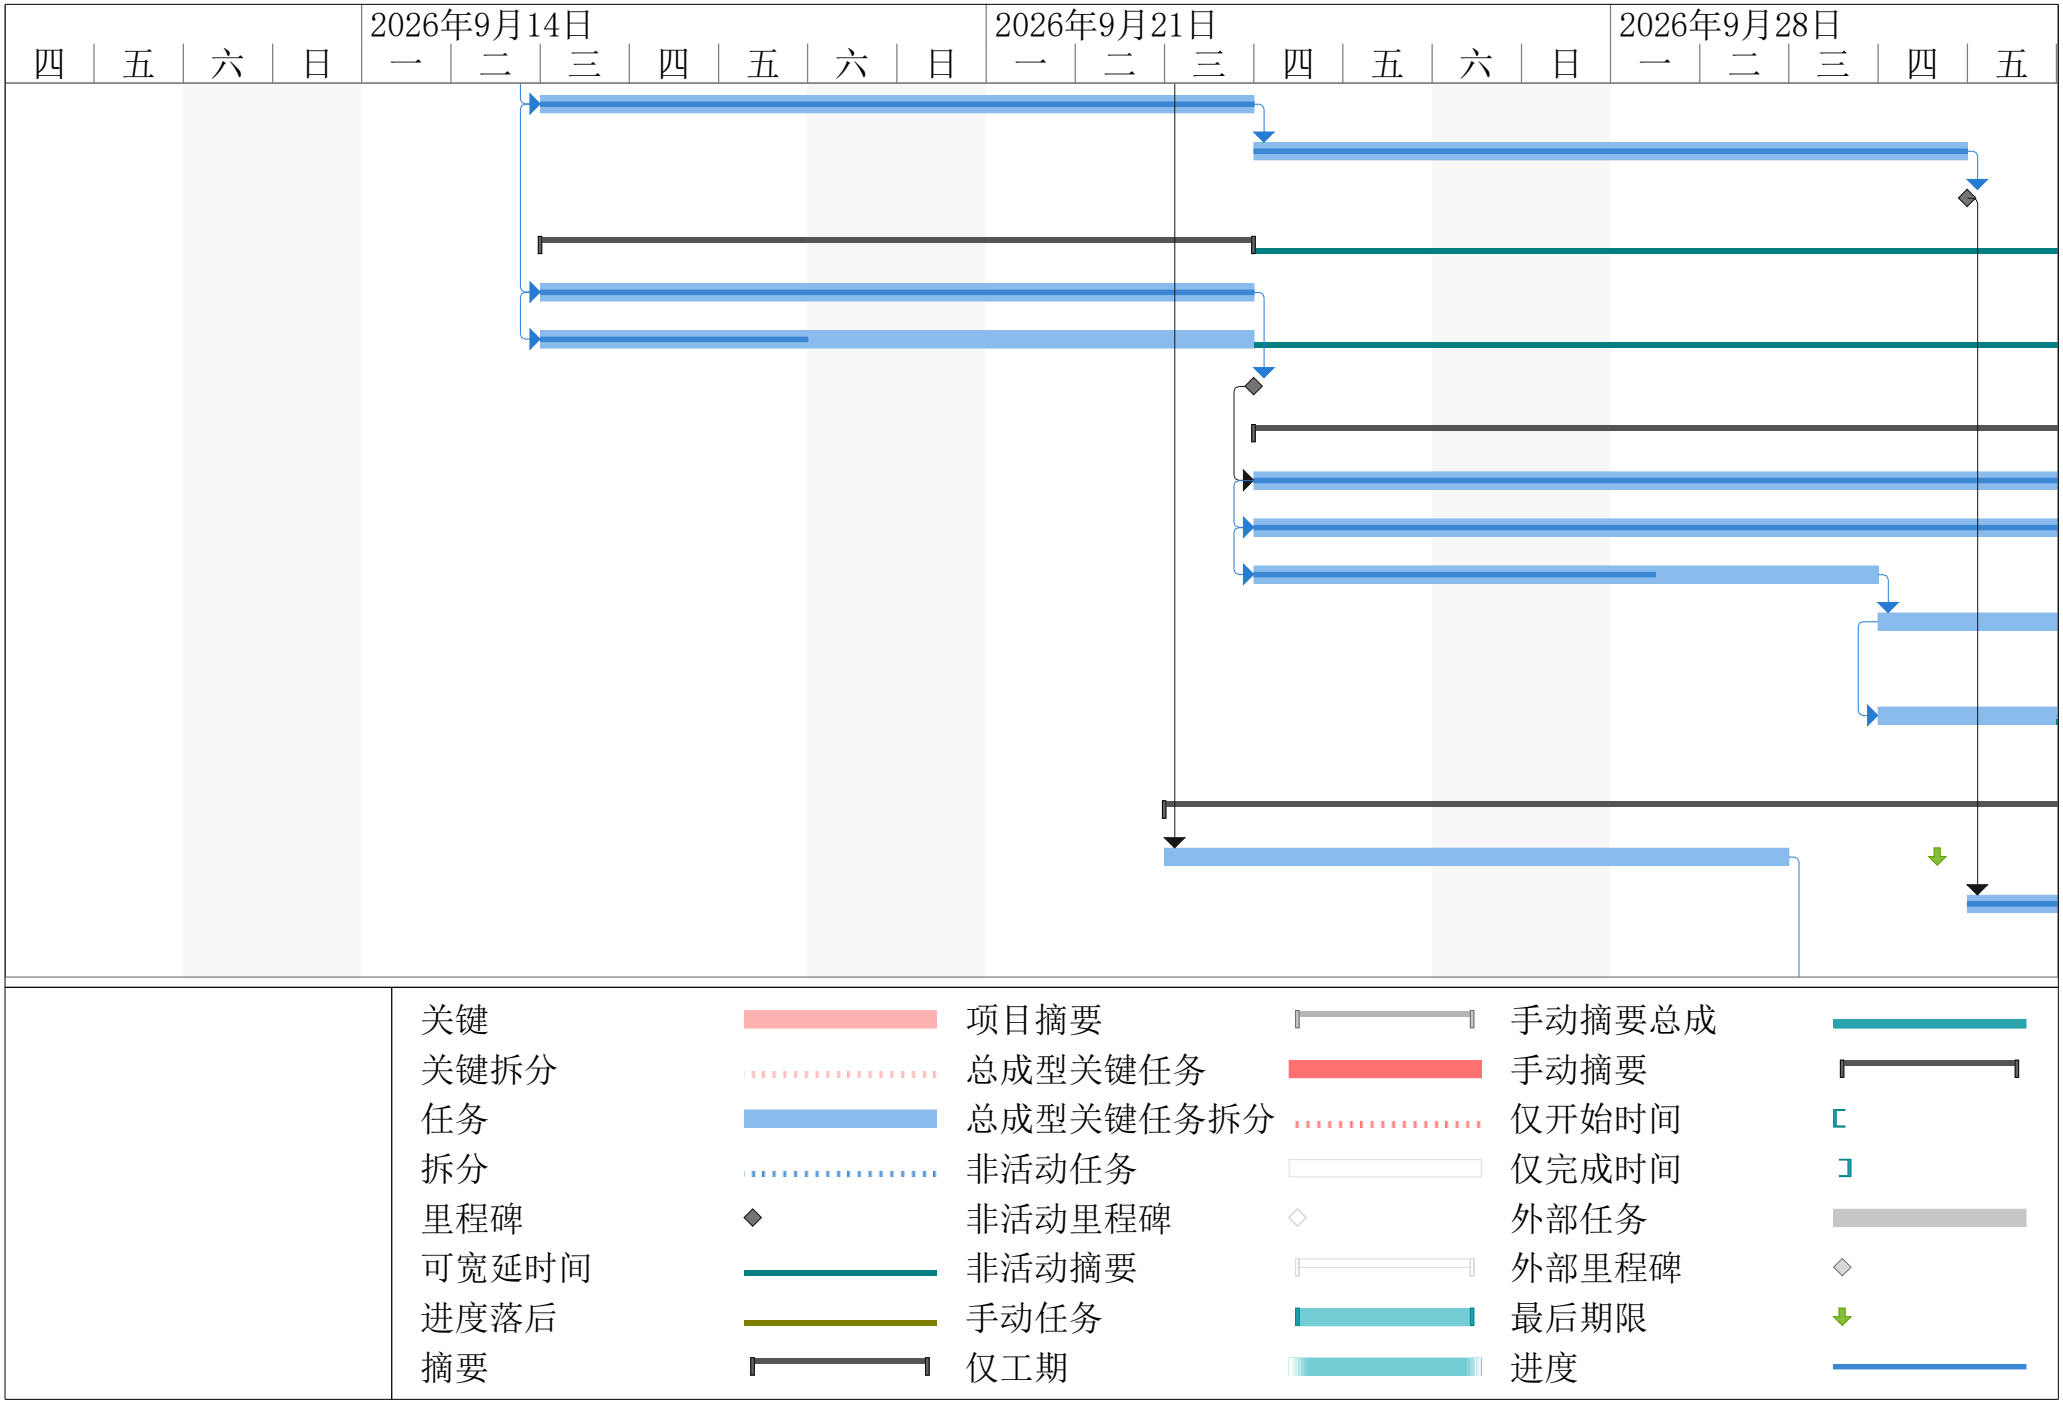
标识号		任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
58			10.4 Part 2	0 天	5 个工作日	年10月19日	年10月23日	61
59			M10 Part 1	0 天	0 个工作日	5年9月29日	5年9月29日	
60			M11 Mid-t	0 天	0 个工作日	年10月16日	年10月16日	11
61			M12 Part 2	0 天	0 个工作日	年10月23日	年10月23日	65
62			**11 Final acc**	**0 天**	**5 个工作日**	**年10月19日**	**年10月23日**	
63			11.1 Evider	0 天	1 个工作日	年10月19日	年10月19日	64
64			11.2 Publis	0 天	1 个工作日	年10月20日	年10月20日	65
65			M13 Final	0 天	0 个工作日	年10月23日	年10月23日	

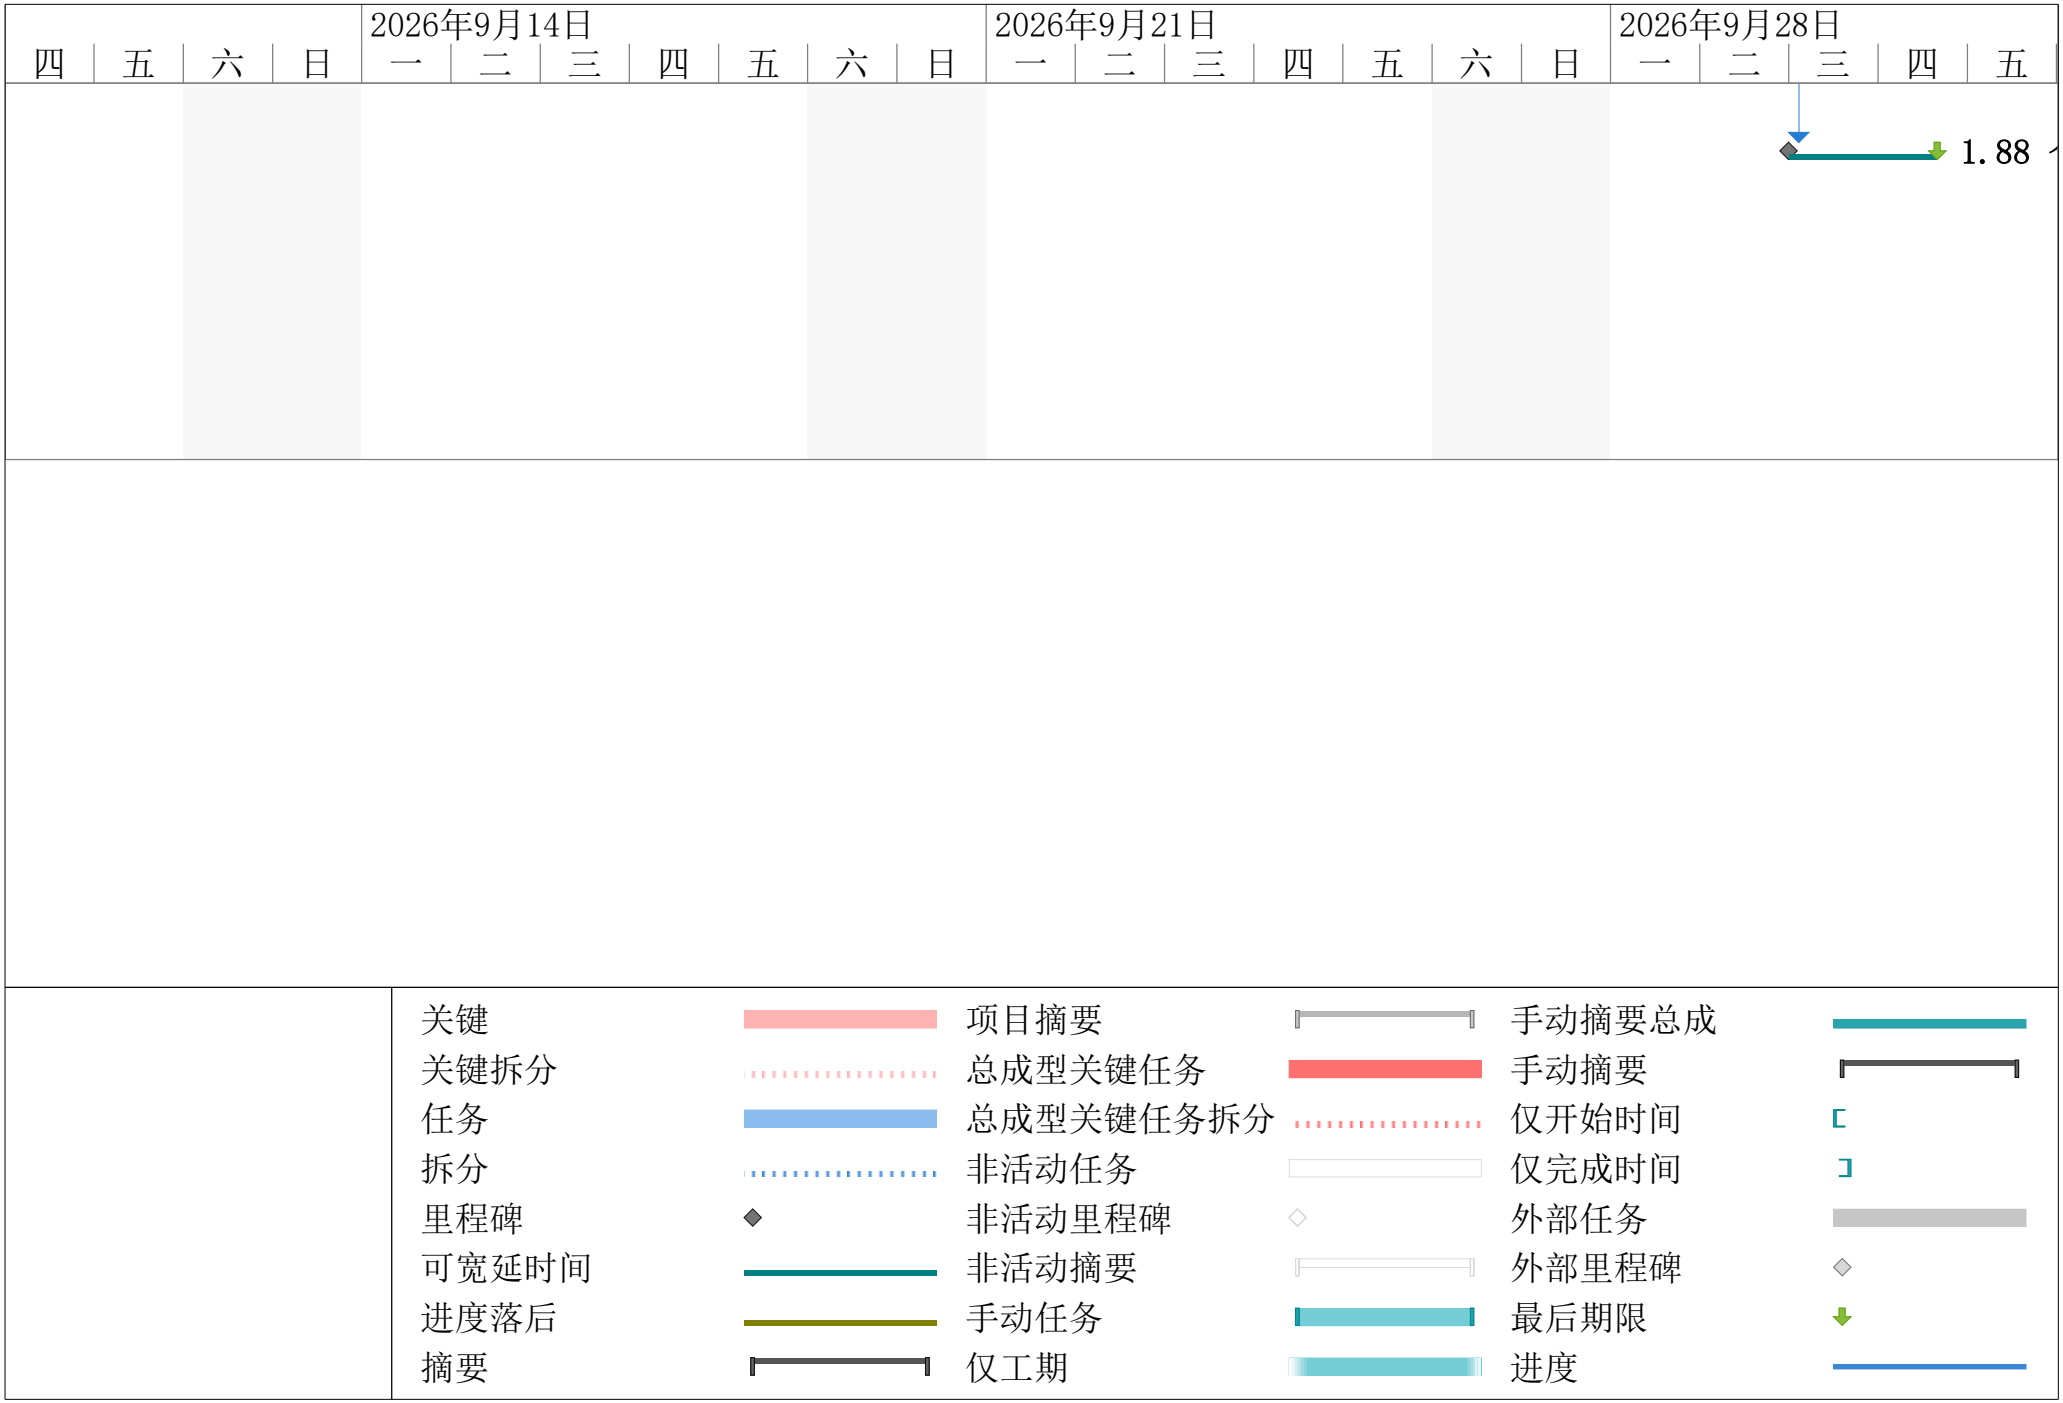
日 | 2026年9月7日 一 二 三 四

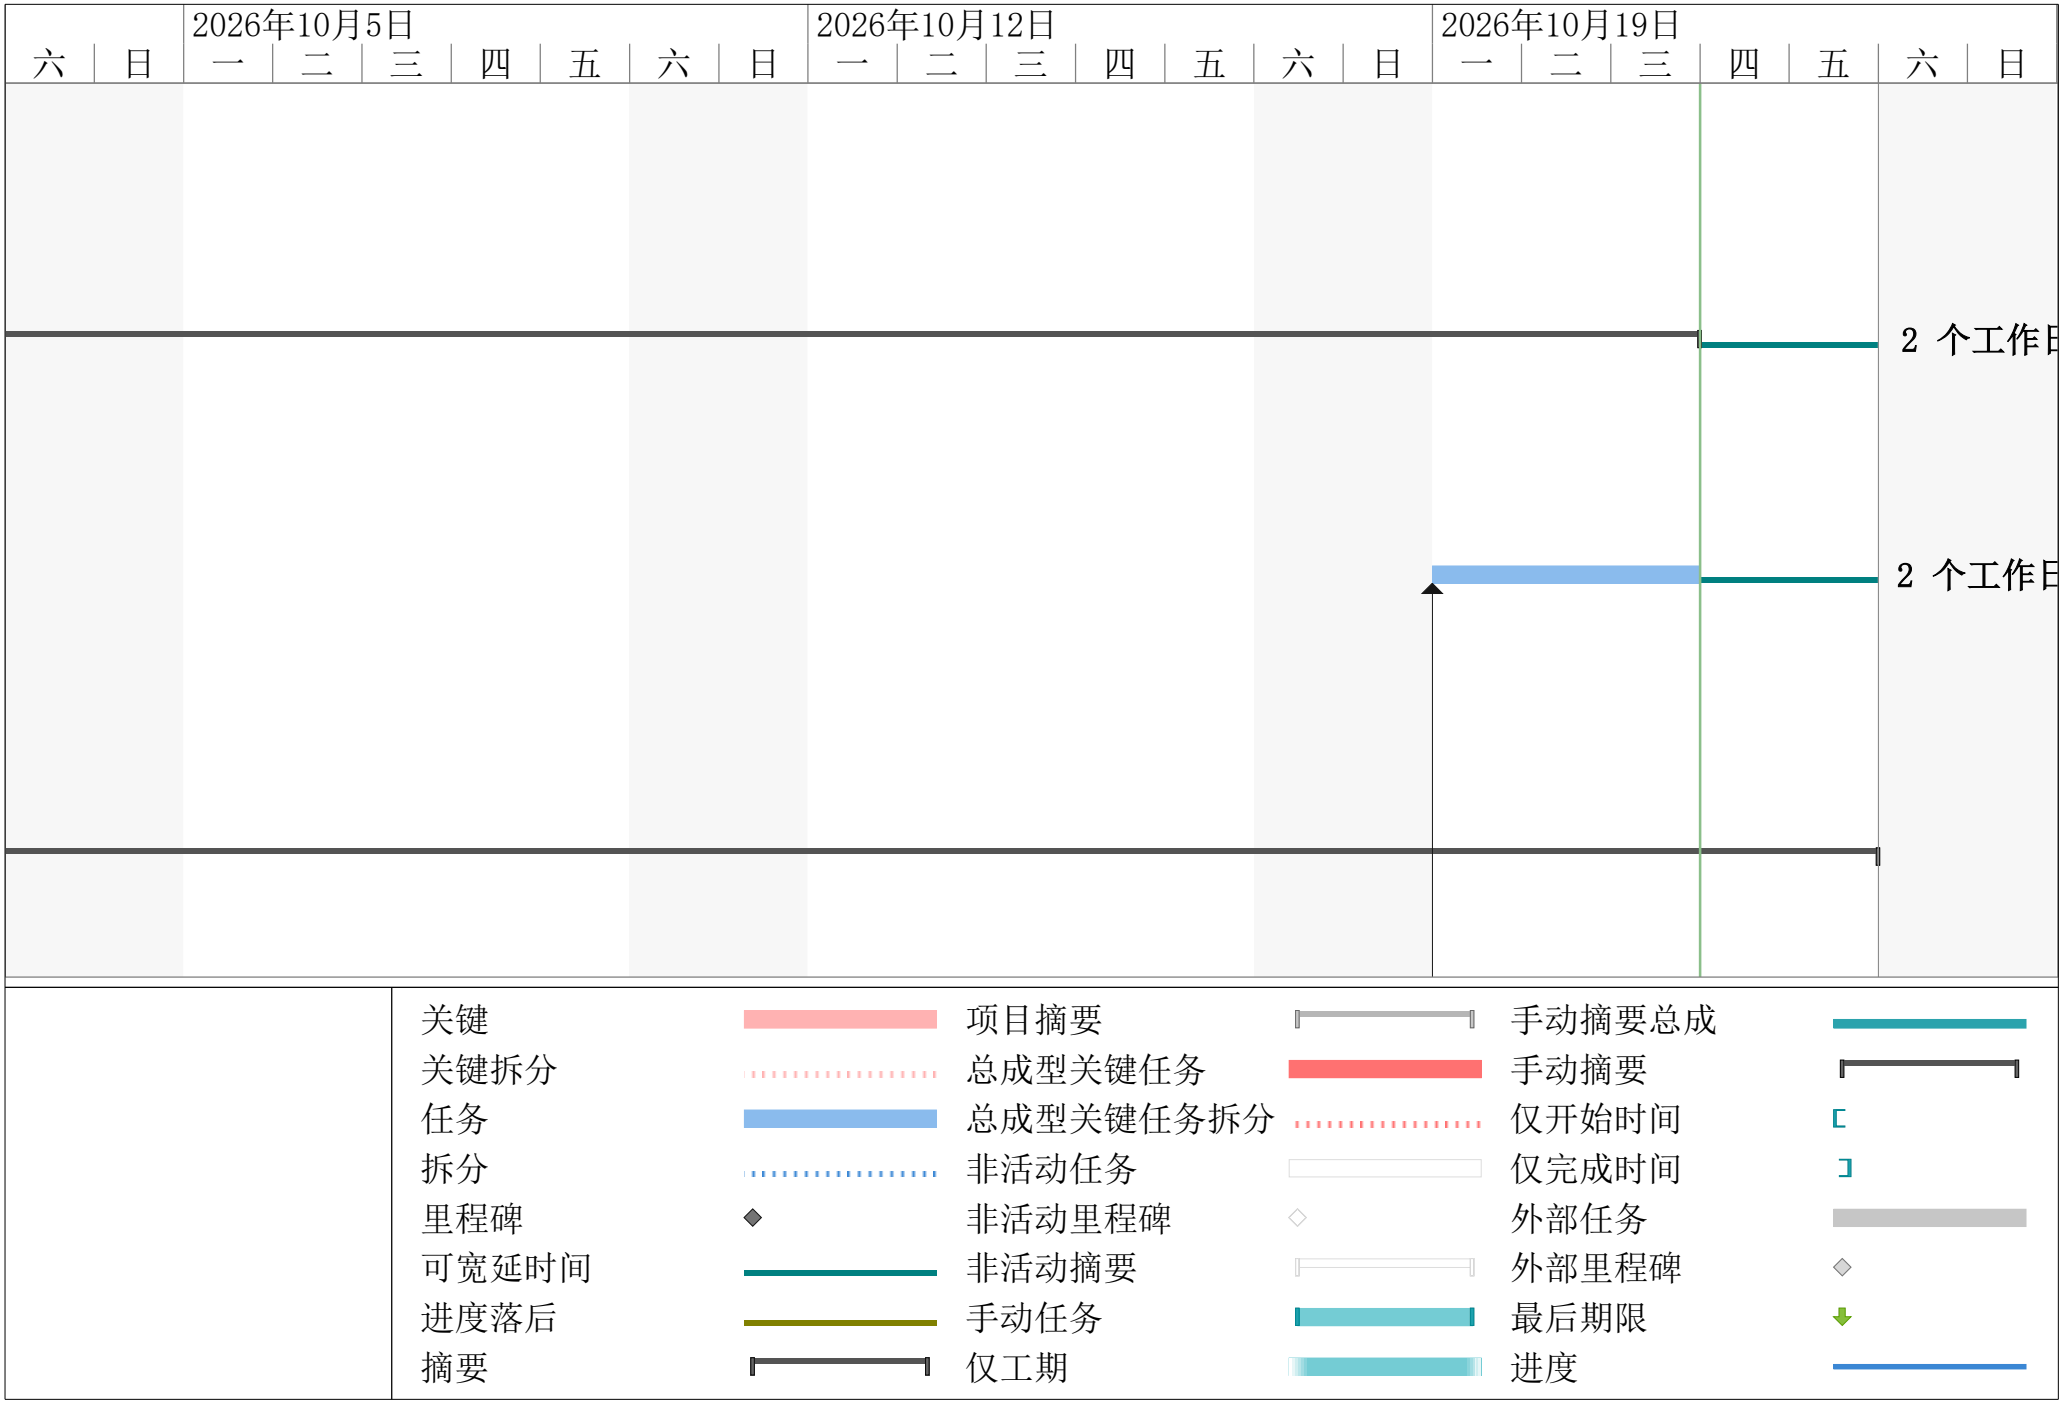
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度

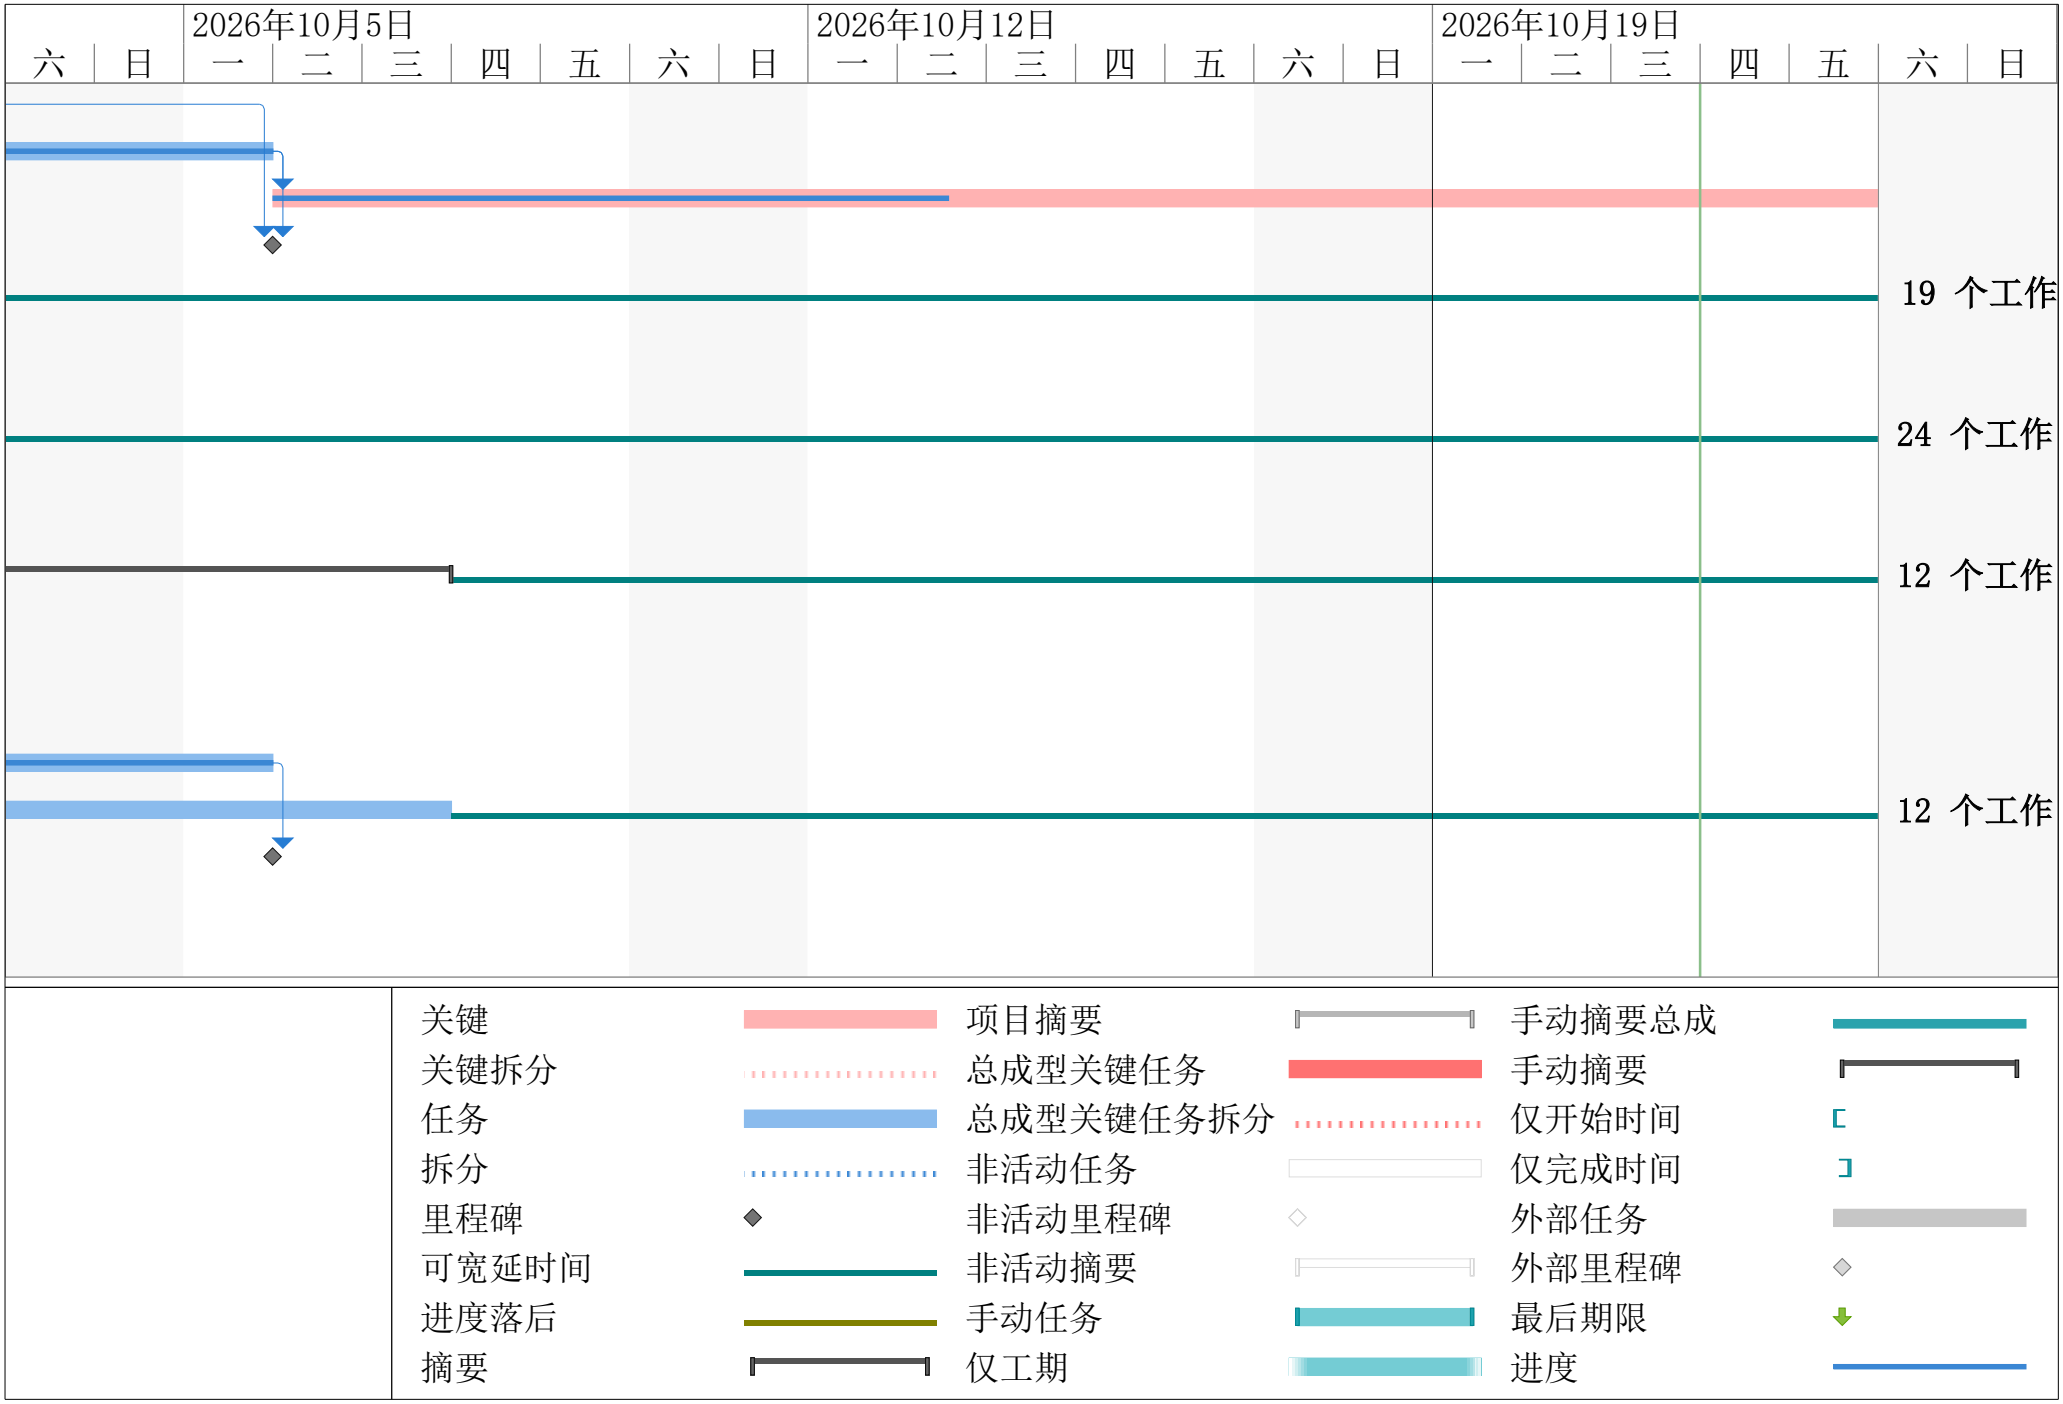

2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度

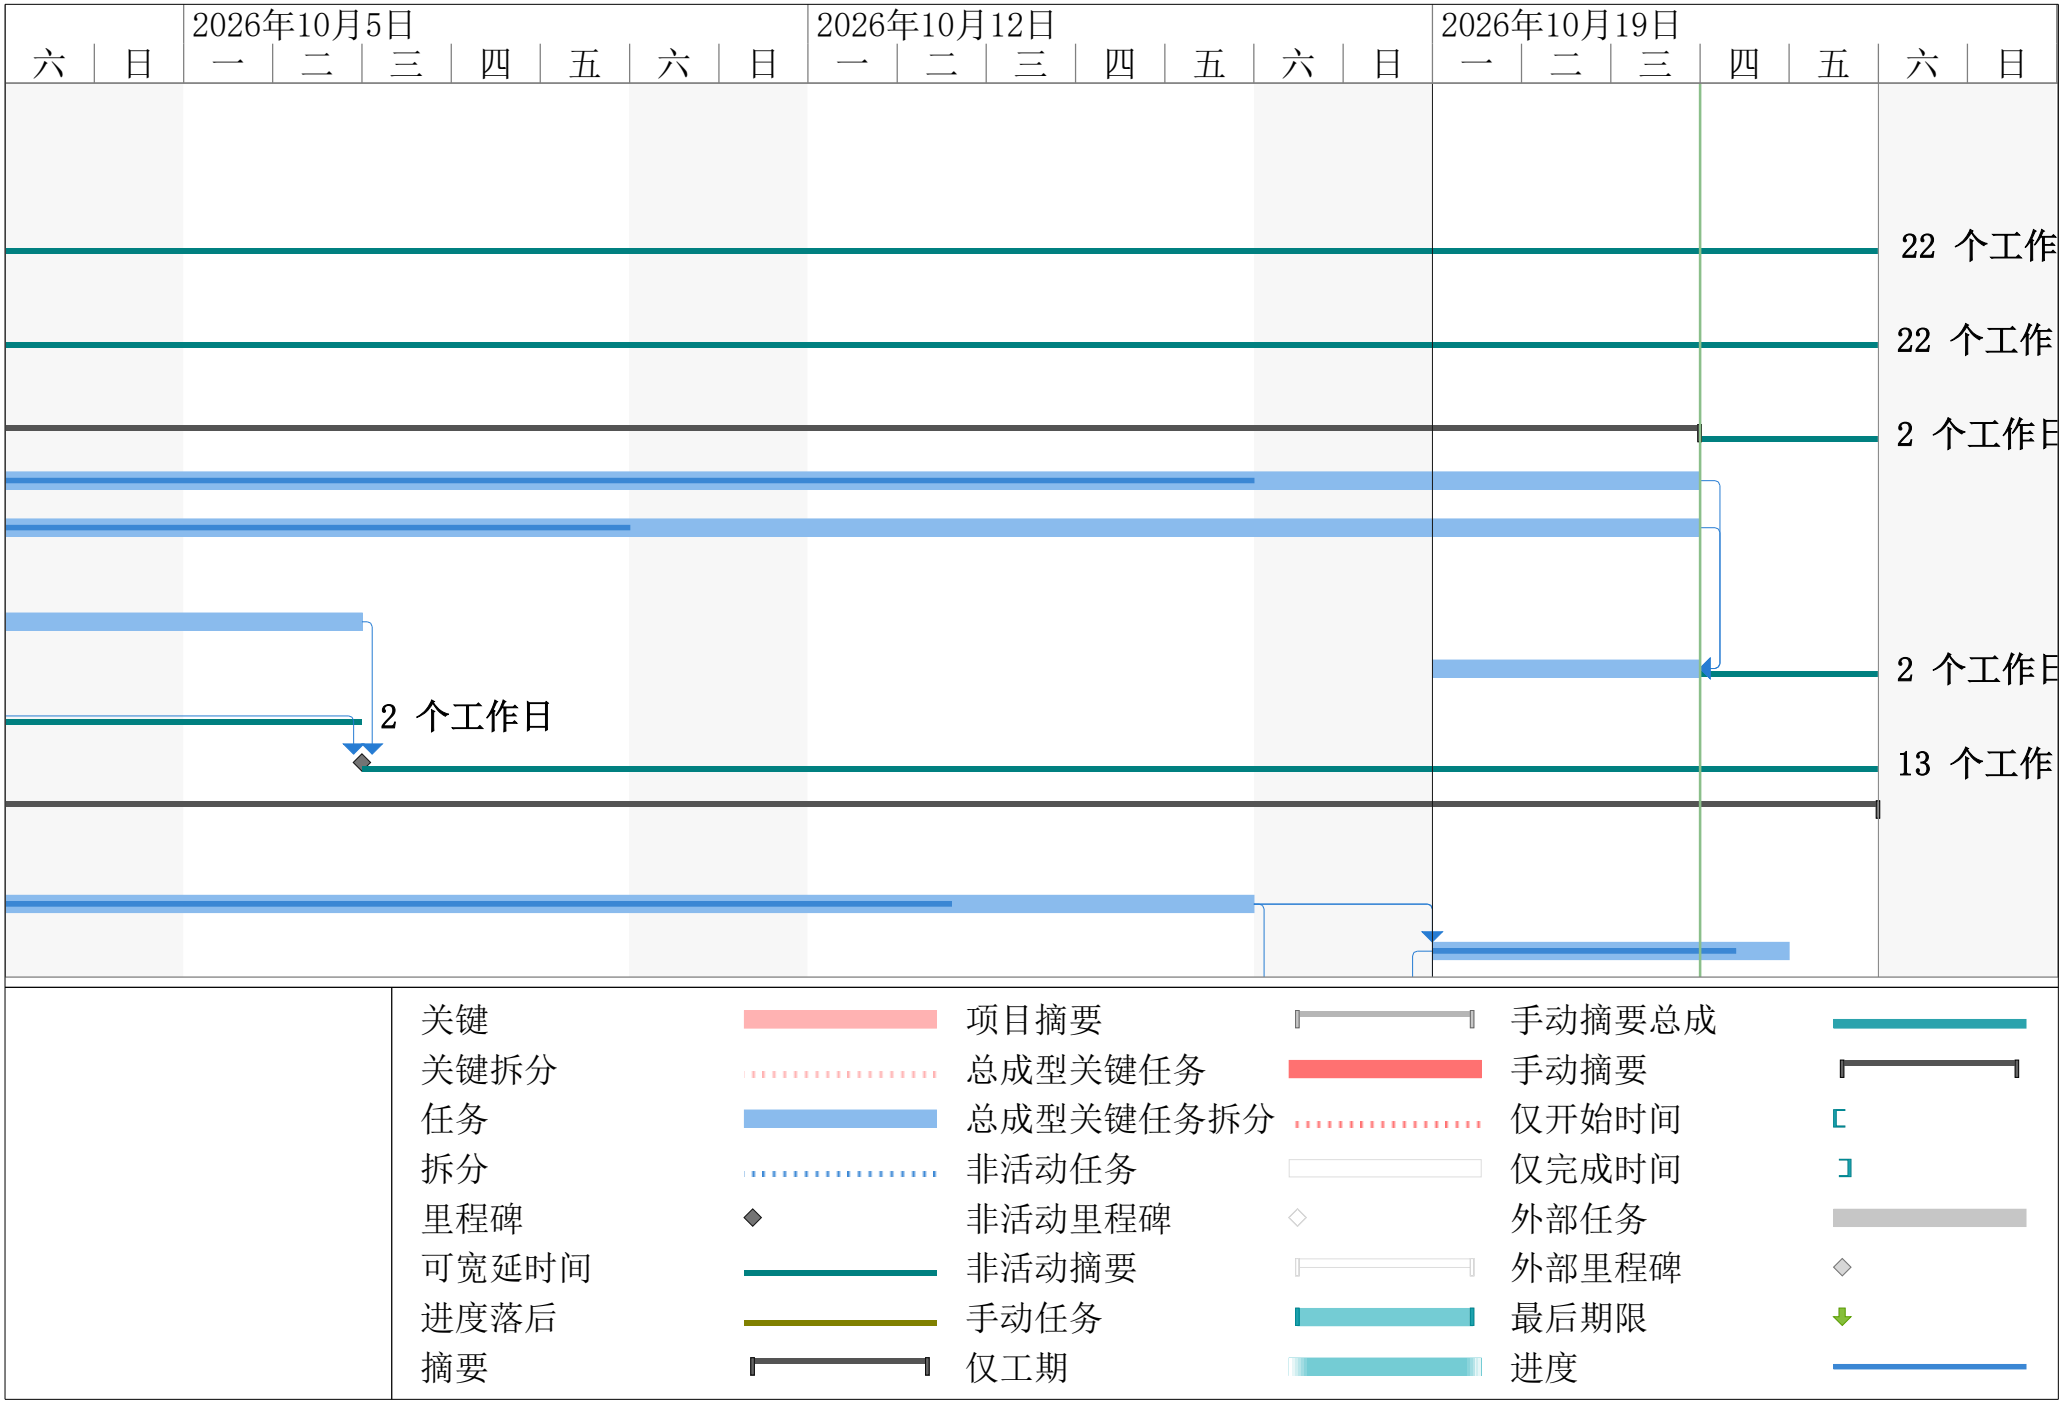

四
五
六
日
2026年9月14日
一
二
三
四
五
六
日
2026年9月21日
一
二
三
四
五
六
日
2026年9月28日
一
二
三
四
五
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度

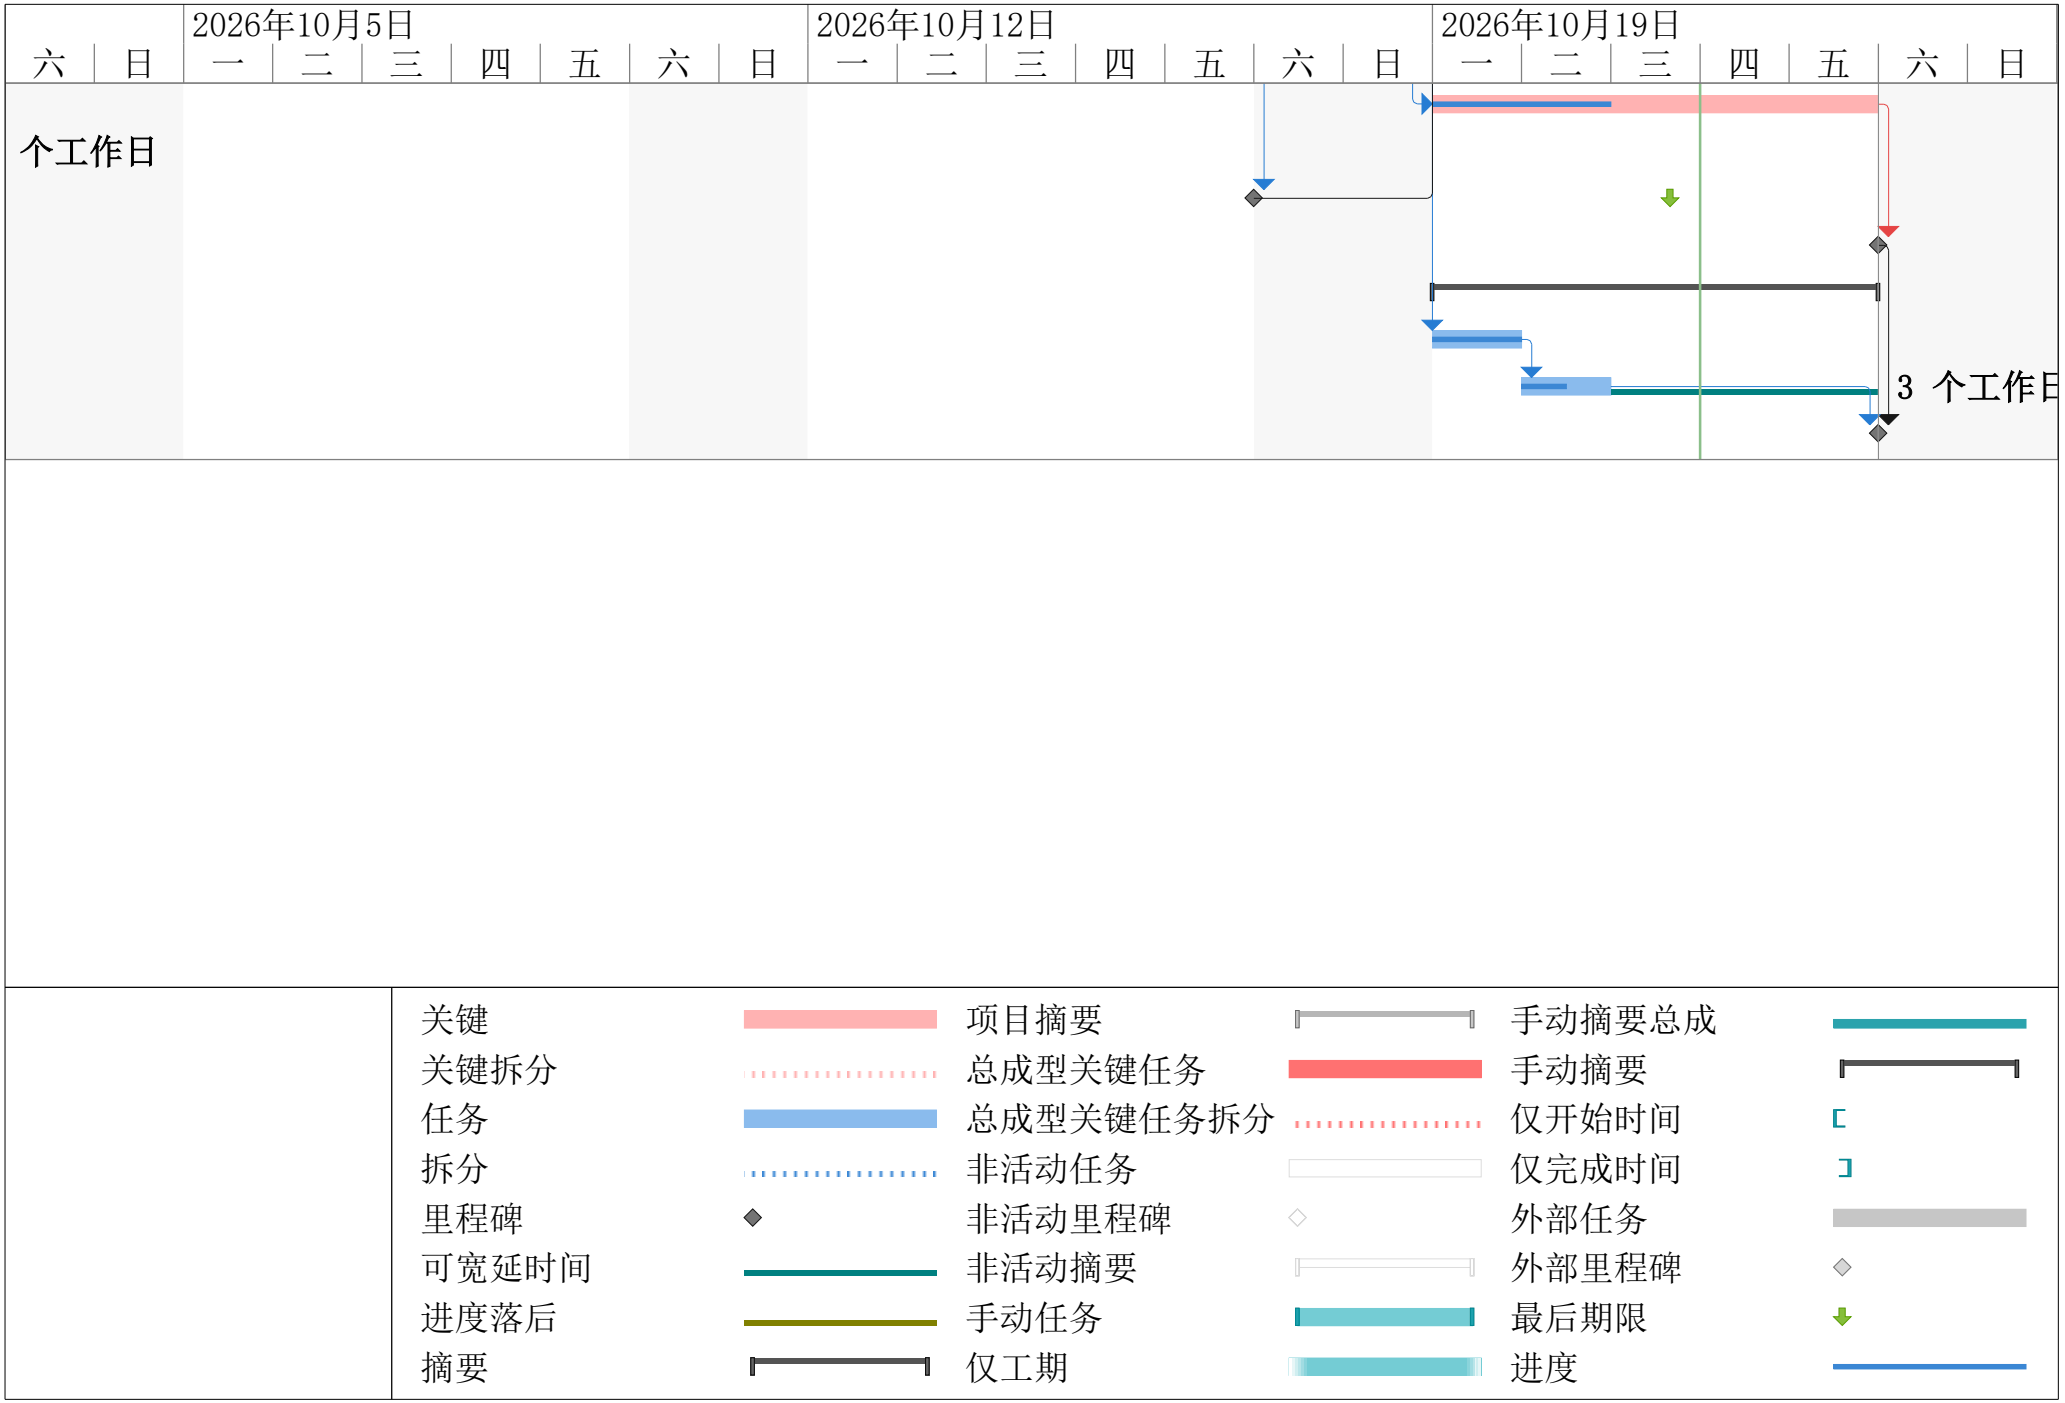

四
五
六
日
2026年9月14日
一
二
三
四
五
六
日
2026年9月21日
一
二
三
四
五
六
日
2026年9月28日
一
二
三
四
五
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
1.88
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月5日
2026年10月12日
2026年10月19日
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
2 个工作日
2 个工作日
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月5日
2026年10月12日
2026年10月19日
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
19 个工作
24 个工作
12 个工作
12 个工作
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月5日
2026年10月12日
2026年10月19日
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
22 个工作
22 个工作
2 个工作日
2 个工作日
2 个工作日
13 个工作
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月5日
2026年10月12日
2026年10月19日
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
个工作日
3 个工作日
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
