
标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			**1 Coursewor initiation and project**	**5 个工作日**	**2026年9月4日**	**2026年9月10日**		
2			1.1 Read the assignme brief and fix the deliverabl scope	1 个工作日	2026年9月4日	2026年9月4日		Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]
3			1.2 Select the project: smart	1 个工作日	2026年9月7日	2026年9月7日	2	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]

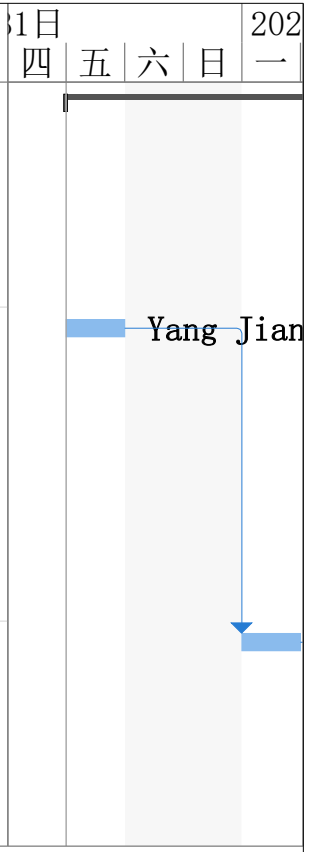

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度


标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	31日 四 五 六 日 202 一
4			1.3 Confirm the group of three and each	3 个工作日	2026年9月8日	2026年9月10日	3	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]	
5			M1 Topic and	0 个工作日	2026年9月4日	2026年9月4日			9/4
6			**2 Requireme engineerin**	**26 个工作日**	**2026年9月4日**	**2026年10月12日**			
7			2.1 Research the software needed, library	6 个工作日	2026年9月4日	2026年9月14日	5	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]	

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	31日 四 五 六 日	202 一
8			2.2 Write the requireme baseline: 8 goals, 61 functiona 24 rules, 16 NFR, 14	9 个工作日	2026年9月14日	2026年9月25日	7	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]		
9			2.3 Domain model and use	6 个工作日	2026年9月25日	2026年10月5日	8	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日



标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	31日 四 五 六 日	202 一
10			2.4 Get the requireme baseline agreed with the	5 个工作日	2026年10月5日	2026年10月12日	9	Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]		
11			M2 Requ	0 个工作日	2026年9月1	2026年9月1				
12			**3 System**	**13 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**				
13			3.1 Layer	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月1	11	Yang Jianbin -		
14			3.2 Interf	4 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	13	Yang Jianbin -		
15			3.3 Micrc	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月3	14	Yang Jianbin -		
16			M3 Archi	0 个工作日	2026年9月1	2026年9月1				
17			**4 Backenc**	**31.68 个工**	**2026年9月**	**2026年10月**				
18			4.1 FastA	10 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	16	Yang Jianbin -		
19			4.2 SQLA	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Yang Jianbin -		
20			4.3 Journ	12 个工作日	2026年9月2	2026年10月	19	Yang Jianbin -		
21			4.4 Twin,	6 个工作日	2026年10月	2026年10月	20	Yang Jianbin -		
22			4.5 Comi	4.8 个工作日	2026年9月1	2026年10月	21	Yang Jianbin -		
23			M4 Core	0 个工作日	2026年9月1	2026年9月1				

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	31日 四	五	六	日	202 一
24			**5 Map an**	**10.9 个工作**	**2026年9月**	**2026年9月**							
25			5.1 Geoc	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	23	Yang Jianbin -					
26			5.2 Cont	0.9 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	25	Yang Jianbin -					
27			5.3 Mobi	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	26	Yang Jianbin -					
28			5.4 Deter	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	25	Yang Jianbin -					
29			M5 Provi	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2							
30			**6 AI agen**	**34.8 个工作**	**2026年9月**	**2026年10月**							
31			6.1 Inten	6 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	29	Yang Jianbin -					
32			6.2 Missi	7 个工作日	2026年9月2	2026年10月	31	Yang Jianbin -					
33			6.3 Tool	6 个工作日	2026年10月	2026年10月	32	Yang Jianbin -					
34			6.4 Eleve	5 个工作日	2026年10月	2026年10月	33	Yang Jianbin -					
35			6.5 Nativ	4.8 个工作日	2026年9月1	2026年10月	34	Yang Jianbin -					
36			M6 Ager	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2							
37			**7 Fronten**	**14 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**							
38			7.1 V8Ex	9 个工作日	2026年9月2	2026年10月	36	Yang Jianbin -					
39			7.2 MapL	7 个工作日	2026年9月2	2026年10月	38SS	Yang Jianbin -					
40			7.3 Copil	7 个工作日	2026年10月	2026年10月	39	Yang Jianbin -					
41			M7 Front	0 个工作日	2026年10月	2026年10月							

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务　非活动摘要　外部任务
拆分　手动任务　外部里程碑
里程碑　仅工期　最后期限
摘要　手动摘要总成　进度
项目摘要　手动摘要　手动进度
非活动任务　仅开始时间
非活动里程碑　仅完成时间

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
42		**8 Integrat**	**30.88 个工**	**2026年9月**	**2026年10月**		
43		8.1 Auth	10 个工作日	2026年10月	2026年10月	41	Yang Jianbin -
44		8.2 Back	4 个工作日	2026年9月1	2026年10月	43	Codex - paralle
45		M8 Integ	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
46		**9 Verifica**	**17.13 个工**	**2026年10月**	**2026年11月**		
47		9.1 Backe	1.8 个工作日	2026年10月	2026年10月	45	Qoder agent la
48		9.2 Front	3.2 个工作日	2026年10月	2026年10月	47	Qoder agent la
49		9.3 Close	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	48SS	Yang Jianbin -
50		9.4 Physi	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	49	Yang Jianbin -
51		M9 Syste	0 个工作日	2026年11月	2026年11月		
52		**10 Course**	**38 个工作日**	**2026年9月**	**2026年11月**		
53		10.1 Part	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	16	Yang Jianbin -
54		10.2 Mid	0.9 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	53	Yang Jianbin -
55		10.3 Part	0.8 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	54	Yang Jianbin -
56		10.4 Part	3 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	55SS	Yang Jianbin -
57		M10 Part	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
58		M11 Mid	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
59		M12 Part	0 个工作日	2026年11月	2026年11月		

31日
四 五 六 日

202
一


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	31日 四 五 六 日	202 一
60			**11 Final a**	**42.88 个工**	**2026年9月**	**2026年11月**				
61			11.1 Evid	2 个工作日	2026年9月	2026年9月	55	Yang Jianbin -		
62			11.2 Pub	0.5 个工作日	2026年9月	2026年9月	61	Yang Jianbin -		
63			M13 Fina	0 个工作日	2026年11月	2026年11月				

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

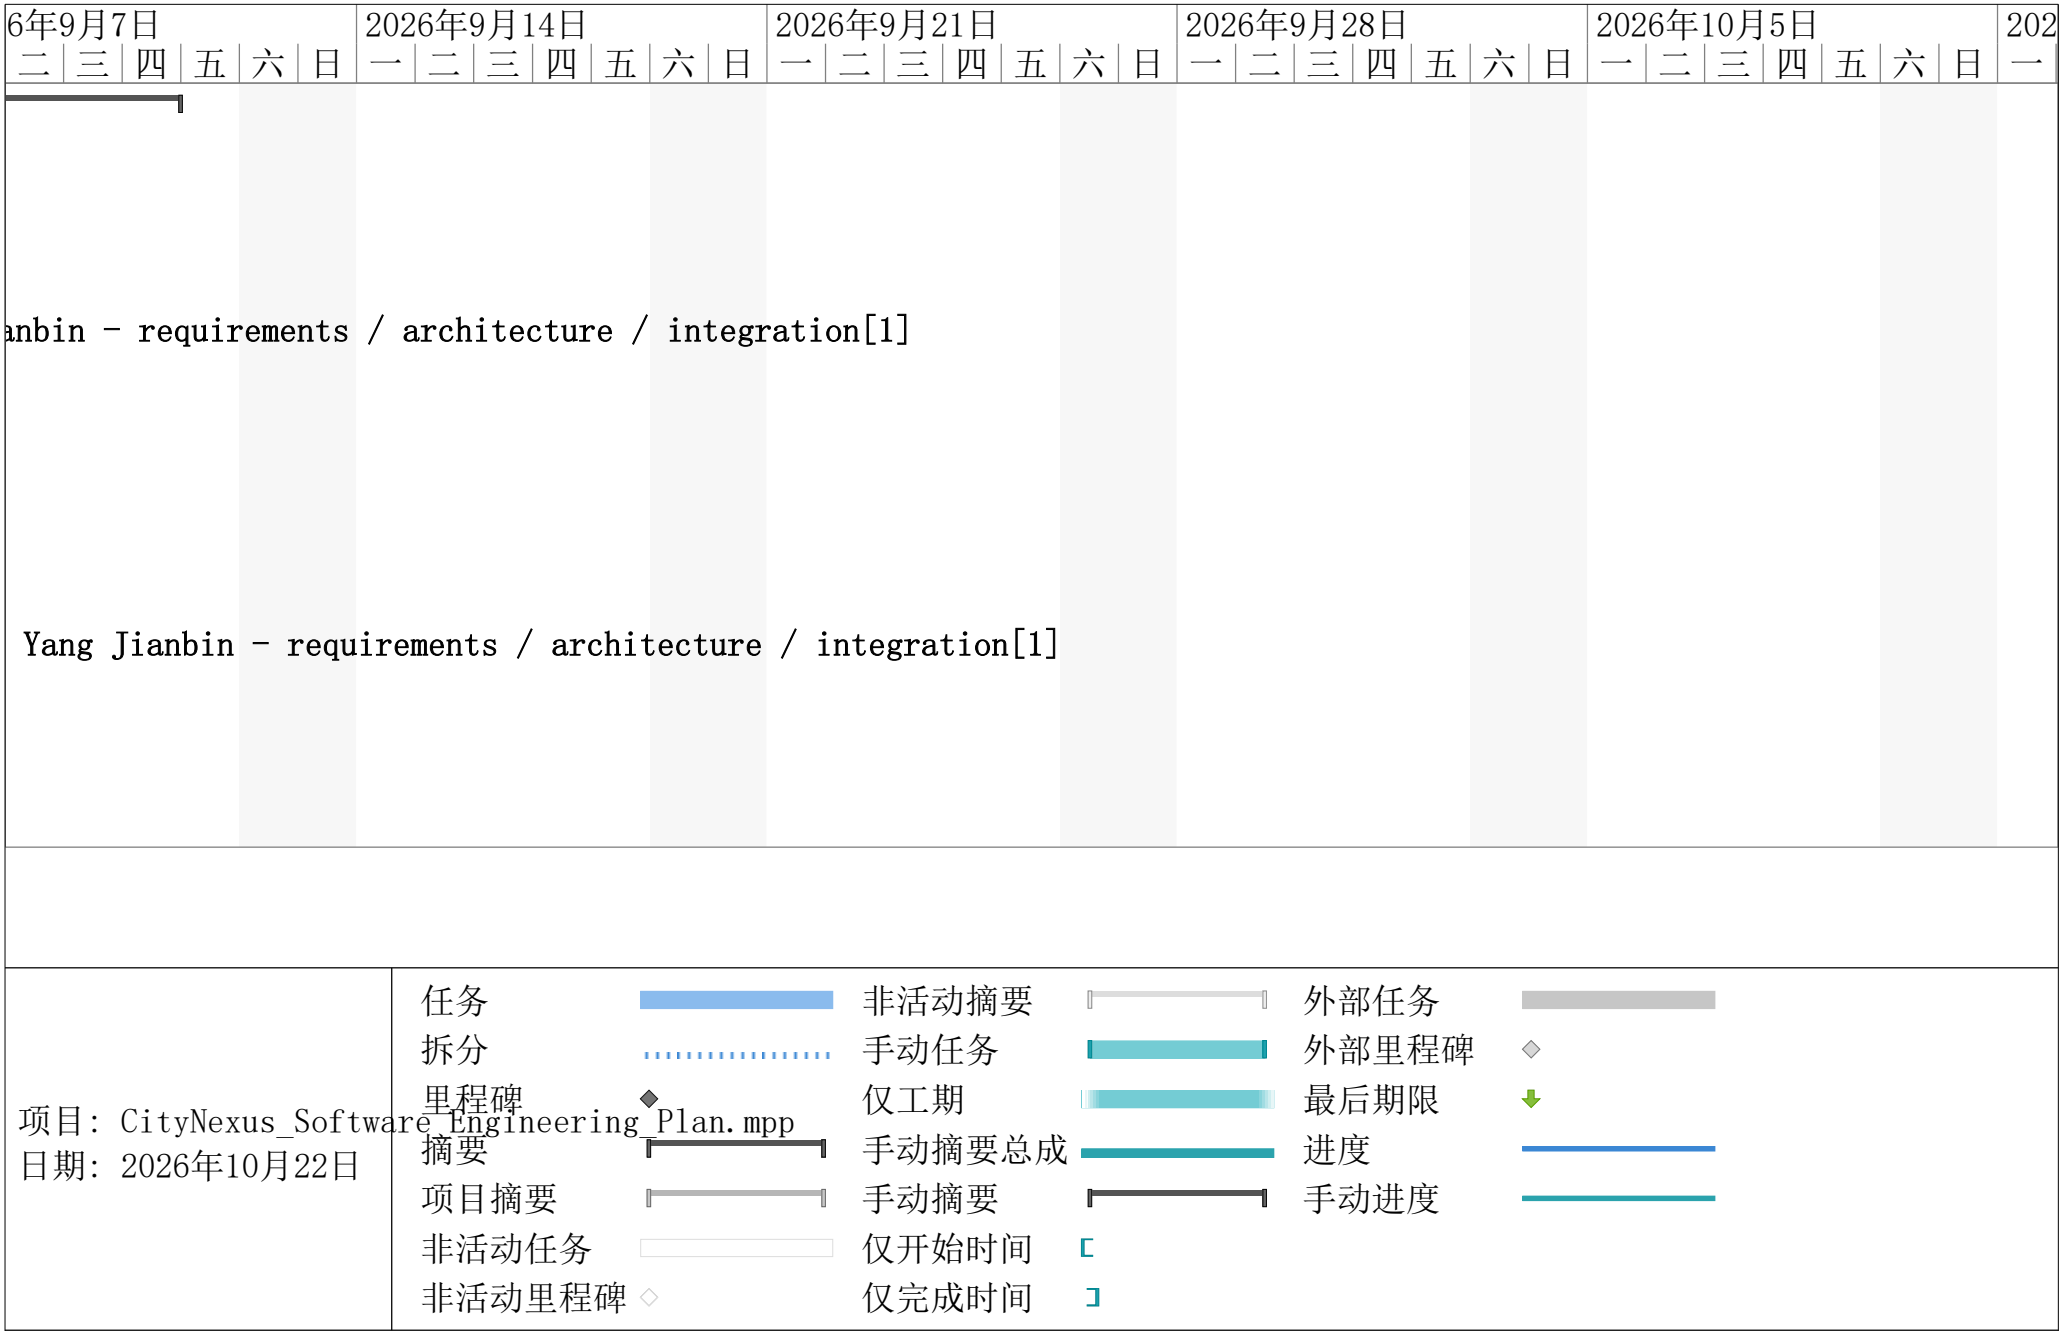
6年9月7日
二 三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四 五 六 日
202
一
anbin - requirements / architecture / integration[1]
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]
项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

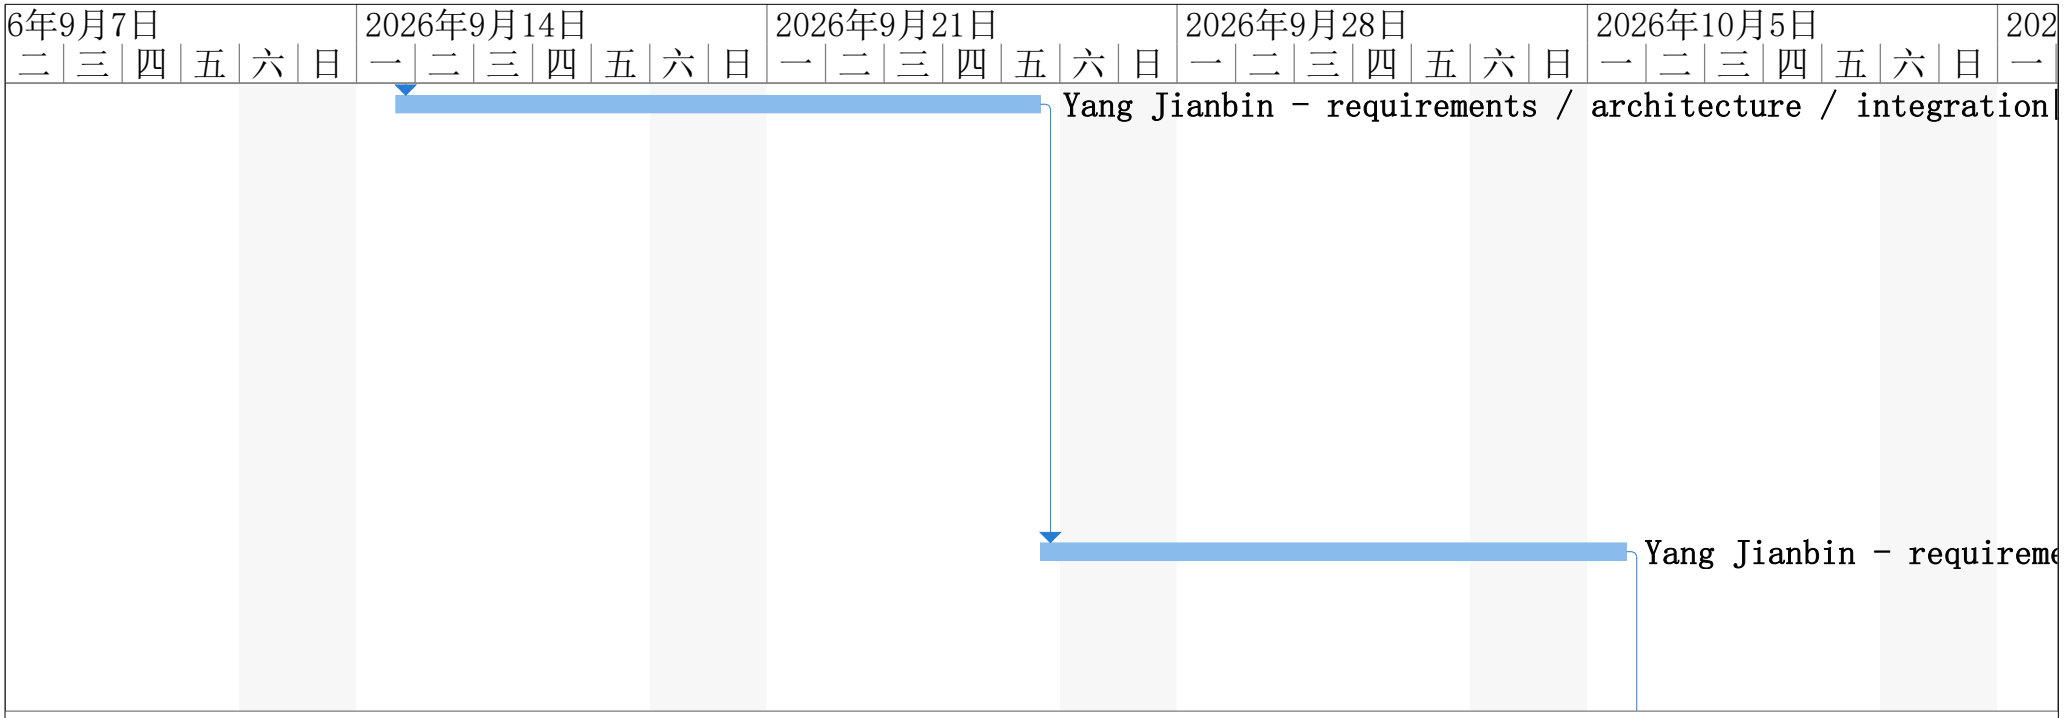


项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

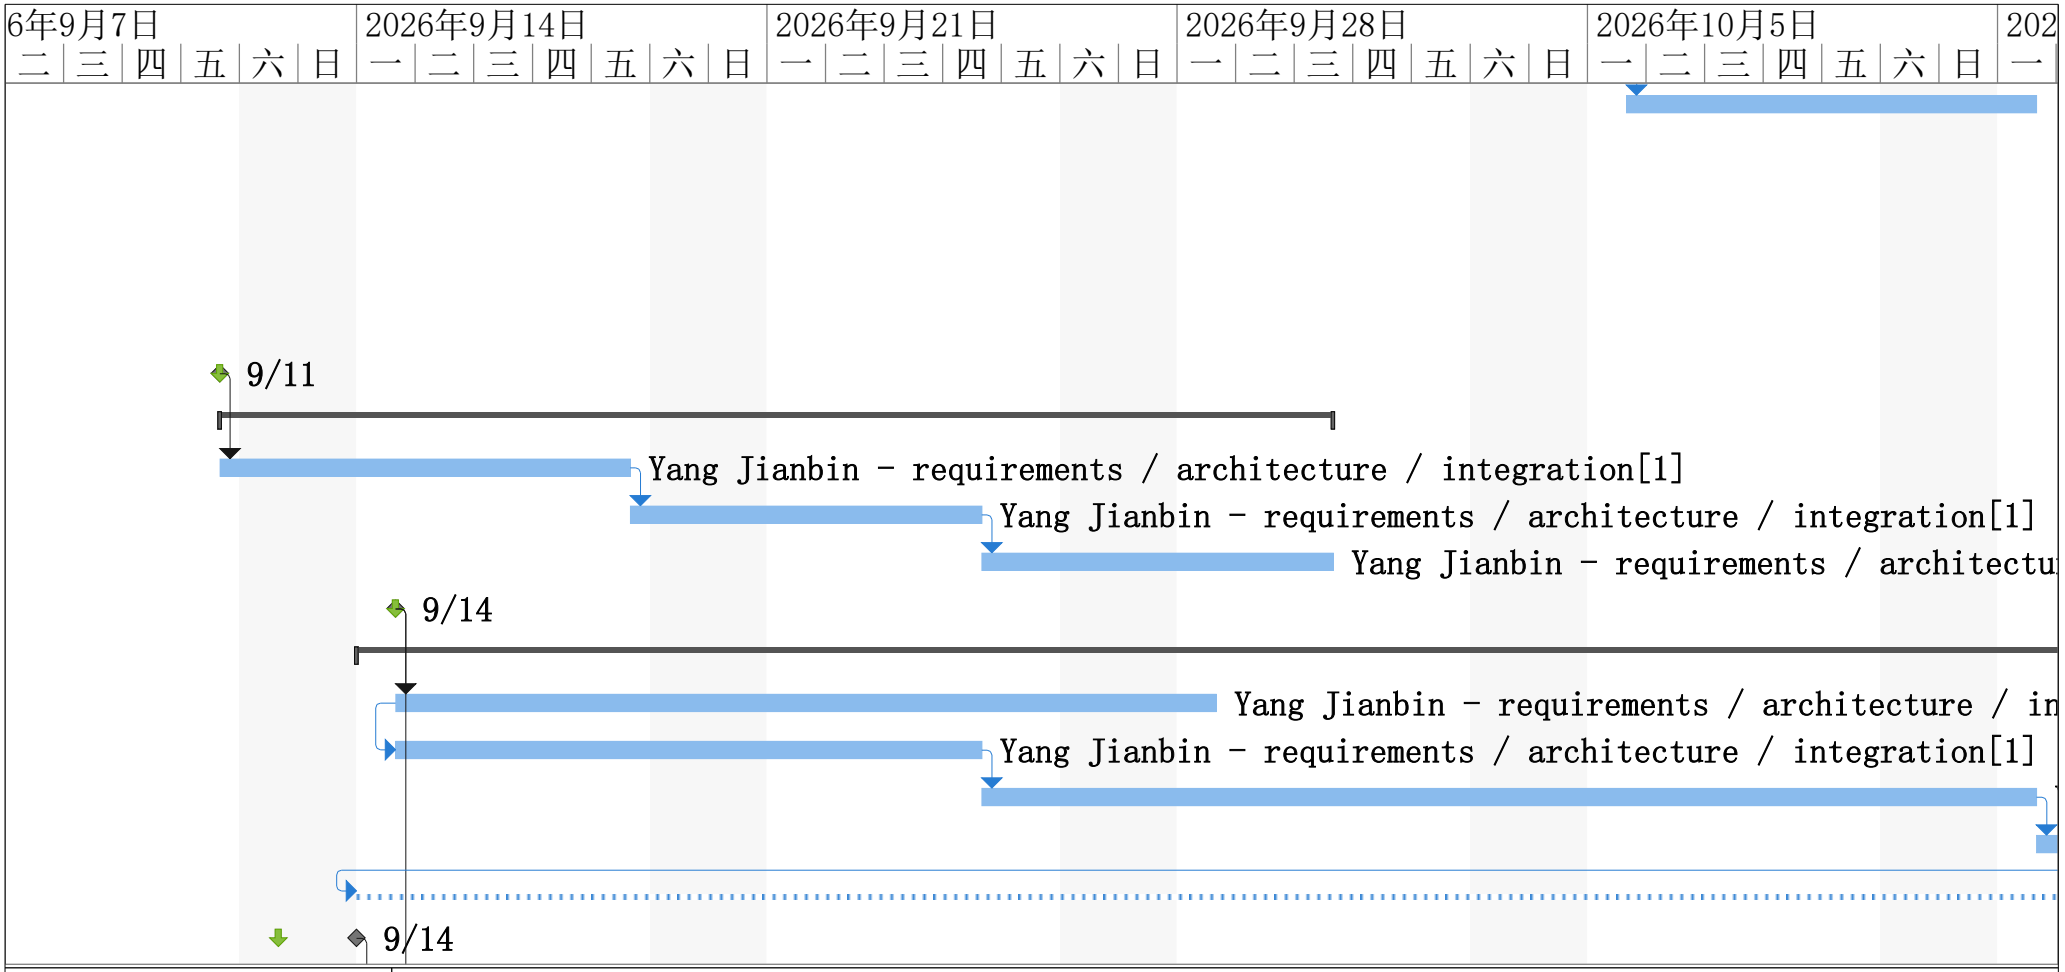


项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

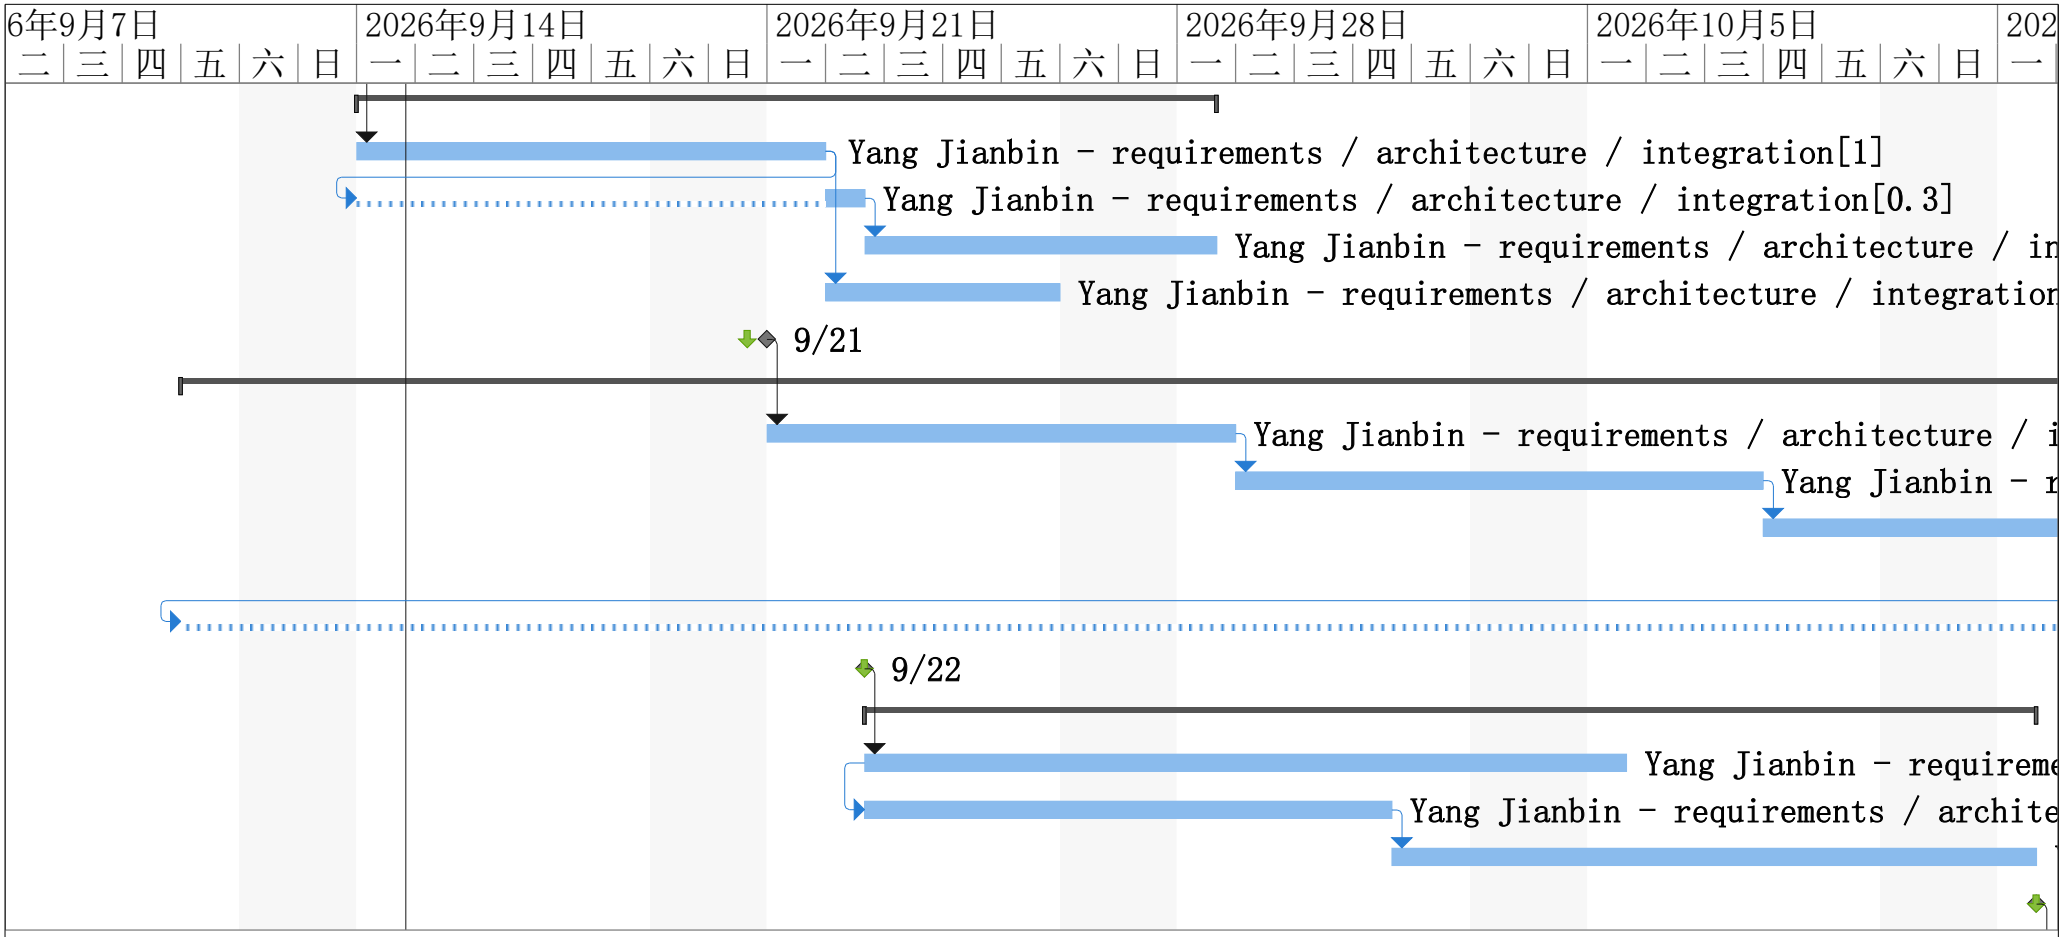


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

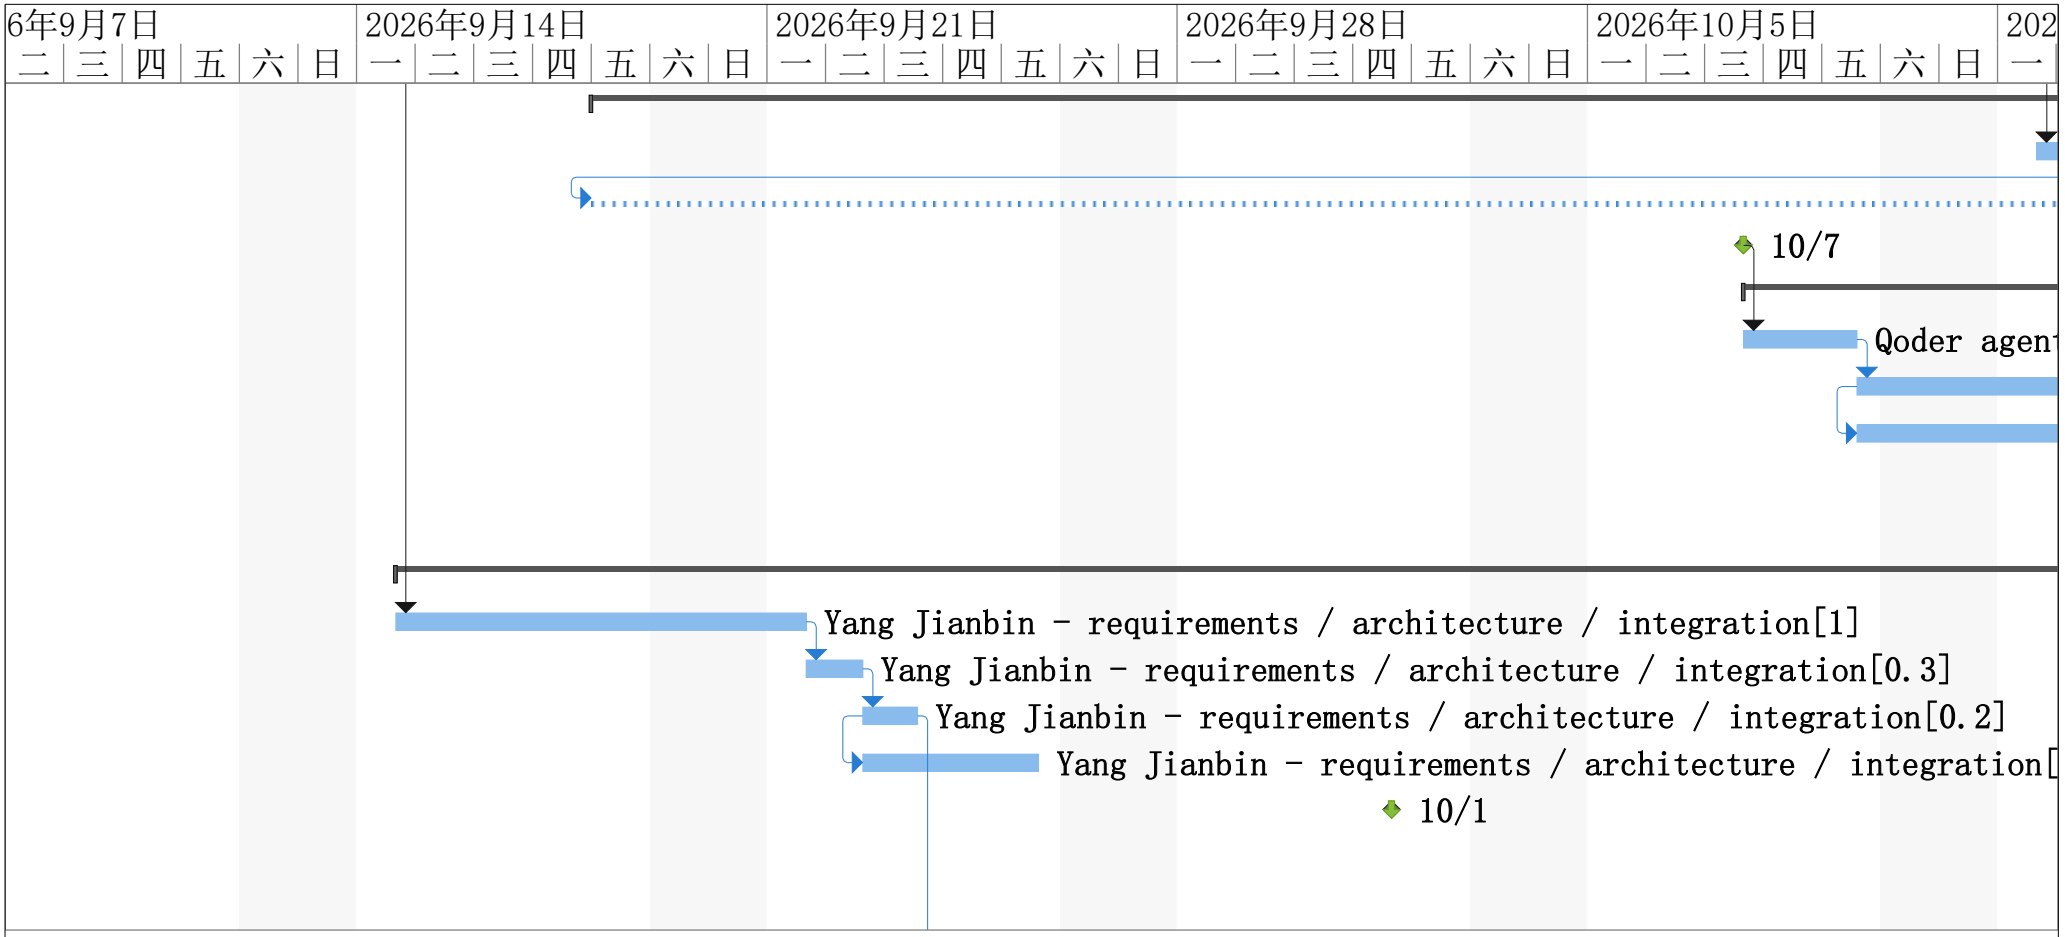

项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

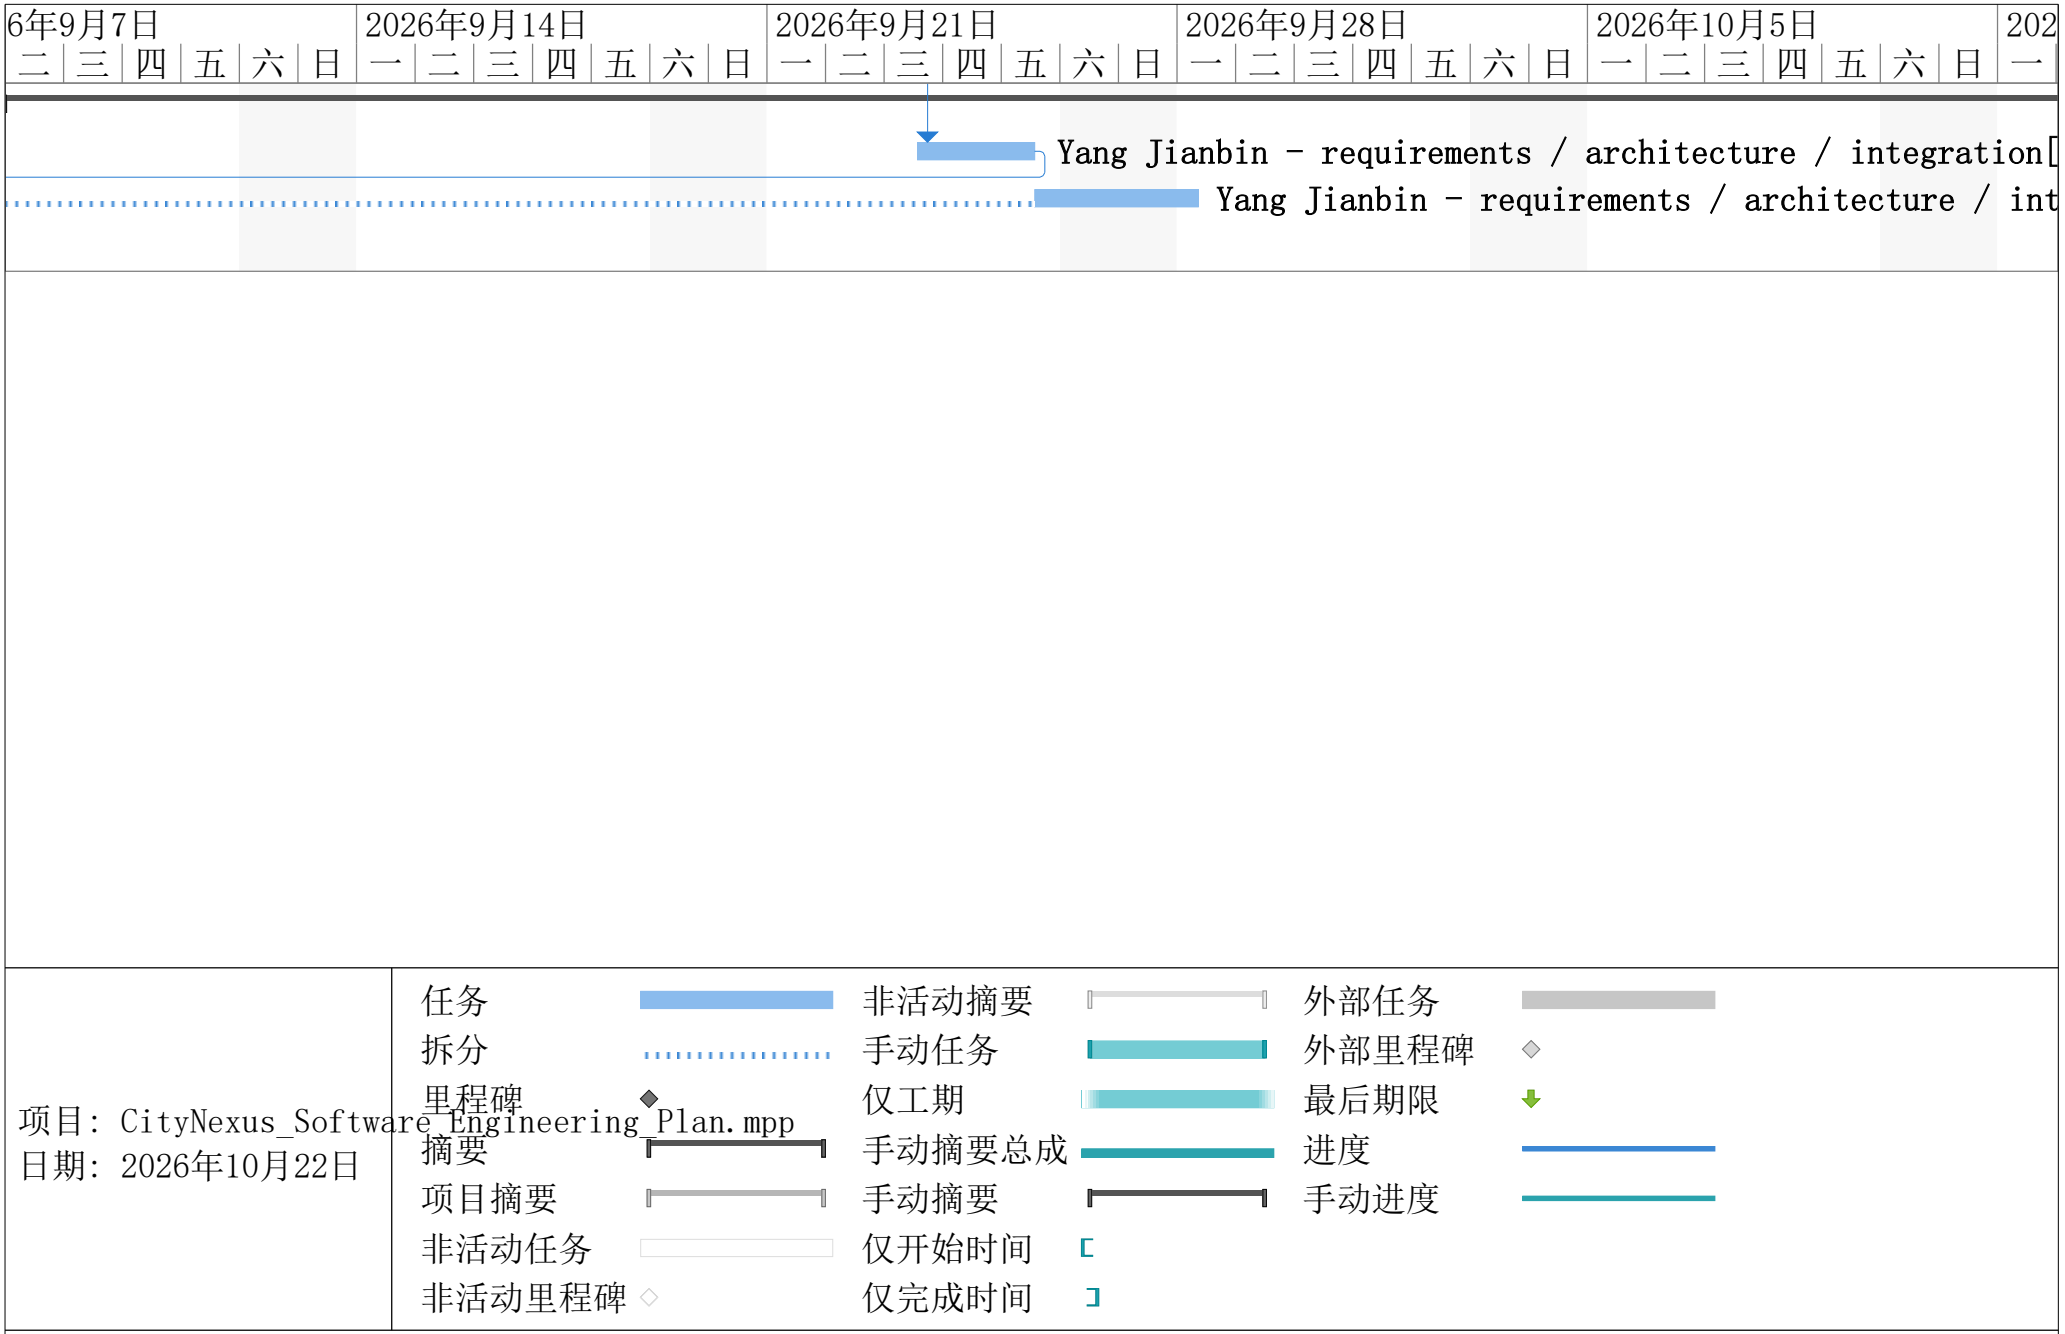
6年9月7日
二 三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四 五 六 日
202
一
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration
Yang Jianbin - requirements / architecture / int
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

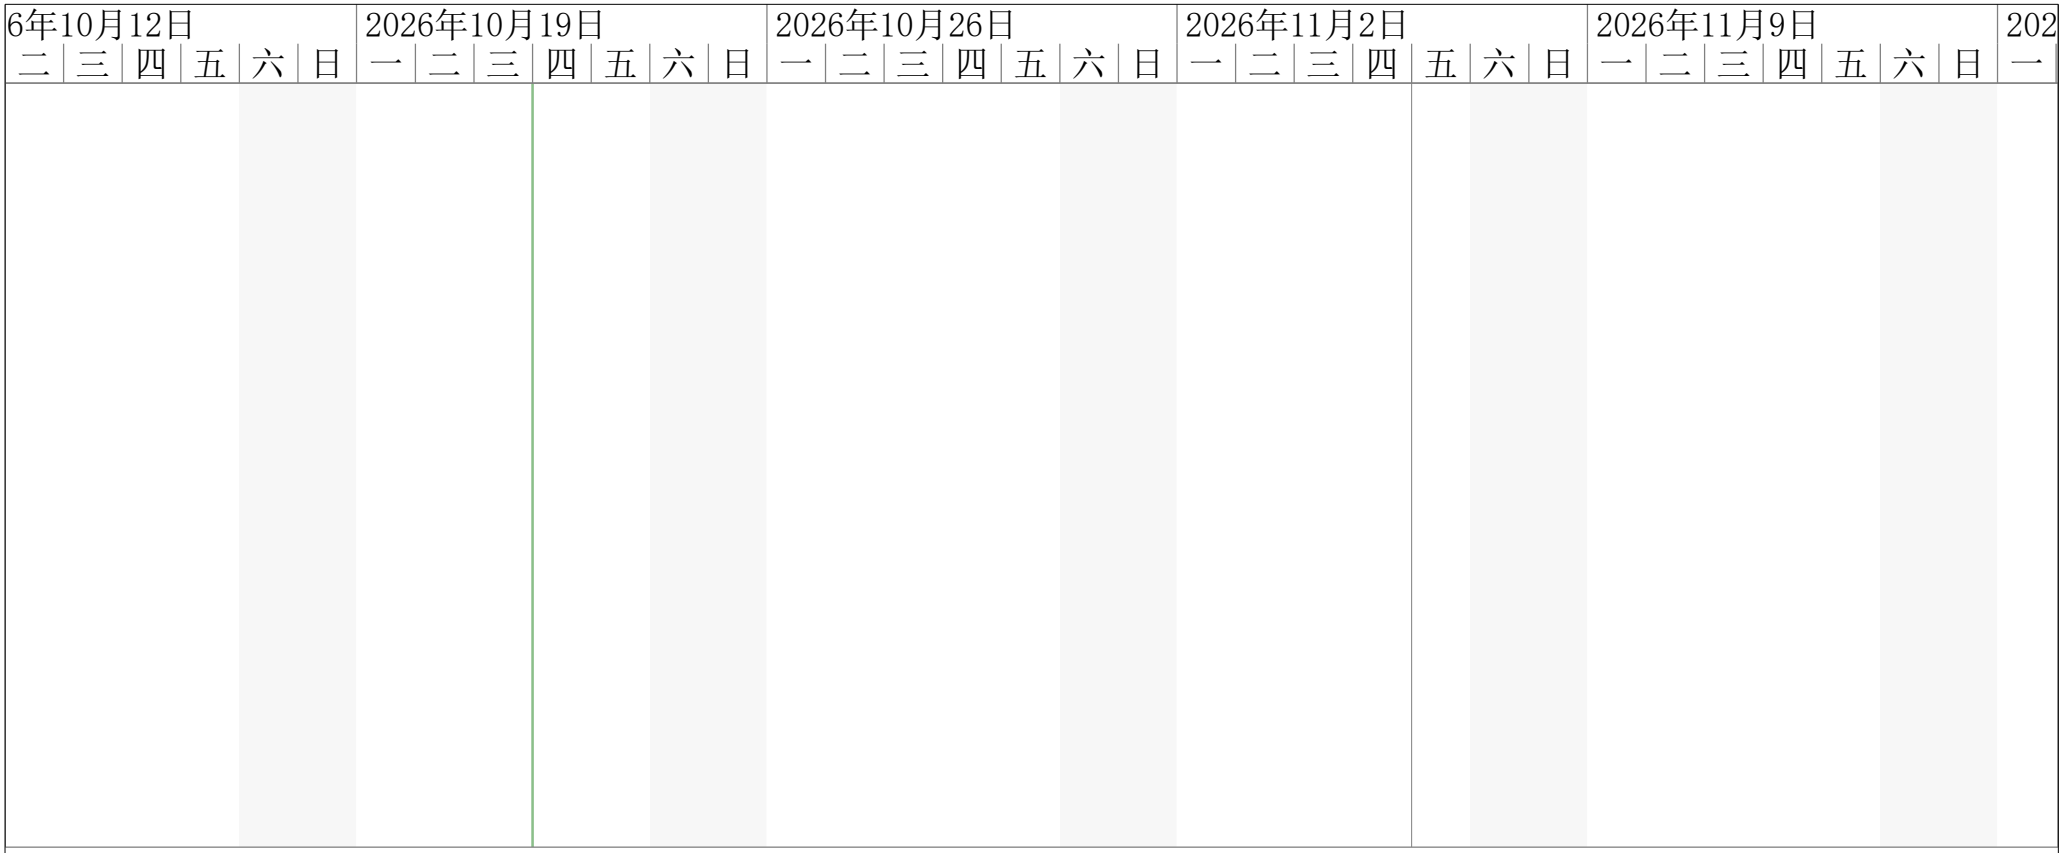

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

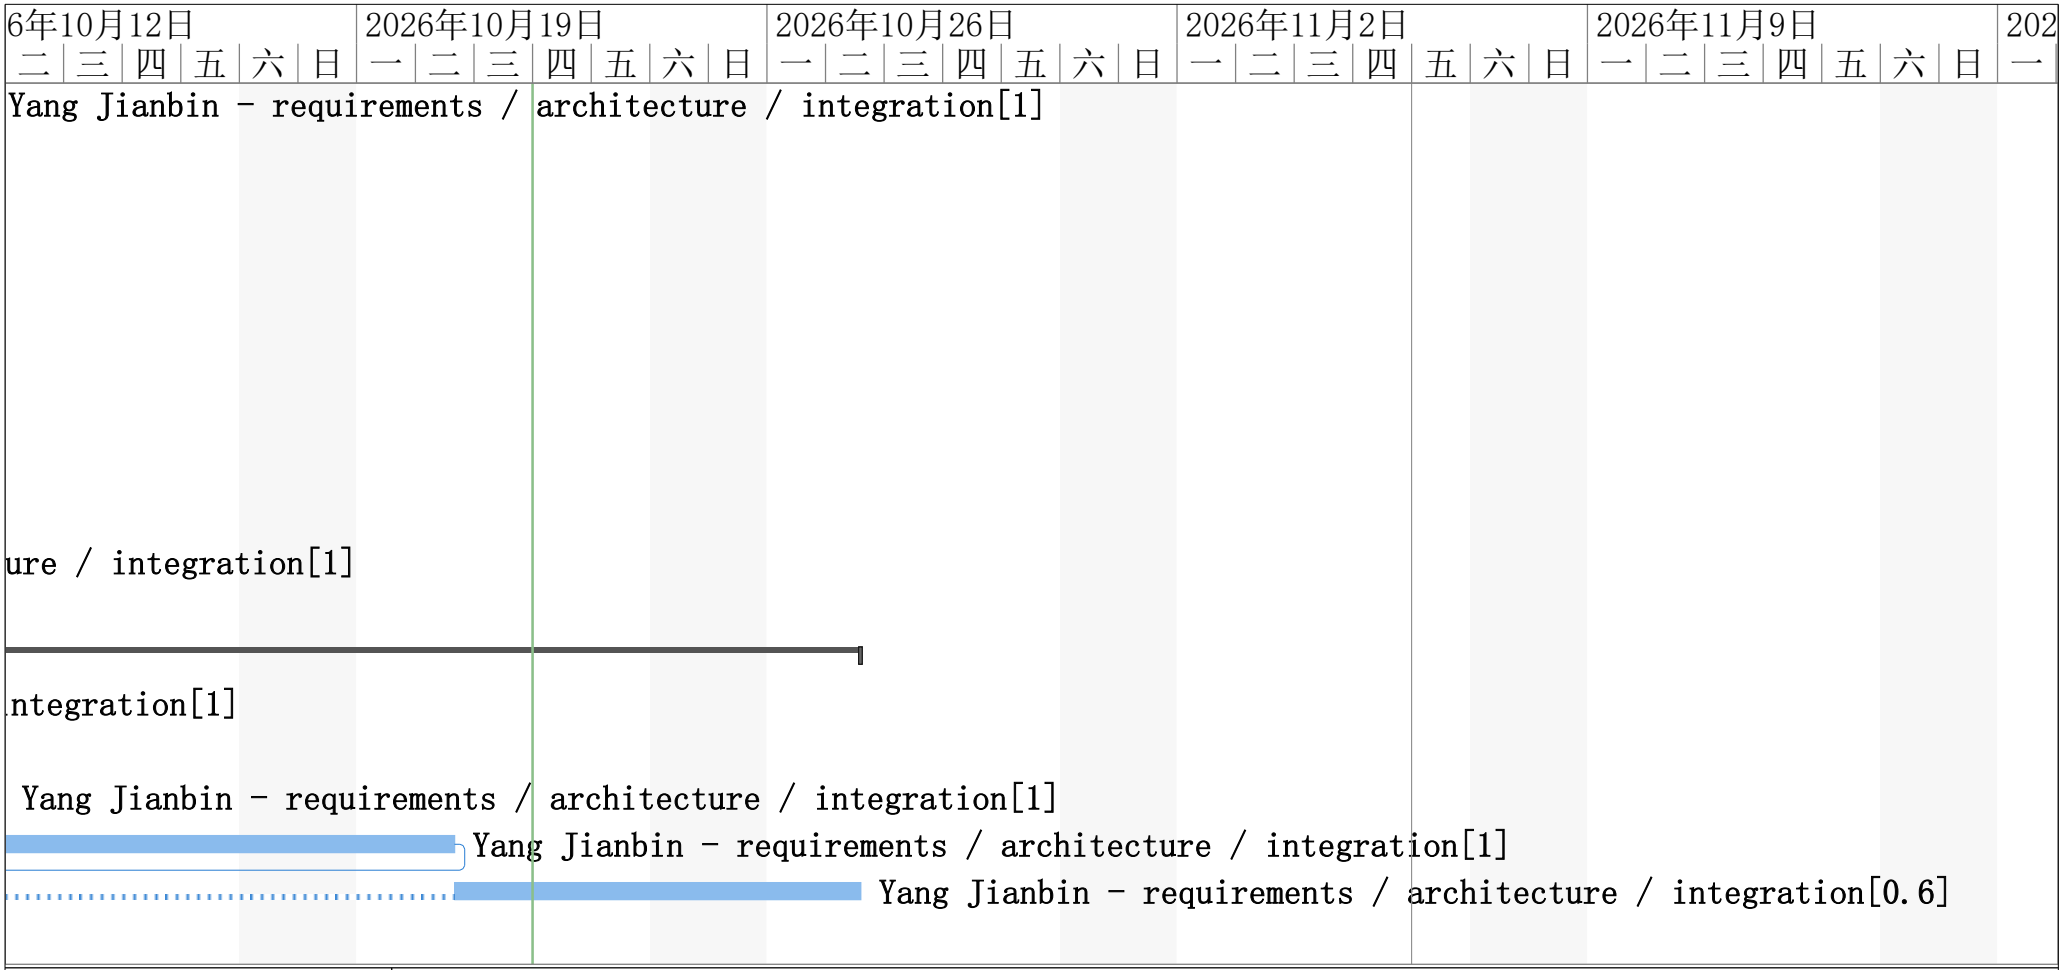

项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

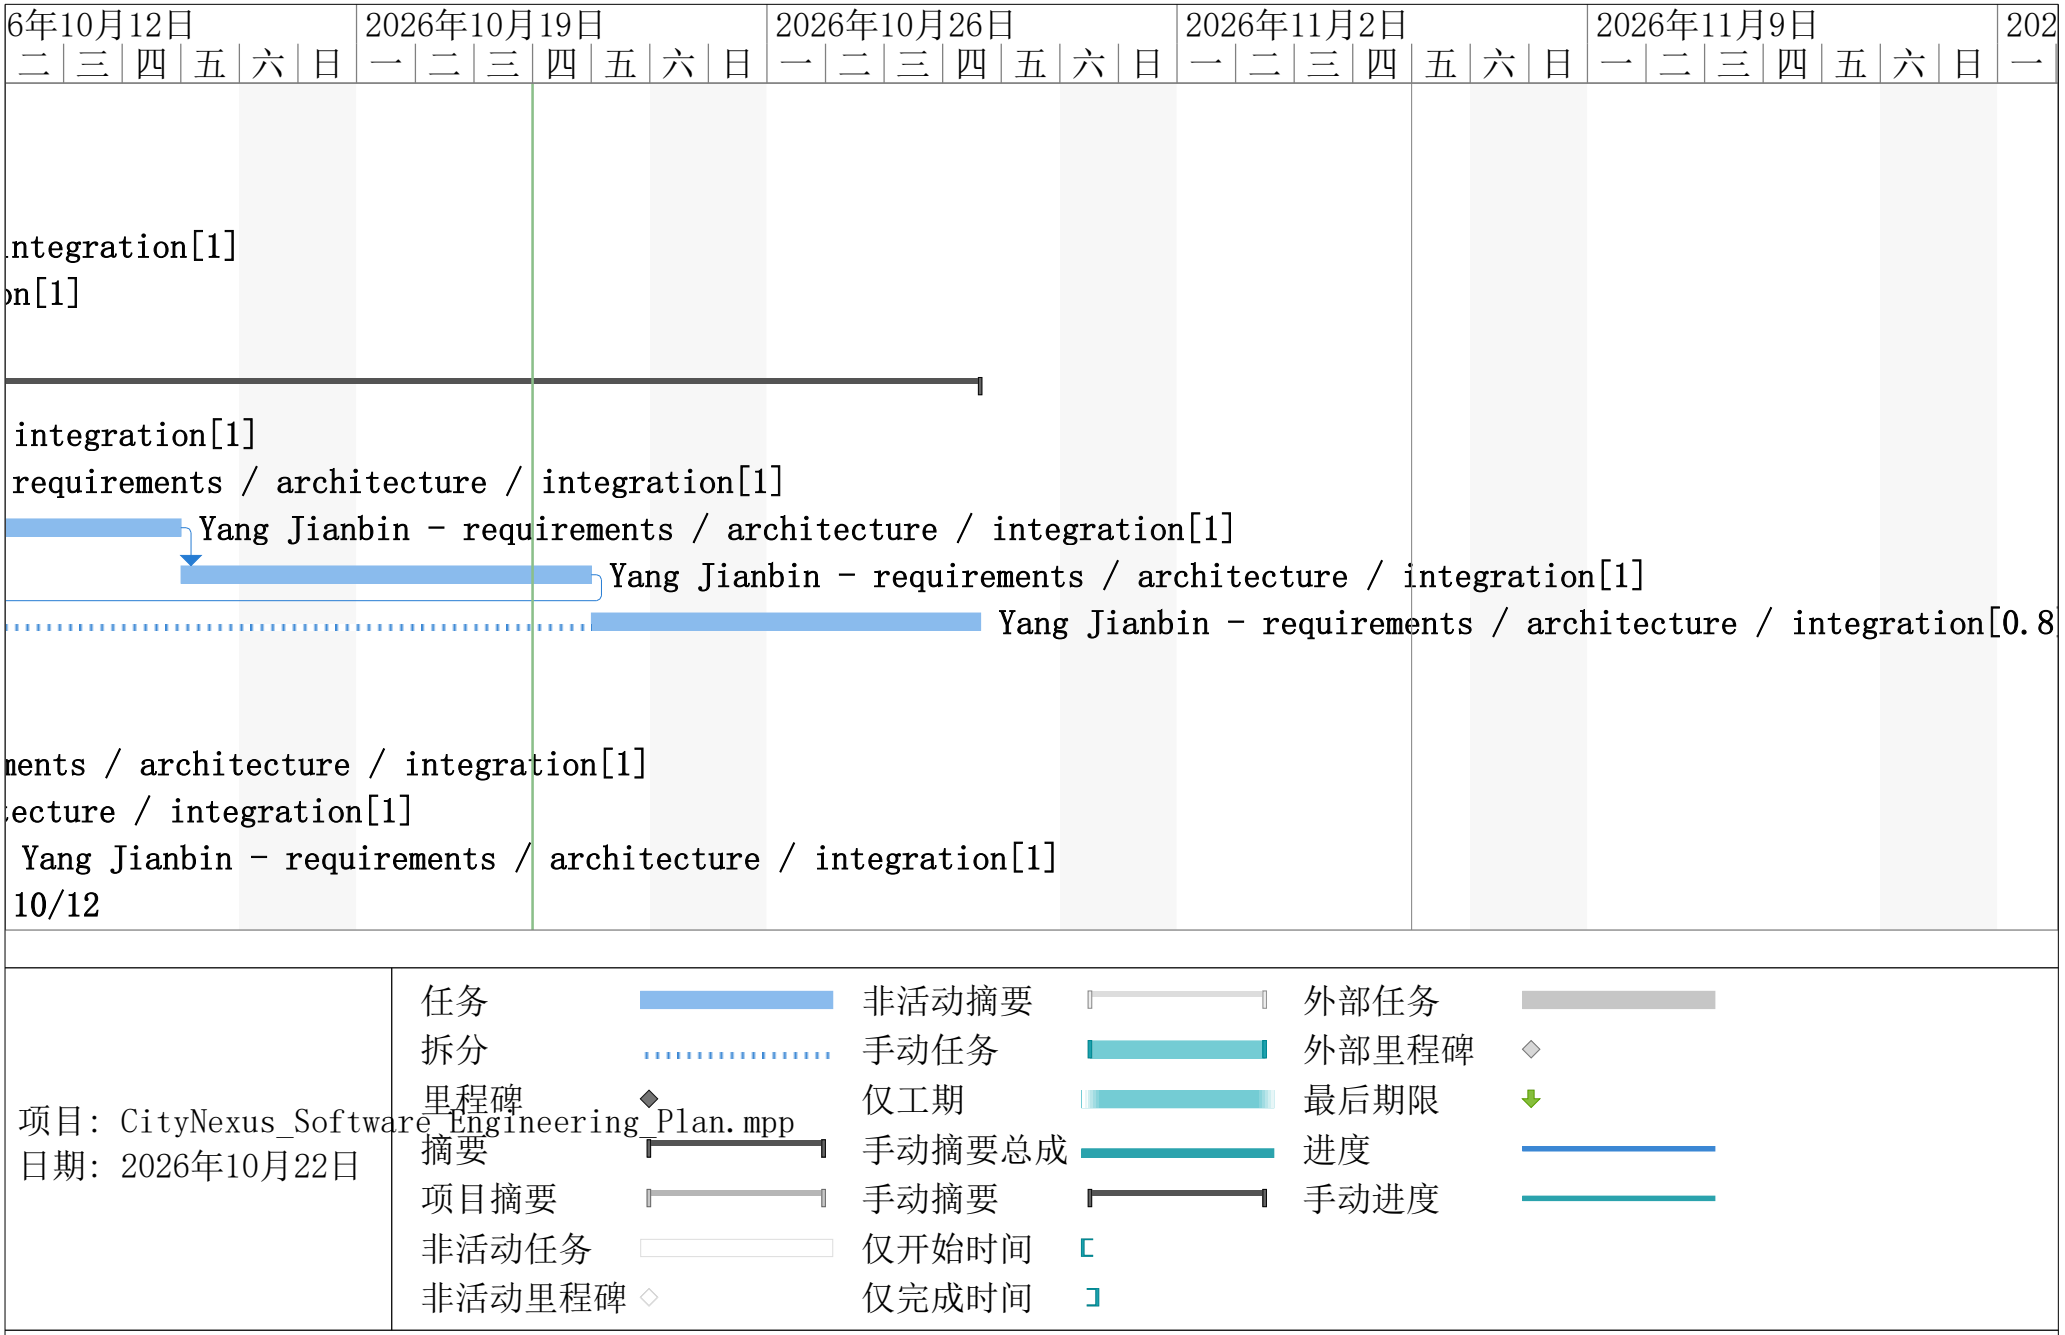
6年10月12日
二 三 四 五 六 日
2026年10月19日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月26日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月2日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月9日
一 二 三 四 五 六 日
202
ntegration[1]
on[1]
integration[1]
requirements / architecture / integration[1]
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[0.8
ments / architecture / integration[1]
ecture / integration[1]
Yang Jianbin - requirements / architecture / integration[1]
10/12
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

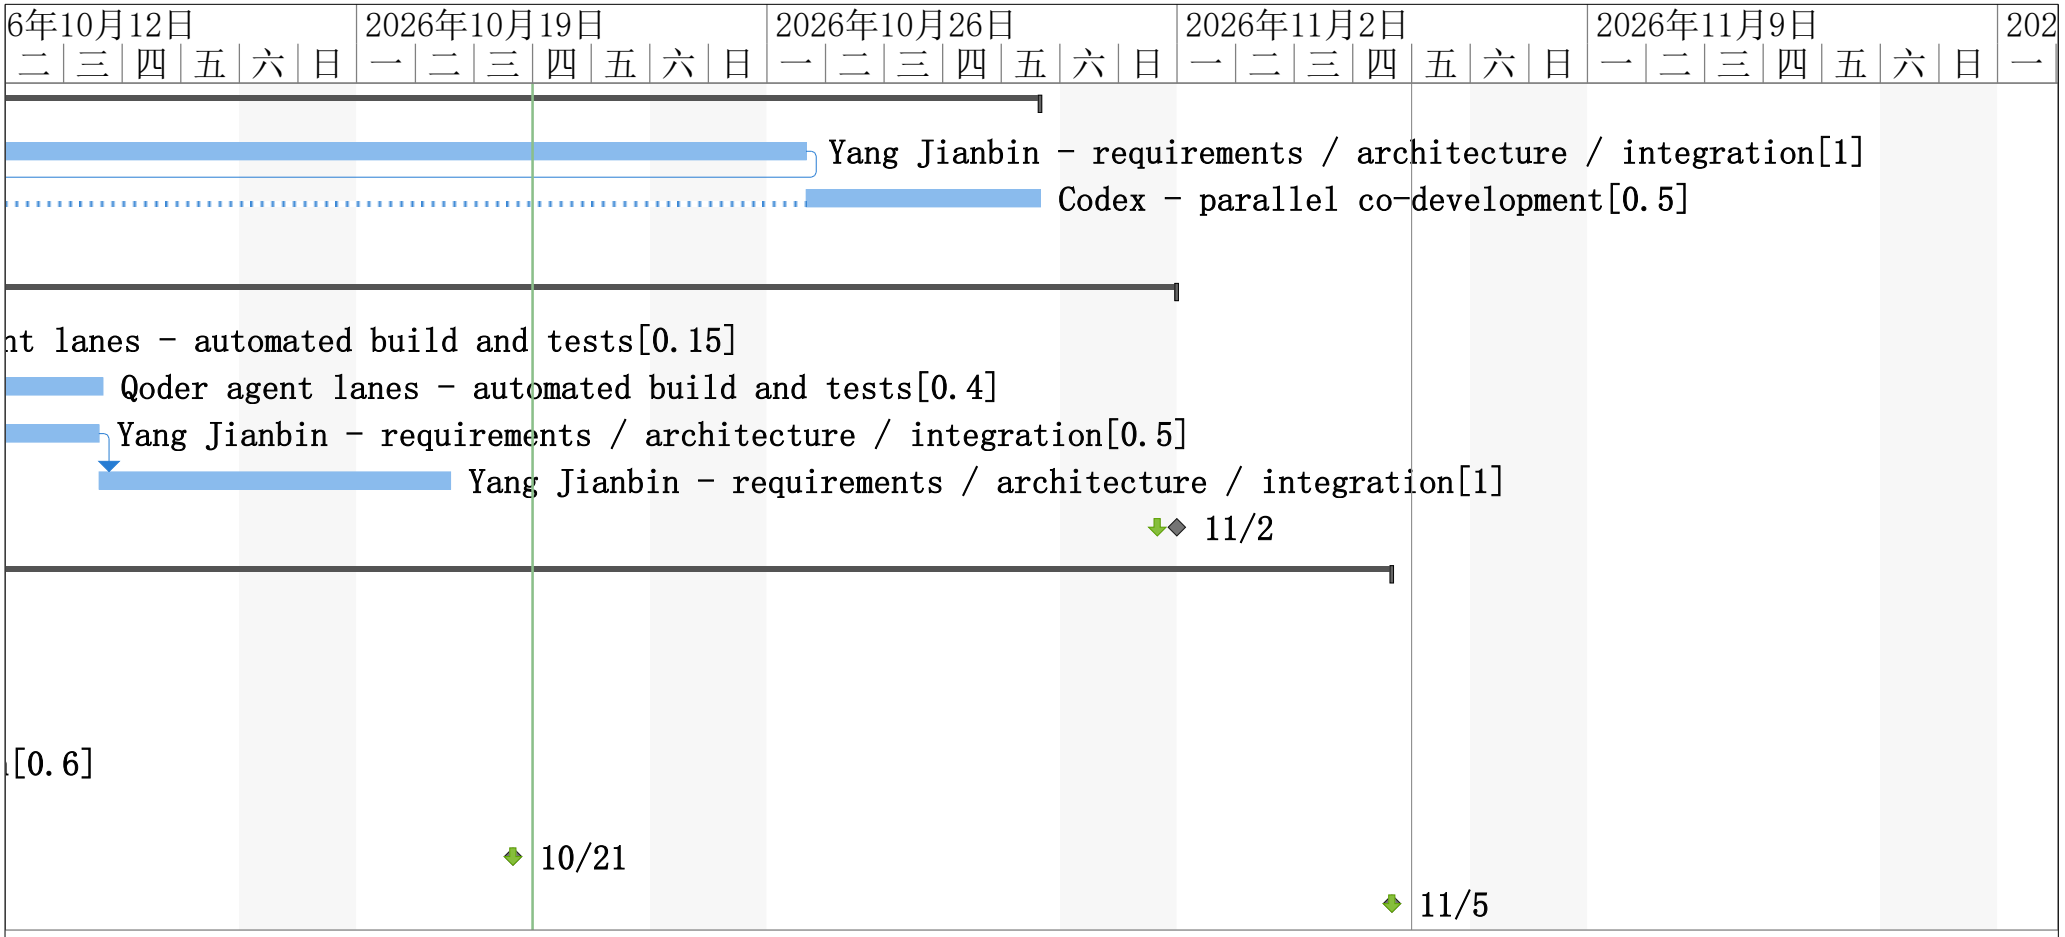

项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

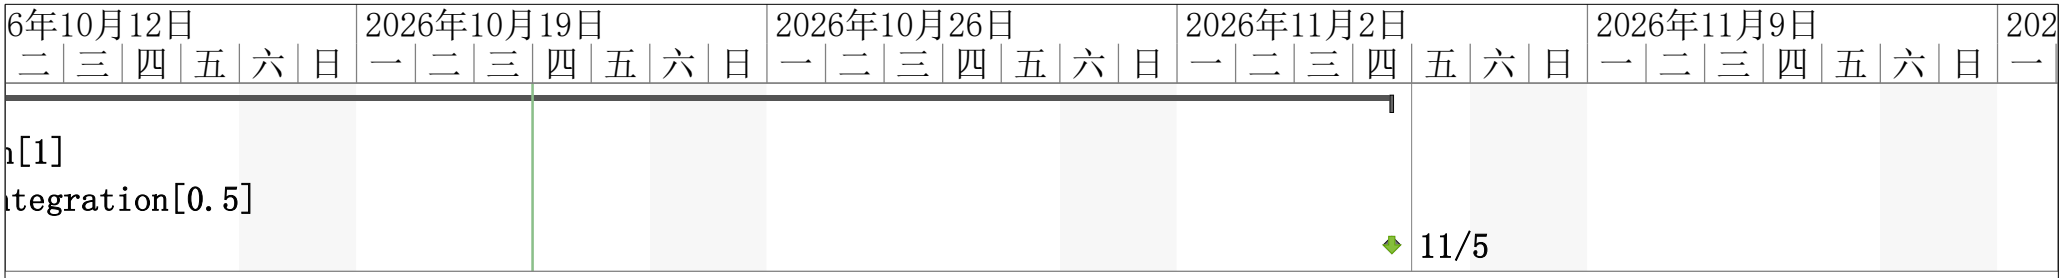

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	
