1 Coursework initiation and project sele
开始时间: 2026年9月4日 标识号: 1
完成时间: 2026年9月10日 工期: : 5 个工作日
完成: 0%

1.1 Read the assignment brief and fix the deliverable sc
开始日期: 2026年9月4日 标识号: 2
完成时间: 2026年9月4日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

M1 Topic and scope agreed
[里程碑日期:] 2026年9月4日
标识号: 5

2 Requirements engineering
开始时间: 2026年9月4日 标识号: 6
完成时间: 2026年10月1日 工期: : 26 个工作日
完成: 0%

M2 Requirements baseline drafted
[里程碑日期:] 2026年9月11日
标识号: 11

3 System design and architecture
开始时间: 2026年9月11日 标识号: 12
完成时间: 2026年9月30日 工期: : 13 个工作日
完成: 0%

M3 Architecture design complete
[里程碑日期:] 2026年9月14日
标识号: 16

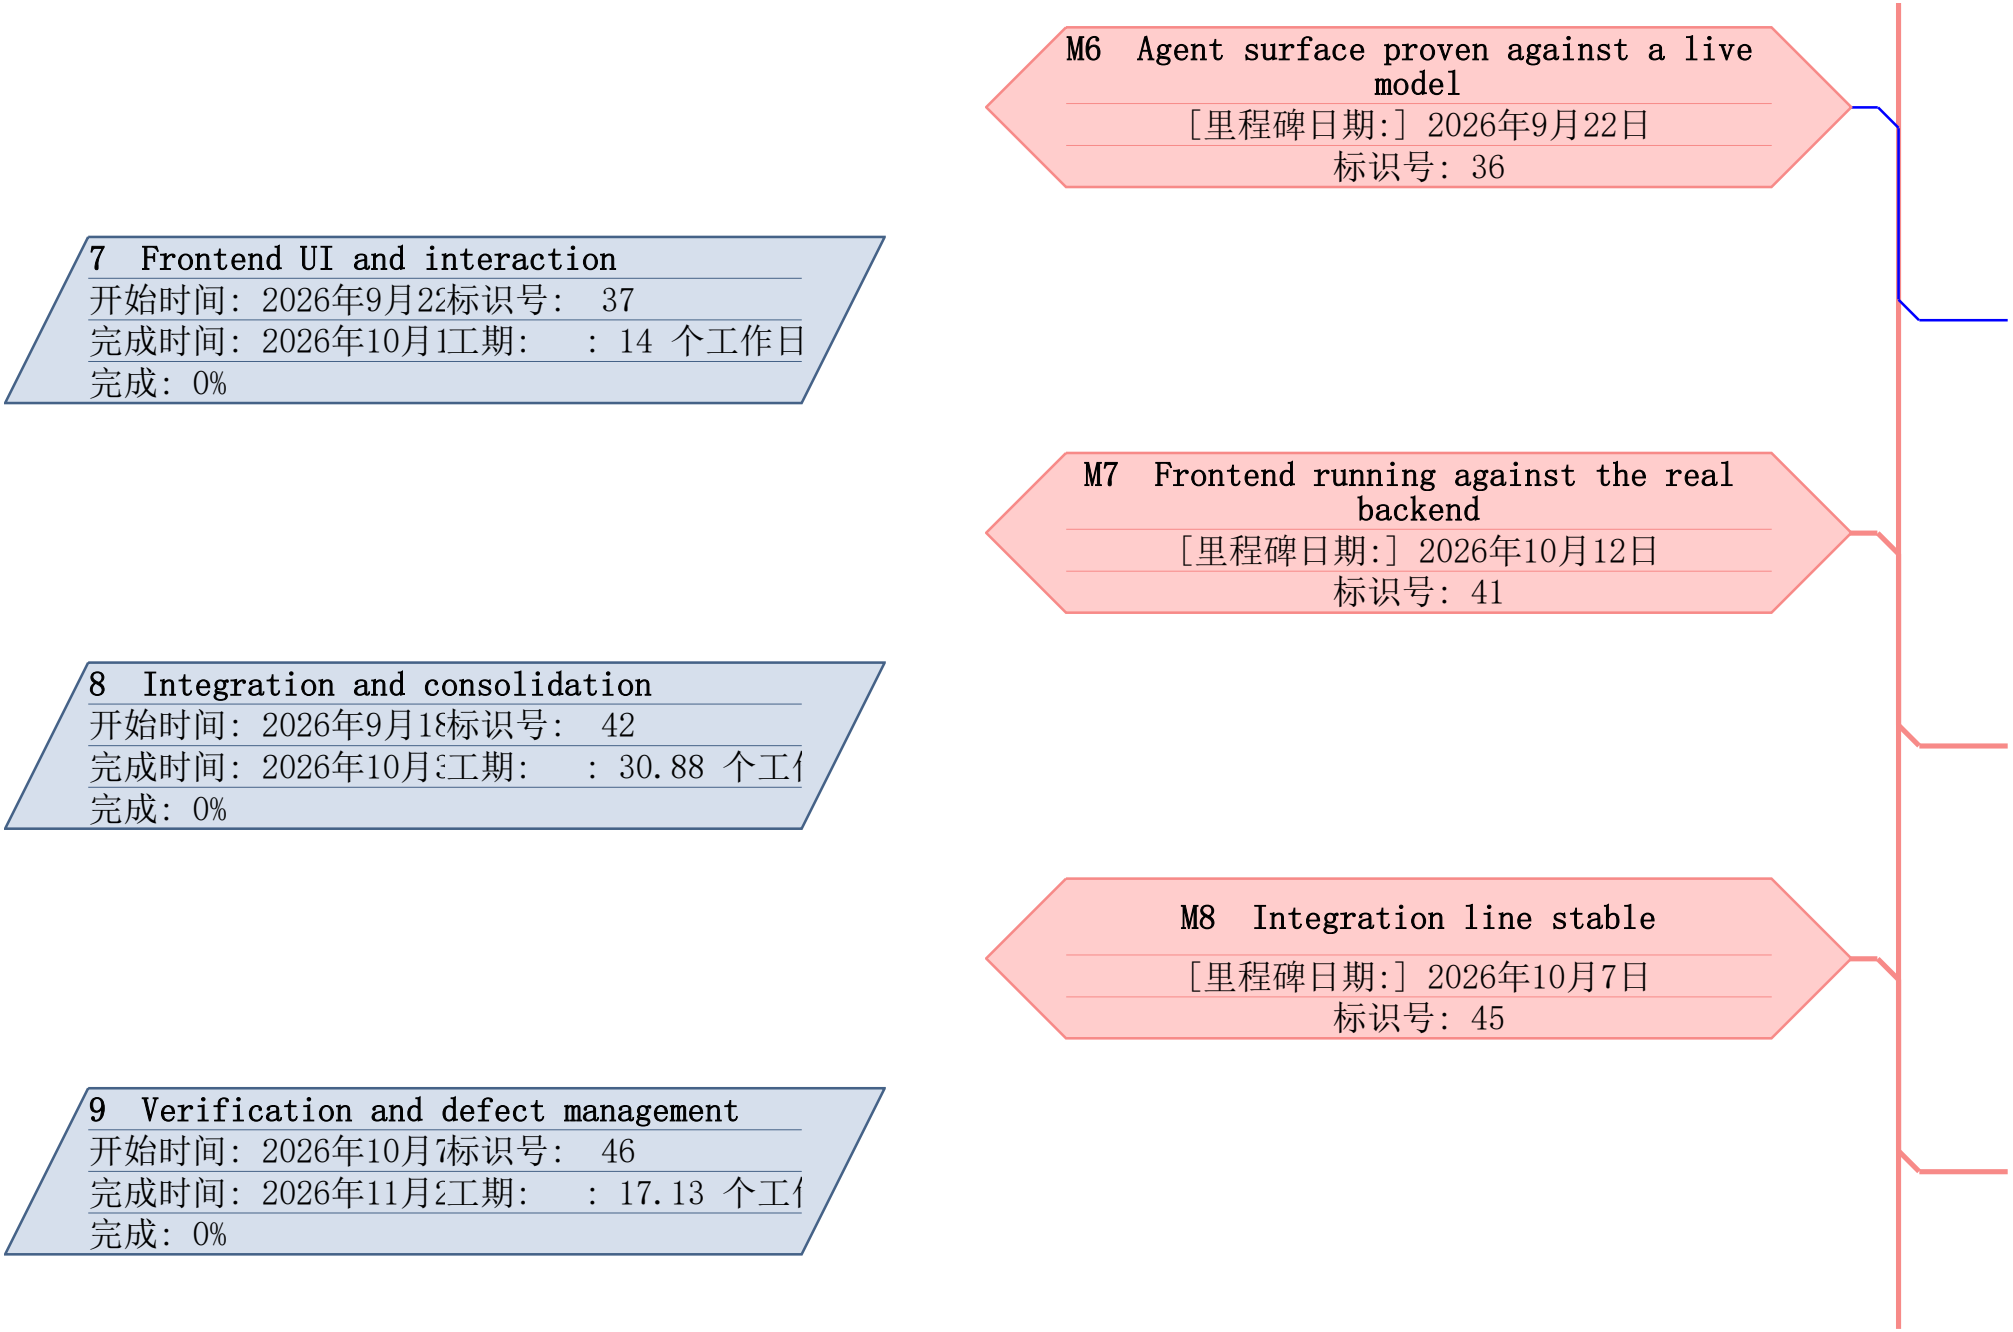
4 Backend platform and data layer
开始时间: 2026年9月14 标识号: 17
完成时间: 2026年10月2 工期: : 31.68 个工
完成: 0%

M4 Core backend running end to end
[里程碑日期:] 2026年9月14日
标识号: 23

5 Map and place data integration
开始时间: 2026年9月14 标识号: 24
完成时间: 2026年9月28 工期: : 10.9 个工作
完成: 0%

M5 Provider mesh integrated behind one interface
[里程碑日期:] 2026年9月21日
标识号: 29

6 AI agent and Hermes capability
开始时间: 2026年9月11 标识号: 30
完成时间: 2026年10月2 工期: : 34.8 个工作
完成: 0%


M6 Agent surface proven against a live model
[里程碑日期:] 2026年9月22日
标识号: 36
7 Frontend UI and interaction
开始时间: 2026年9月22
标识号: 37
完成时间: 2026年10月1
工期: : 14 个工作日
完成: 0%
M7 Frontend running against the real backend
[里程碑日期:] 2026年10月12日
标识号: 41
8 Integration and consolidation
开始时间: 2026年9月18
标识号: 42
完成时间: 2026年10月3
工期: : 30.88 个工
完成: 0%
M8 Integration line stable
[里程碑日期:] 2026年10月7日
标识号: 45
9 Verification and defect management
开始时间: 2026年10月7
标识号: 46
完成时间: 2026年11月2
工期: : 17.13 个工
完成: 0%

M9 System test complete
[里程碑日期:] 2026年11月2日
标识号: 51

10 Coursework deliverables and reporting
开始时间: 2026年9月14 标识号: 52
完成时间: 2026年11月5 工期: : 38 个工作日
完成: 0%

M10 Part 1 deadline (missed)
[里程碑日期:] 2026年10月1日
标识号: 57

M11 Mid-term review
[里程碑日期:] 2026年10月21日
标识号: 58

M12 Part 2 submission deadline
[里程碑日期:] 2026年11月5日
标识号: 59

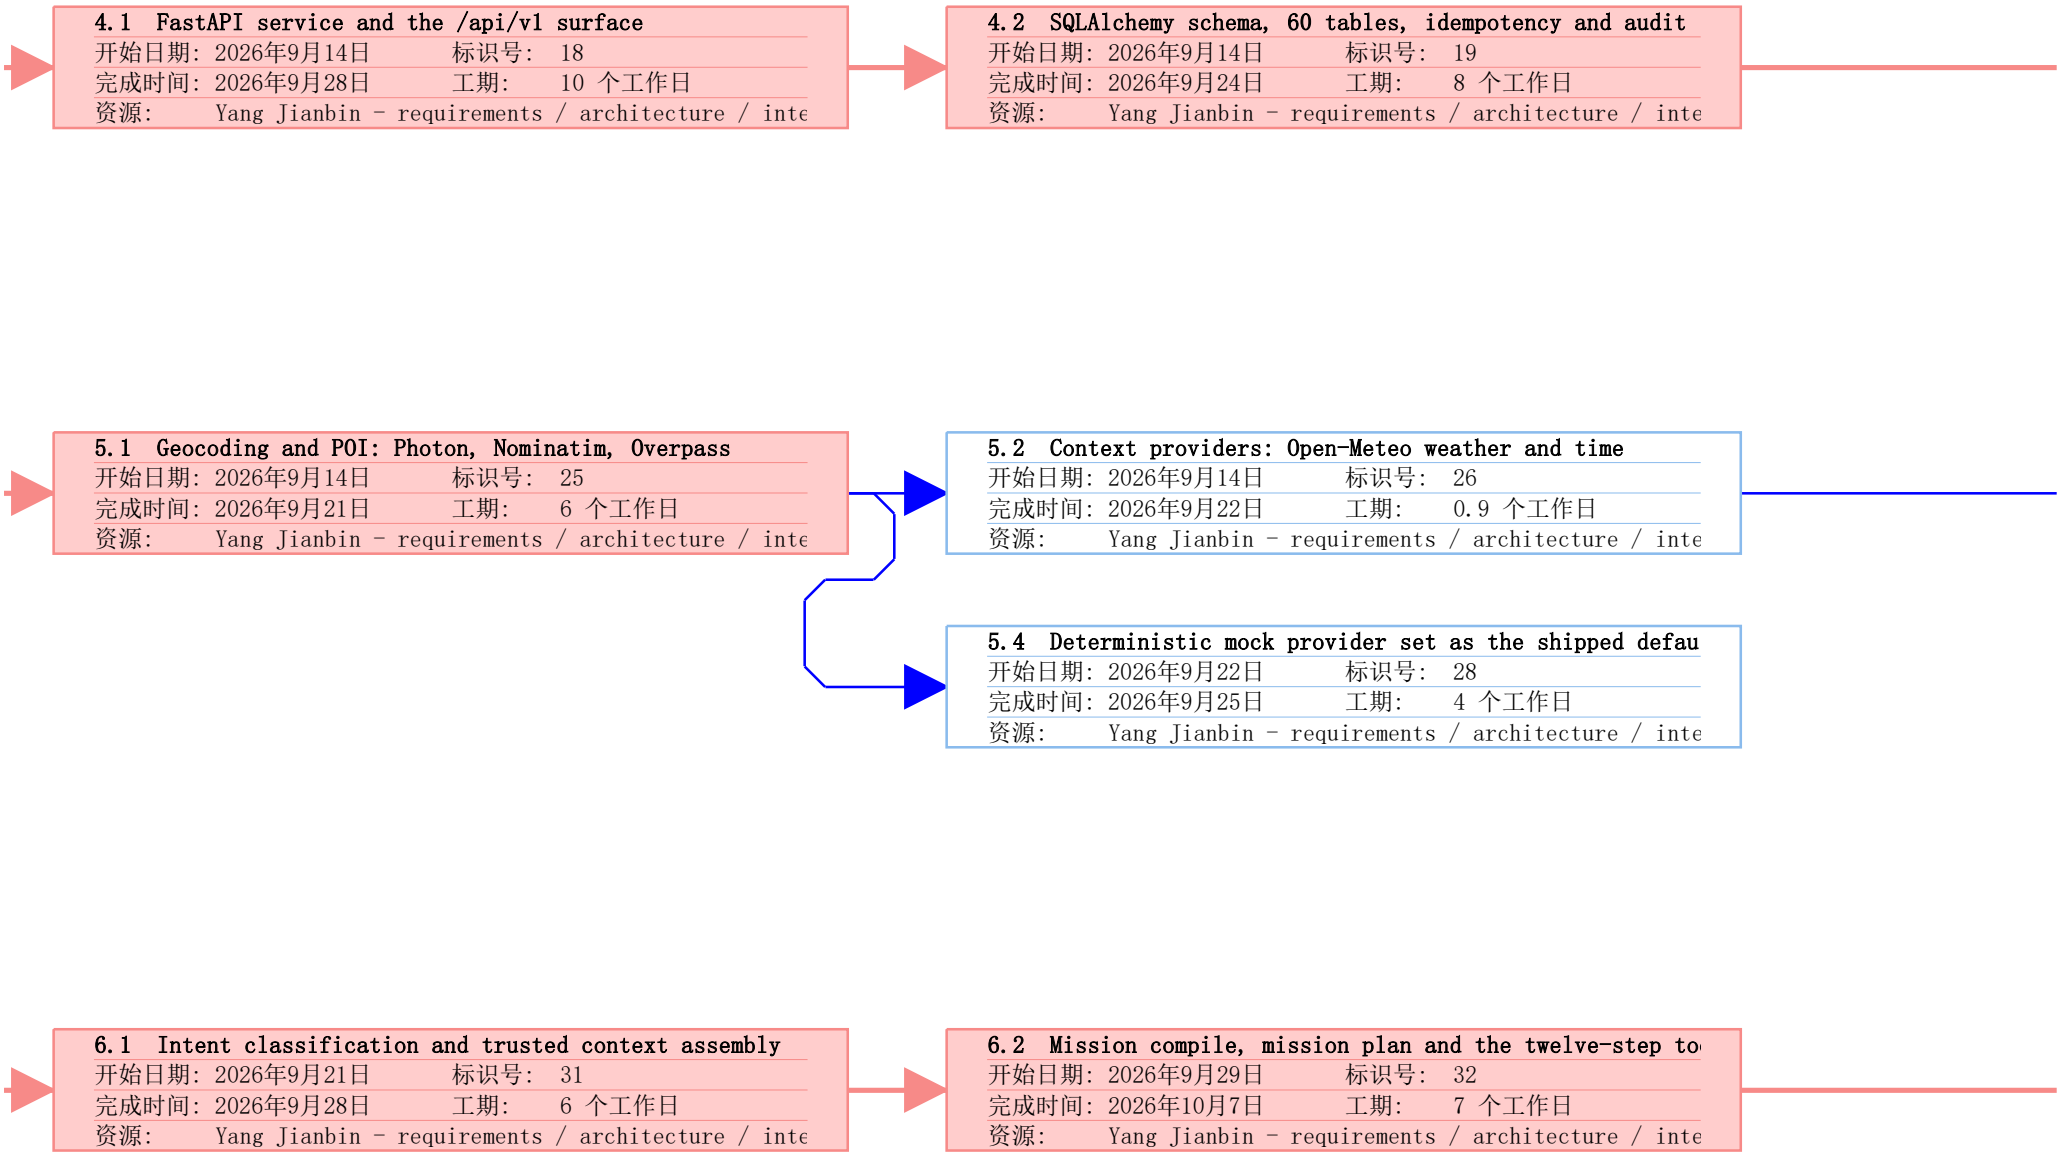
11 Final acceptance, documentation and c
开始时间: 2026年9月8 标识号: 60
完成时间: 2026年11月5 工期: : 42.88 个工作
完成: 0%

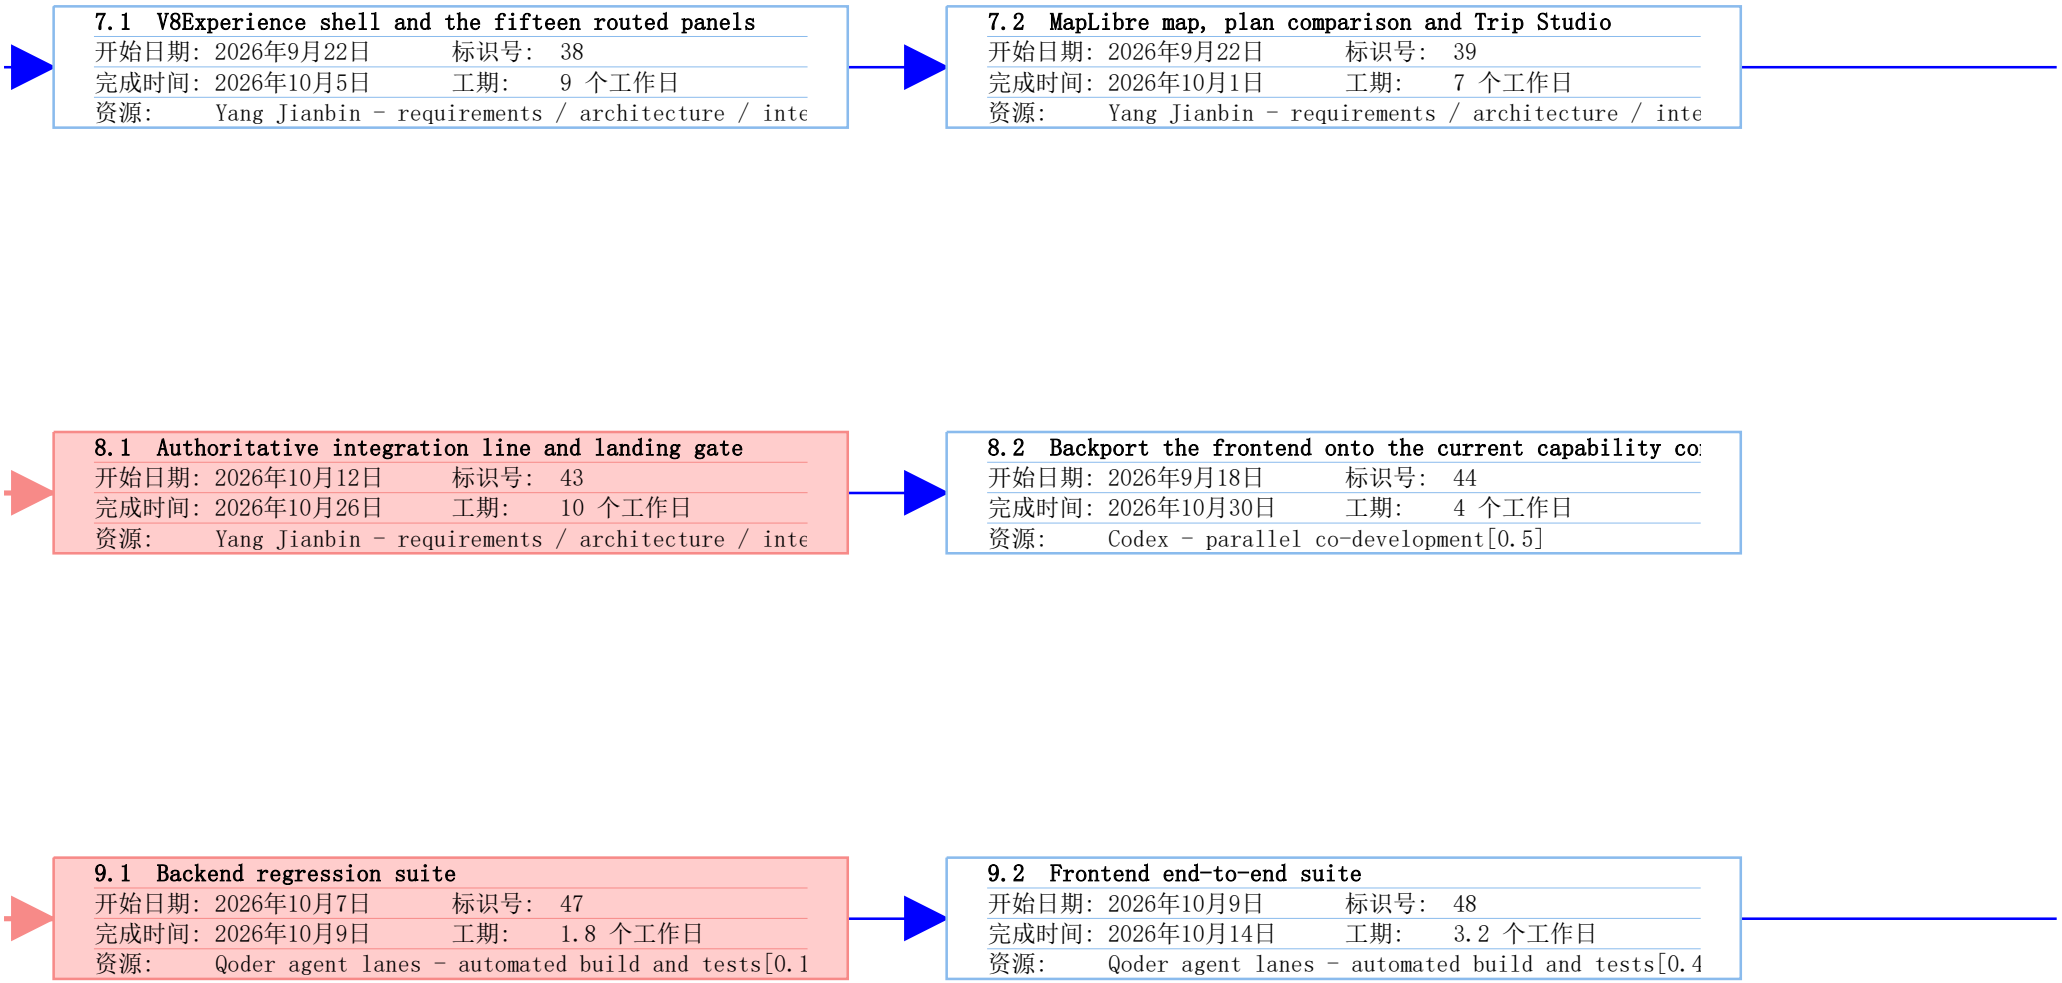
M13 Final coursework delivery


［里程碑日期:］2026年11月5日

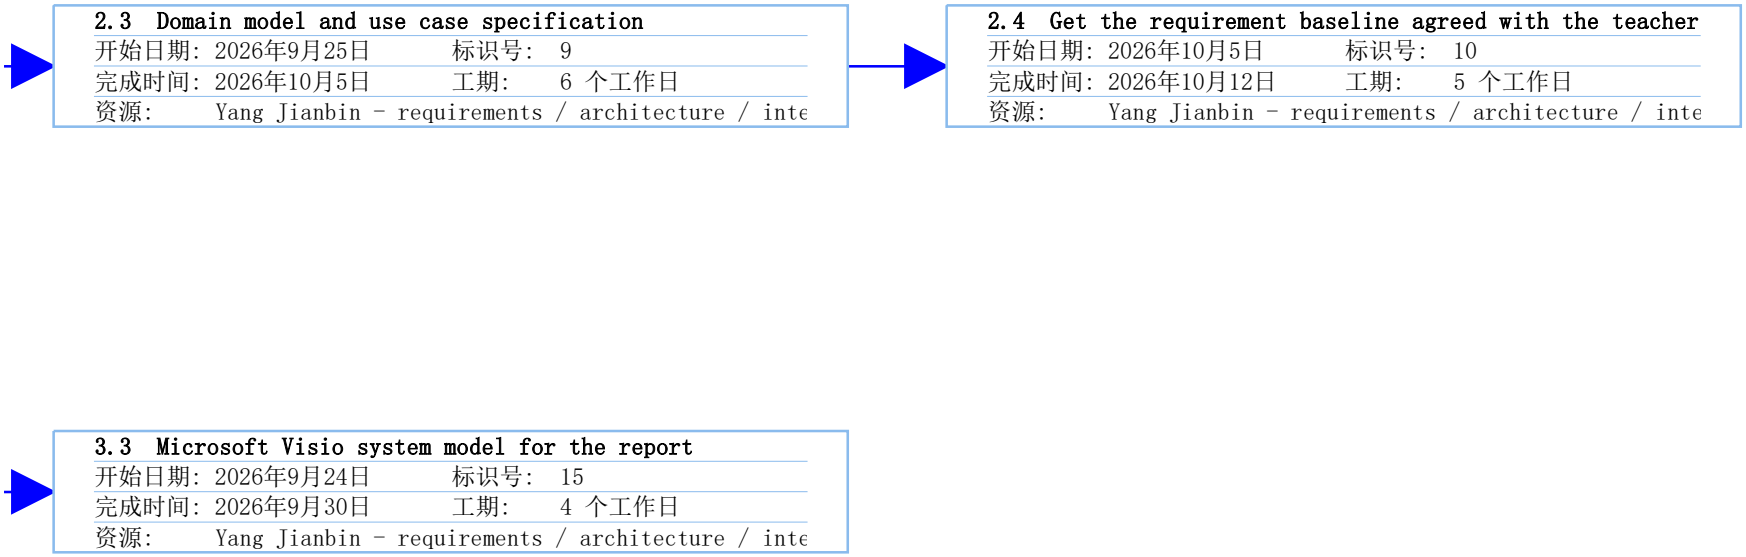
标识号: 63

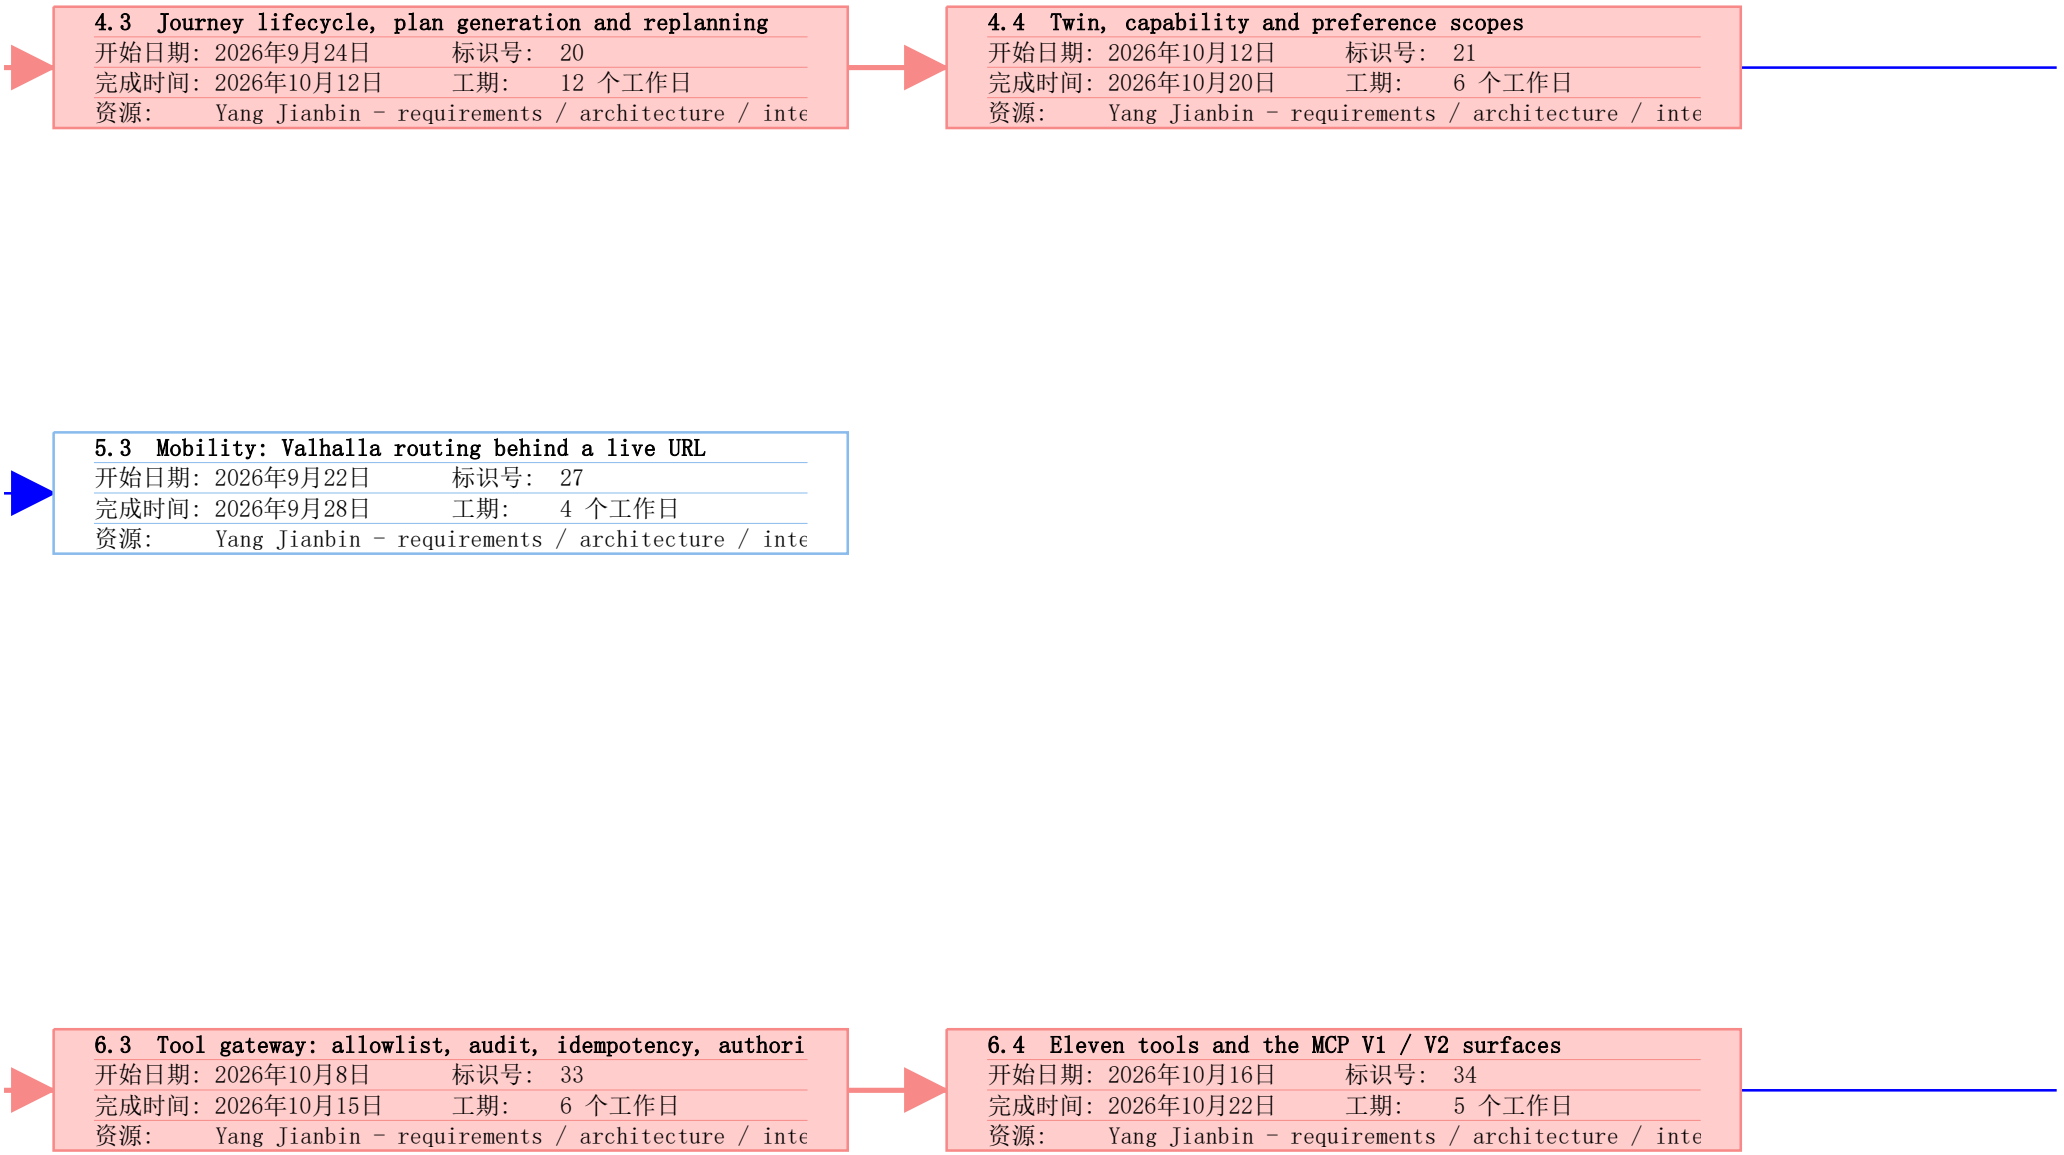

1.2 Select the project: smart city traveler system
开始日期: 2026年9月7日 标识号: 3
完成时间: 2026年9月7日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
1.3 Confirm the group of three and each member's respons
开始日期: 2026年9月8日 标识号: 4
完成时间: 2026年9月10日 工期: 3 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
2.1 Research the software needed, library and online
开始日期: 2026年9月4日 标识号: 7
完成时间: 2026年9月14日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
2.2 Write the requirement baseline: 8 goals, 61 function
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 8
完成时间: 2026年9月25日 工期: 9 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
3.1 Layered architecture and agent runtime design
开始日期: 2026年9月11日 标识号: 13
完成时间: 2026年9月18日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
3.2 Interface contracts: OpenAPI and tool catalogues
开始日期: 2026年9月18日 标识号: 14
完成时间: 2026年9月24日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte


4.1 FastAPI service and the /api/v1 surface
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 18
完成时间: 2026年9月28日 工期: 10 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
4.2 SQLAlchemy schema, 60 tables, idempotency and audit
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 19
完成时间: 2026年9月24日 工期: 8 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
5.1 Geocoding and POI: Photon, Nominatim, Overpass
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 25
完成时间: 2026年9月21日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
5.2 Context providers: Open-Meteo weather and time
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 26
完成时间: 2026年9月22日 工期: 0.9 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
5.4 Deterministic mock provider set as the shipped defau
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 28
完成时间: 2026年9月25日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
6.1 Intent classification and trusted context assembly
开始日期: 2026年9月21日 标识号: 31
完成时间: 2026年9月28日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
6.2 Mission compile, mission plan and the twelve-step to
开始日期: 2026年9月29日 标识号: 32
完成时间: 2026年10月7日 工期: 7 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte


7.1 V8Experience shell and the fifteen routed panels
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 38
完成时间: 2026年10月5日 工期: 9 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
7.2 MapLibre map, plan comparison and Trip Studio
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 39
完成时间: 2026年10月1日 工期: 7 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
8.1 Authoritative integration line and landing gate
开始日期: 2026年10月12日 标识号: 43
完成时间: 2026年10月26日 工期: 10 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
8.2 Backport the frontend onto the current capability co
开始日期: 2026年9月18日 标识号: 44
完成时间: 2026年10月30日 工期: 4 个工作日
资源: Codex - parallel co-development[0.5]
9.1 Backend regression suite
开始日期: 2026年10月7日 标识号: 47
完成时间: 2026年10月9日 工期: 1.8 个工作日
资源: Qoder agent lanes - automated build and tests[0.1
9.2 Frontend end-to-end suite
开始日期: 2026年10月9日 标识号: 48
完成时间: 2026年10月14日 工期: 3.2 个工作日
资源: Qoder agent lanes - automated build and tests[0.4


10.1 Part 1: ten-slide report with the Visio model and t
开始日期: 2026年9月14日 标识号: 53
完成时间: 2026年9月21日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
10.2 Mid-term review pack: architecture, journey, agent
开始日期: 2026年9月21日 标识号: 54
完成时间: 2026年9月22日 工期: 0.9 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte


2.3 Domain model and use case specification
开始日期: 2026年9月25日 标识号: 9
完成时间: 2026年10月5日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
2.4 Get the requirement baseline agreed with the teacher
开始日期: 2026年10月5日 标识号: 10
完成时间: 2026年10月12日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
3.3 Microsoft Visio system model for the report
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 15
完成时间: 2026年9月30日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte


4.3 Journey lifecycle, plan generation and replanning
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 20
完成时间: 2026年10月12日 工期: 12 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
4.4 Twin, capability and preference scopes
开始日期: 2026年10月12日 标识号: 21
完成时间: 2026年10月20日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
5.3 Mobility: Valhalla routing behind a live URL
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 27
完成时间: 2026年9月28日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
6.3 Tool gateway: allowlist, audit, idempotency, authori
开始日期: 2026年10月8日 标识号: 33
完成时间: 2026年10月15日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
6.4 Eleven tools and the MCP V1 / V2 surfaces
开始日期: 2026年10月16日 标识号: 34
完成时间: 2026年10月22日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

7.3 Copilot dock, agent rail, check-ins and collections

开始日期: 2026年10月1日　　标识号: 40

完成时间: 2026年10月12日　　工期: 7 个工作日

资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

9.3 Close the four P0 defects from the bug report

开始日期: 2026年10月9日　　标识号: 49

完成时间: 2026年10月14日　　工期: 3 个工作日

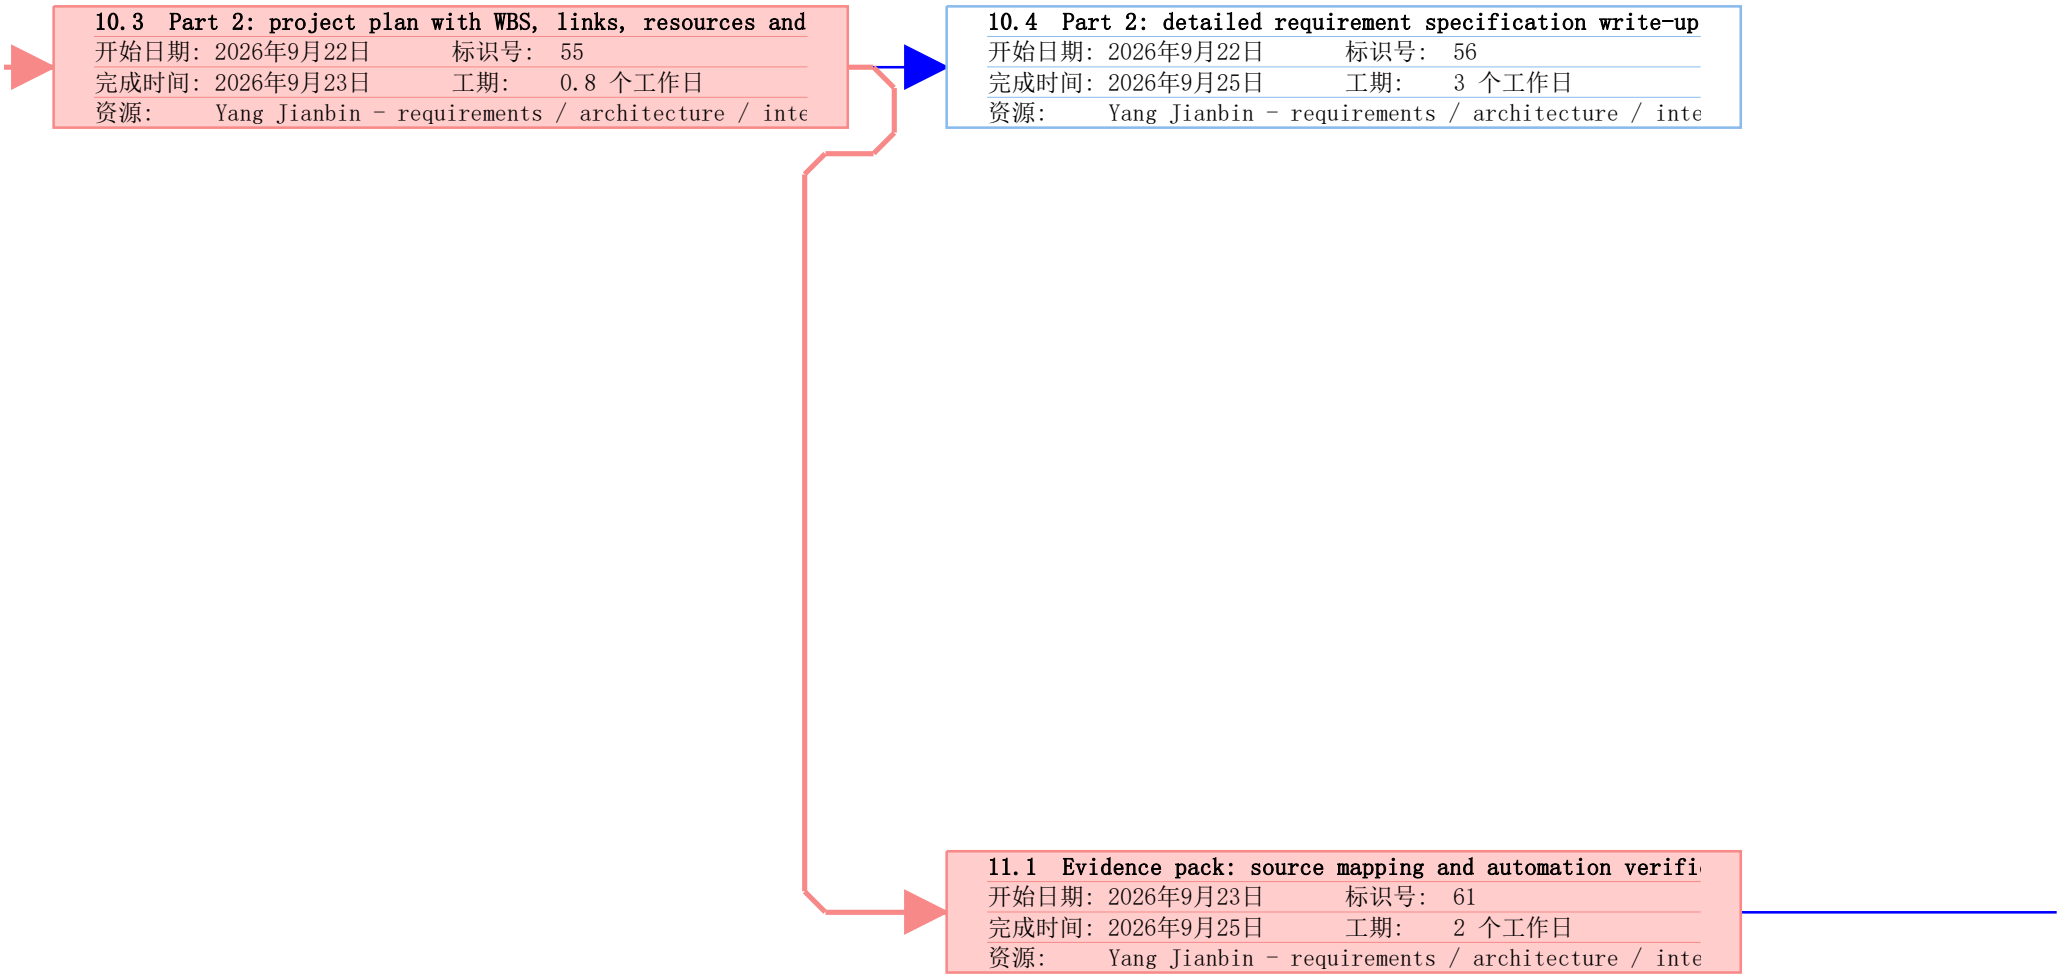
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

9.4 Physical phone and PWA shadow trial

开始日期: 2026年10月14日　　标识号: 50

完成时间: 2026年10月20日　　工期: 4 个工作日

资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte


10.3 Part 2: project plan with WBS, links, resources and
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 55
完成时间: 2026年9月23日 工期: 0.8 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
10.4 Part 2: detailed requirement specification write-up
开始日期: 2026年9月22日 标识号: 56
完成时间: 2026年9月25日 工期: 3 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte
11.1 Evidence pack: source mapping and automation verifi
开始日期: 2026年9月23日 标识号: 61
完成时间: 2026年9月25日 工期: 2 个工作日
资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

4.5 Commerce, guardian and autopilot

开始日期: 2026年9月14日　　标识号: 22

完成时间: 2026年10月27日　　工期: 4.8 个工作日

资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

6.5 Native Hermes runtime


开始日期: 2026年9月11日　　标识号: 35

完成时间: 2026年10月29日　　工期: 4.8 个工作日

资源: Yang Jianbin - requirements / architecture / inte

11.2 Publish the deliverables to the repository

开始日期:	2026年9月8日	标识号:	62
完成时间:	2026年9月28日	工期:	0.5 个工作日
资源:	Yang Jianbin - requirements / architecture / inte		



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

关键		关键标记	
非关键任务		已标记	
关键里程碑		关键外部任务	
里程碑		外部任务	
关键摘要		项目摘要	
摘要		突出显示的关键任务	
关键插入项目		突出显示的非关键任务	
插入项目			
