标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			**1 Coursewor initiation and project**	**3 个工作日**	**2026年9月7日**	**2026年9月9日**		
6			**2 Requireme engineerin**	**31 个工作日**	**2026年9月9日**	**2026年10月21日**		
7			2.1 Research the software needed, library	4 个工作日	2026年9月9日	2026年9月14日	5	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[13%



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
8			2.2 Write the requirem baseline: 8 goals, 61 functiona 24 rules, 16 NFR, 14	5 个工作日	2026年9月9日	2026年9月15日	7SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[23%		
9			2.3 Domain model and use	4 个工作日	2026年9月9日	2026年9月14日	8SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture /		
10			M2 Requirem baseline drafted	0 个工作日	2026年9月15日	2026年9月15日	8,9			

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
11			2.4 Get the requireme baseline agreed with the	3 个工作日	2026年10月19日	2026年10月21日	60	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[17%		
12			**3 System design and**	**5 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年9月22日**				
13			3.1 Layered architectu and agent	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日	10	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[15%		

项目：CityNexus_Software Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
14			3.2 Interface contracts: OpenAPI and tool catalogue	4 个工作日	2026年9月16日	2026年9月21日	13SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /		
15			3.3 Microsoft Visio system model	4 个工作日	2026年9月16日	2026年9月21日	14SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
16			M3 Architectu design complete	0 个工作日	2026年9月22日	2026年9月22日	13,14,15			
17			**4 Backend platform**	**28 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年10月23日**				

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
18			4.1 FastAPI service and the	10 个工作日	2026年9月16日	2026年9月29日	13SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture /		
19			4.2 SQLAlche schema, 60 tables, idempote	8 个工作日	2026年9月16日	2026年9月25日	18SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /		
20			4.3 Journey lifecycle, plan generatio and	12 个工作日	2026年9月16日	2026年10月1日	18SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[4%]		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
21			4.4 Twin, capability and preferenc	6 个工作日	2026年9月28日	2026年10月5日	19	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
22			4.5 Commerc guardian and autopilot	14 个工作日	2026年10月6日	2026年10月23日	21	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
23			M4 Core backend running end to	0 个工作日	2026年10月5日	2026年10月5日	20,21			
24			**5 Map and place data**	**9 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年9月28日**				

项目：CityNexus_Software Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务 | 非活动摘要 | 外部任务
拆分 | 手动任务 | 外部里程碑
里程碑 | 仅工期 | 最后期限
摘要 | 手动摘要总成 | 进度
项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度
非活动任务 | 仅开始时间
非活动里程碑 | 仅完成时间

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
25			5.1 Geocodin and POI: Photon, Nominati Overpass	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日	18SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /		
26			5.2 Context providers Open-Me weather	3 个工作日	2026年9月16日	2026年9月18日	25SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
27			5.3 Mobility: Valhalla routing behind a	4 个工作日	2026年9月16日	2026年9月21日	26SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
28			5.4 Dete	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	25	Wang Jiarui 08(		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
29			M5 Provider mesh integrate behind one	0 个工作日	2026年9月28日	2026年9月28日	26,28			
30			**6 AI agent and Hermes**	**16 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年10月7日**				
31			6.1 Intent classificat and trusted	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日	20SS	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
32			6.2 Mission compile, mission plan and the	6 个工作日	2026年9月23日	2026年9月30日	31	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[10%],Qo		
33			6.3 Tool gateway: allowlist, audit, idempote authoriza	5 个工作日	2026年9月23日	2026年9月29日	32SS	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[15%]		
34			6.4 Eleven tools and the MCP V1 / V2	4 个工作日	2026年9月30日	2026年10月5日	33	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
35			6.5 Native Hermes	6 个工作日	2026年9月30日	2026年10月7日	34SS	Wang Xinyue 0802240324 - frontend /		
36			M6 Agent surface proven against a	0 个工作日	2026年10月5日	2026年10月5日	34			
37			**7 Frontend UI and**	**12 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年10月1日**				
38			7.1 V8Experie shell and the fifteen routed	8 个工作日	2026年9月16日	2026年9月25日	18SS	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[8%]		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务 非活动摘要 外部任务
拆分 手动任务 外部里程碑
里程碑 仅工期 最后期限
摘要 手动摘要总成 进度
项目摘要 手动摘要 手动进度
非活动任务 仅开始时间
非活动里程碑 仅完成时间

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
39			7.2 MapLibre map, plan comparis and Trip	6 个工作日	2026年9月16日	2026年9月23日	38SS	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[10%]		
40			7.3 Copilot dock, agent rail, check-ins	6 个工作日	2026年9月24日	2026年10月1日	39	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[13%],Qo		
41			M7 Frontend running against the real	0 个工作日	2026年10月1日	2026年10月1日	40			

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
42			**8 Integratior and consolidat**	**6 个工作日**	**2026年9月16日**	**2026年9月23日**				
43			8.1 Authorita integratic line and landing	6 个工作日	2026年9月16日	2026年9月23日	39SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[13%		
44			8.2 Back	6 个工作日	2026年9月	2026年9月	43SS	Wang Xinyue 0		
45			M8 Integratic line	0 个工作日	2026年9月23日	2026年9月23日	43			
46			**9 Verificatio and defect**	**20 个工作日**	**2026年9月24日**	**2026年10月21日**				

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务 非活动摘要 外部任务
拆分 手动任务 外部里程碑
里程碑 仅工期 最后期限
摘要 手动摘要总成 进度
项目摘要 手动摘要 手动进度
非活动任务 仅开始时间
非活动里程碑 仅完成时间

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
47			9.1 Backend regressio	20 个工作日	2026年9月24日	2026年10月21日	45SS	Wang Jiarui 0802240322 - data		
48			9.2 Frontend end-to-e suite	20 个工作日	2026年9月24日	2026年10月21日	47SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration /		
49			9.3 Close the four P0 defects from the	5 个工作日	2026年9月24日	2026年9月30日	48SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		
50			9.4 Physical phone and	4 个工作日	2026年10月1日	2026年10月6日	49	Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface /		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
51			9.5 Verificatic evidence pack and defect triage	3 个工作日	2026年10月19日	2026年10月21日	47FF,48FF	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /		
52			9.6 Final regressio re-run and defect count for	2 个工作日	2026年10月1日	2026年10月2日	50SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /		
53			M9 System test	0 个工作日	2026年10月6日	2026年10月6日	50,52			

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
54			**10 Coursewor deliverable and reporting**	**23 个工作日**	**2026年9月23日**	**2026年10月23日**				
55			10.1 Part	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	16	Wang Jiarui 080		
56			10.2 Mid	11 个工作日	2026年10月	2026年10月	41	Wang Jiarui 080		
57			10.3 Part 2: project plan with WBS, links,	4 个工作日	2026年10月19日	2026年10月22日	56	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[19%		
58			10.4 Part 2: detailed requirem specificat	5 个工作日	2026年10月19日	2026年10月23日	57SS	Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
59			M10 Part 1 course deadline (contract 2026-10-	0 个工作日	2026年9月29日	2026年9月29日	55			
60			M11 Mid	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	56			
61			M12 Part 2 course deadline (contract	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日	58			
62			**11 Final acceptanc document and**	**5 个工作日**	**2026年10月19日**	**2026年10月23日**				
63			11.1 Evid	1 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	Wang Xinyue 0		


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务 非活动摘要 外部任务
拆分 手动任务 外部里程碑
里程碑 仅工期 最后期限
摘要 手动摘要总成 进度
项目摘要 手动摘要 手动进度
非活动任务 仅开始时间
非活动里程碑 仅完成时间

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
64			11.2 Publish the deliverab to the	1 个工作日	2026年10月20日	2026年10月20日	63	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[25%		
65			M13 Coursewo delivery (plan)	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日	64,61			

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

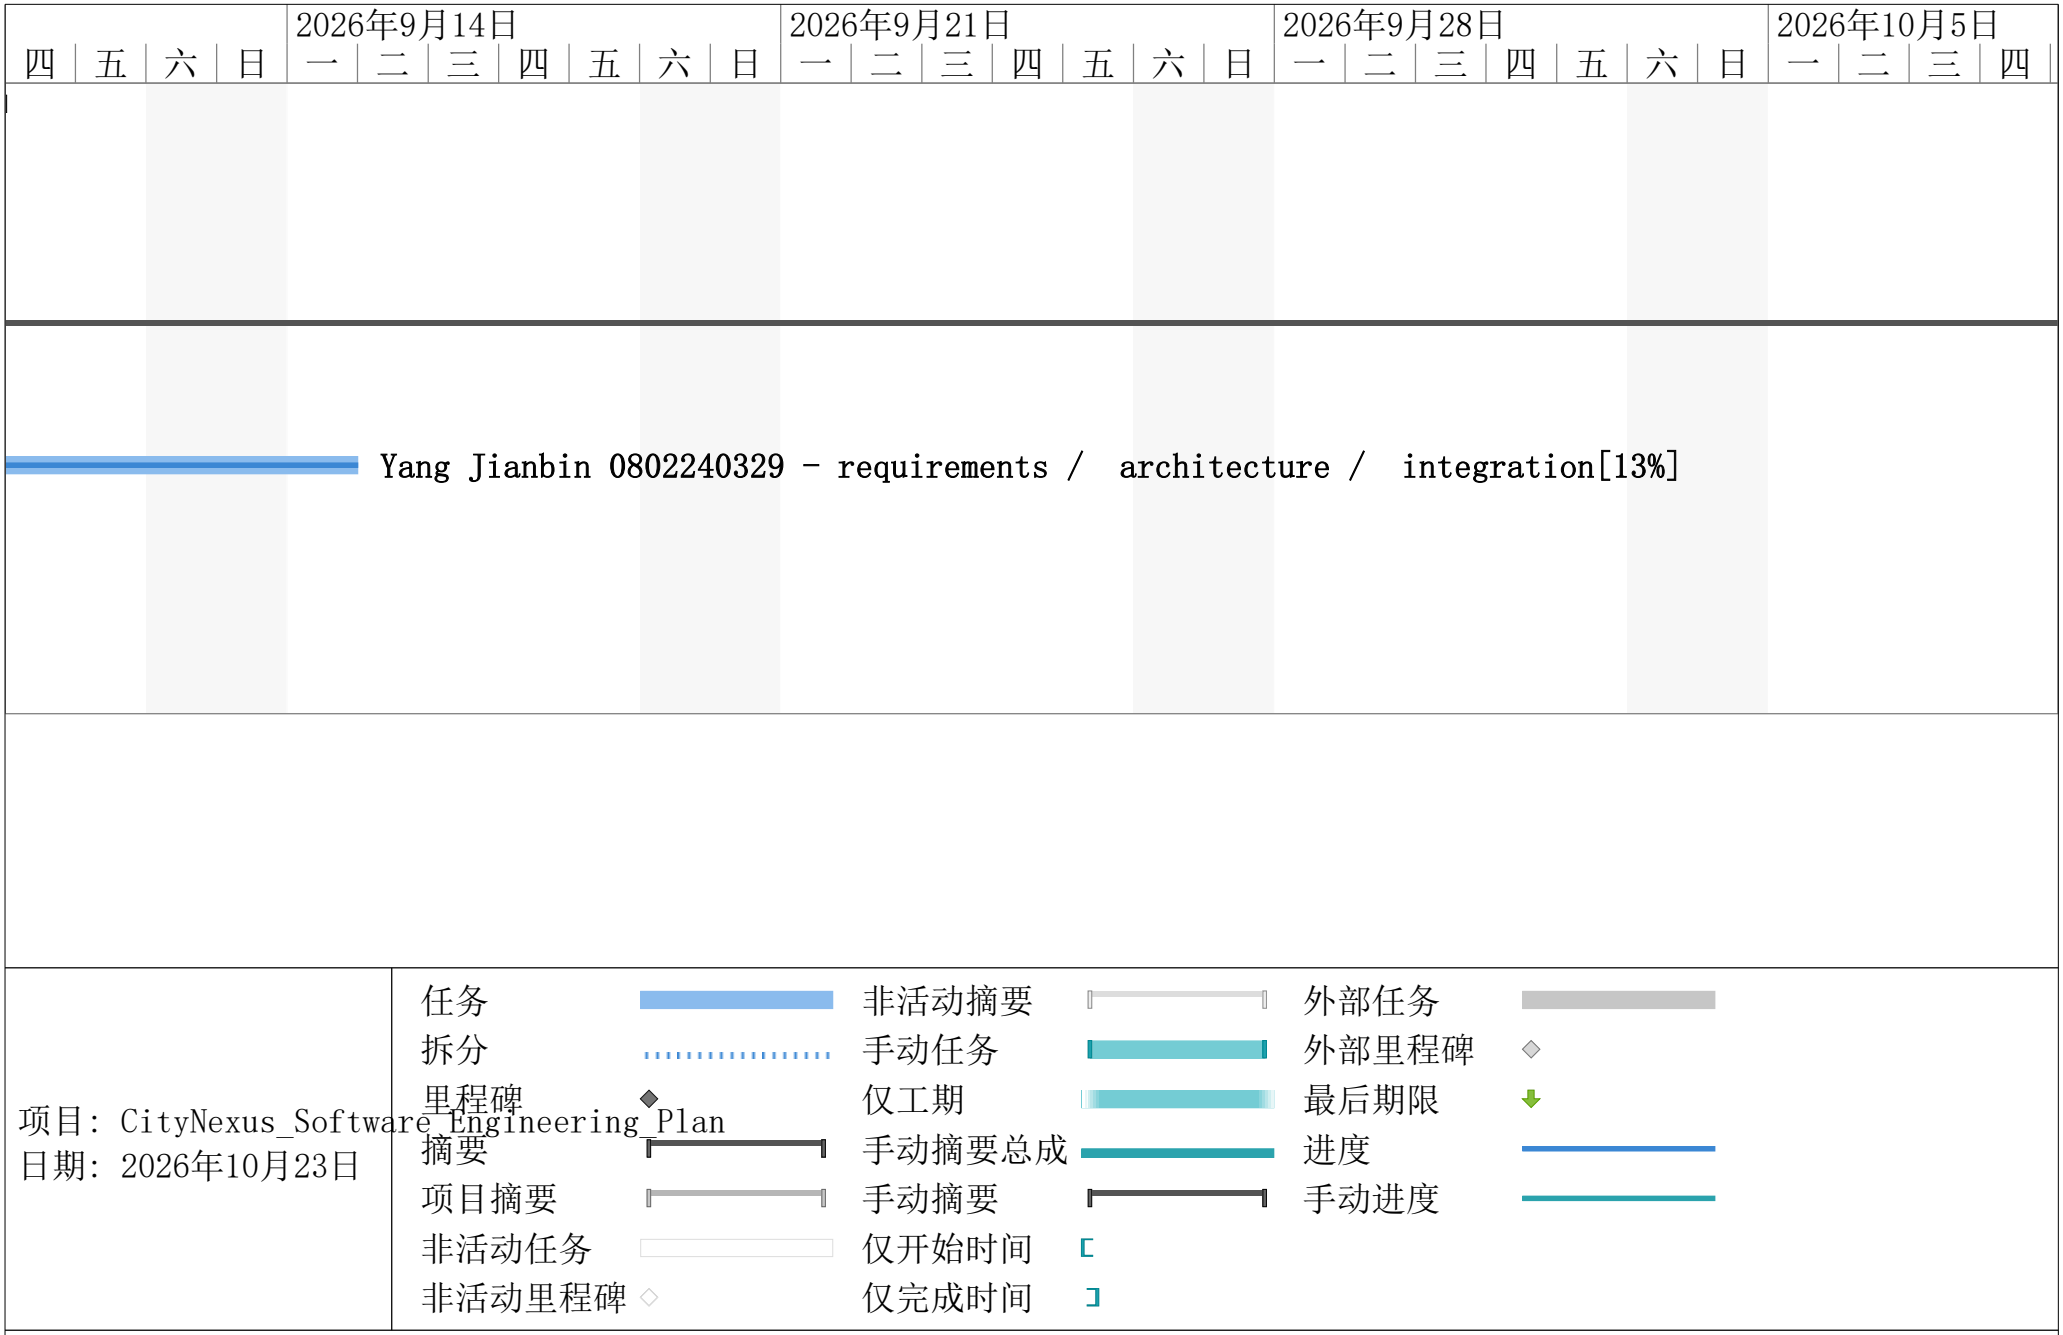
2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
2026年10月5日
四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四
Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[13%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

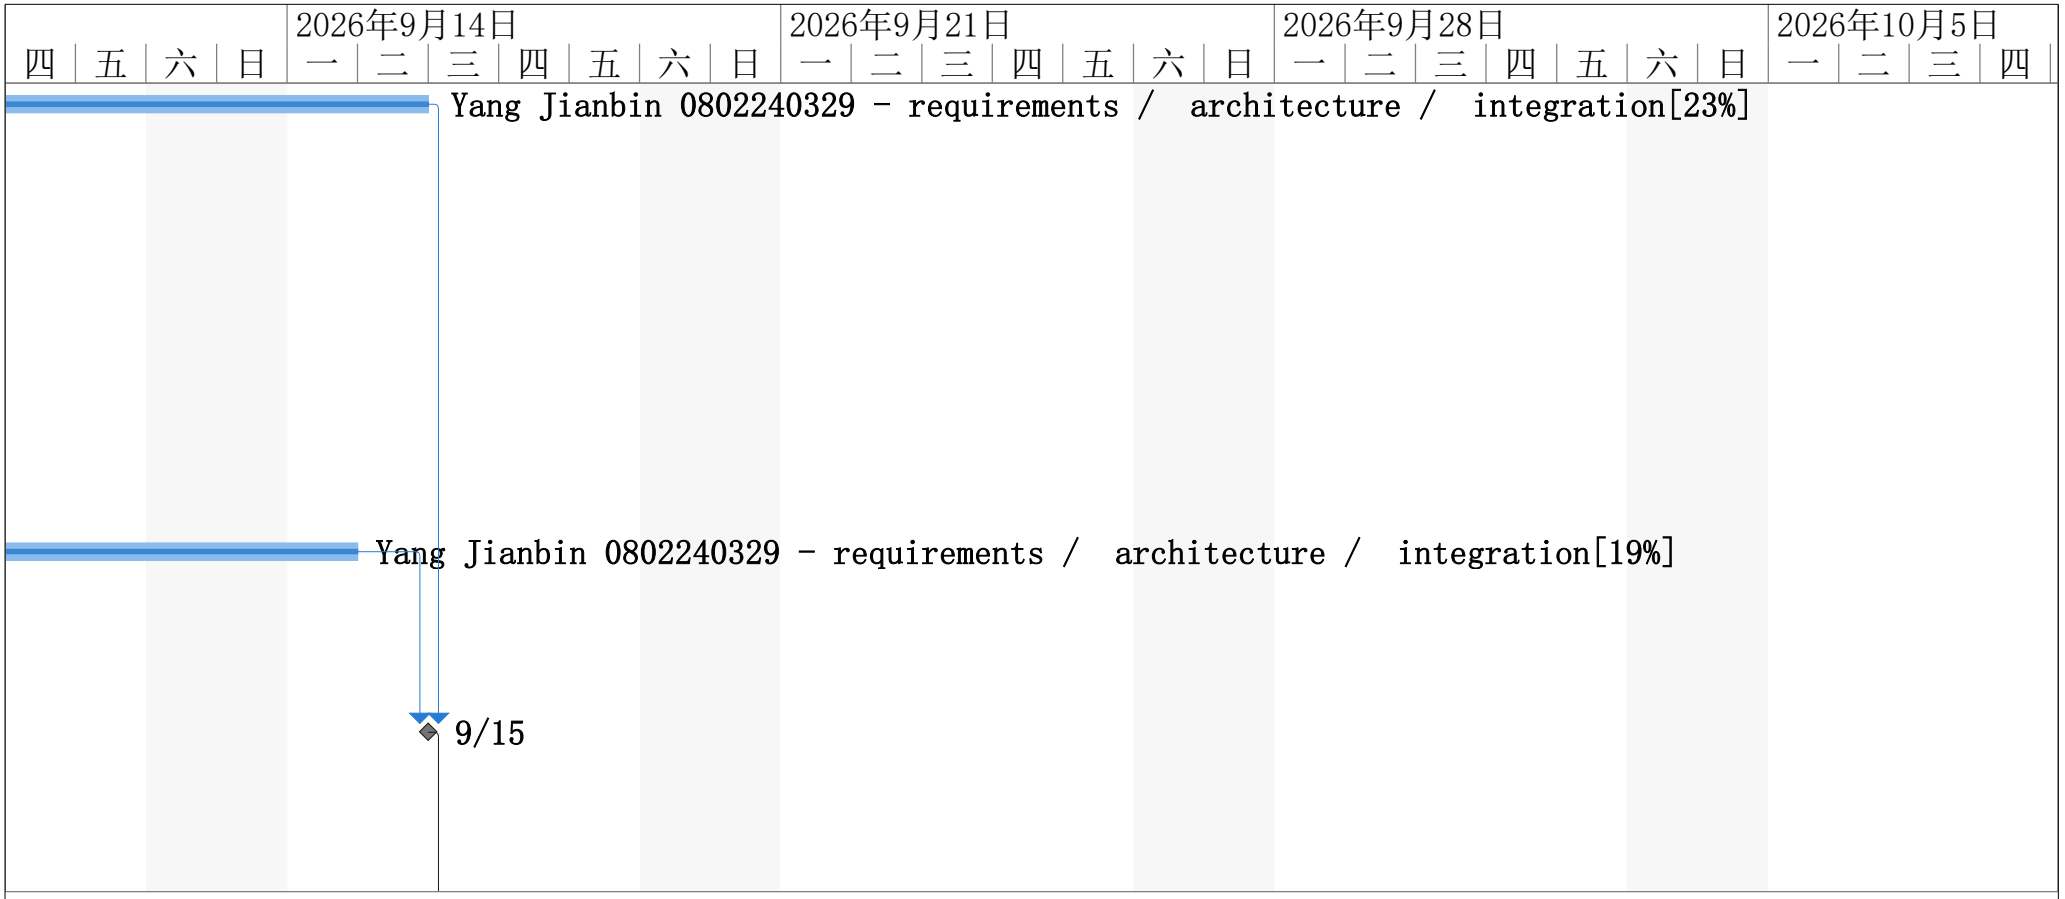


项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

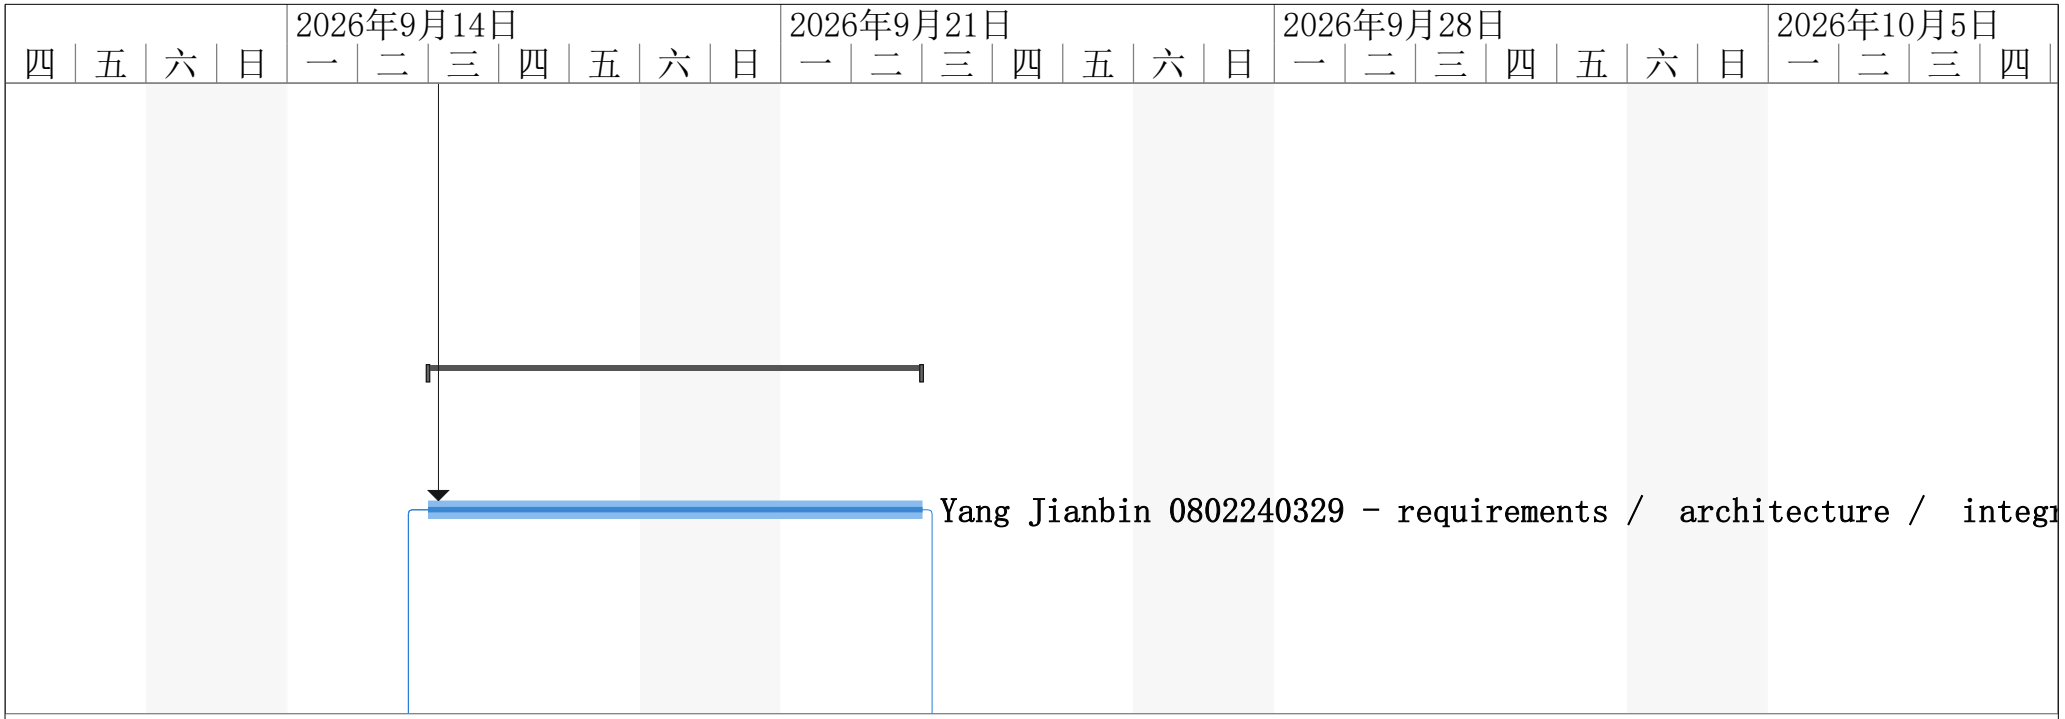


项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

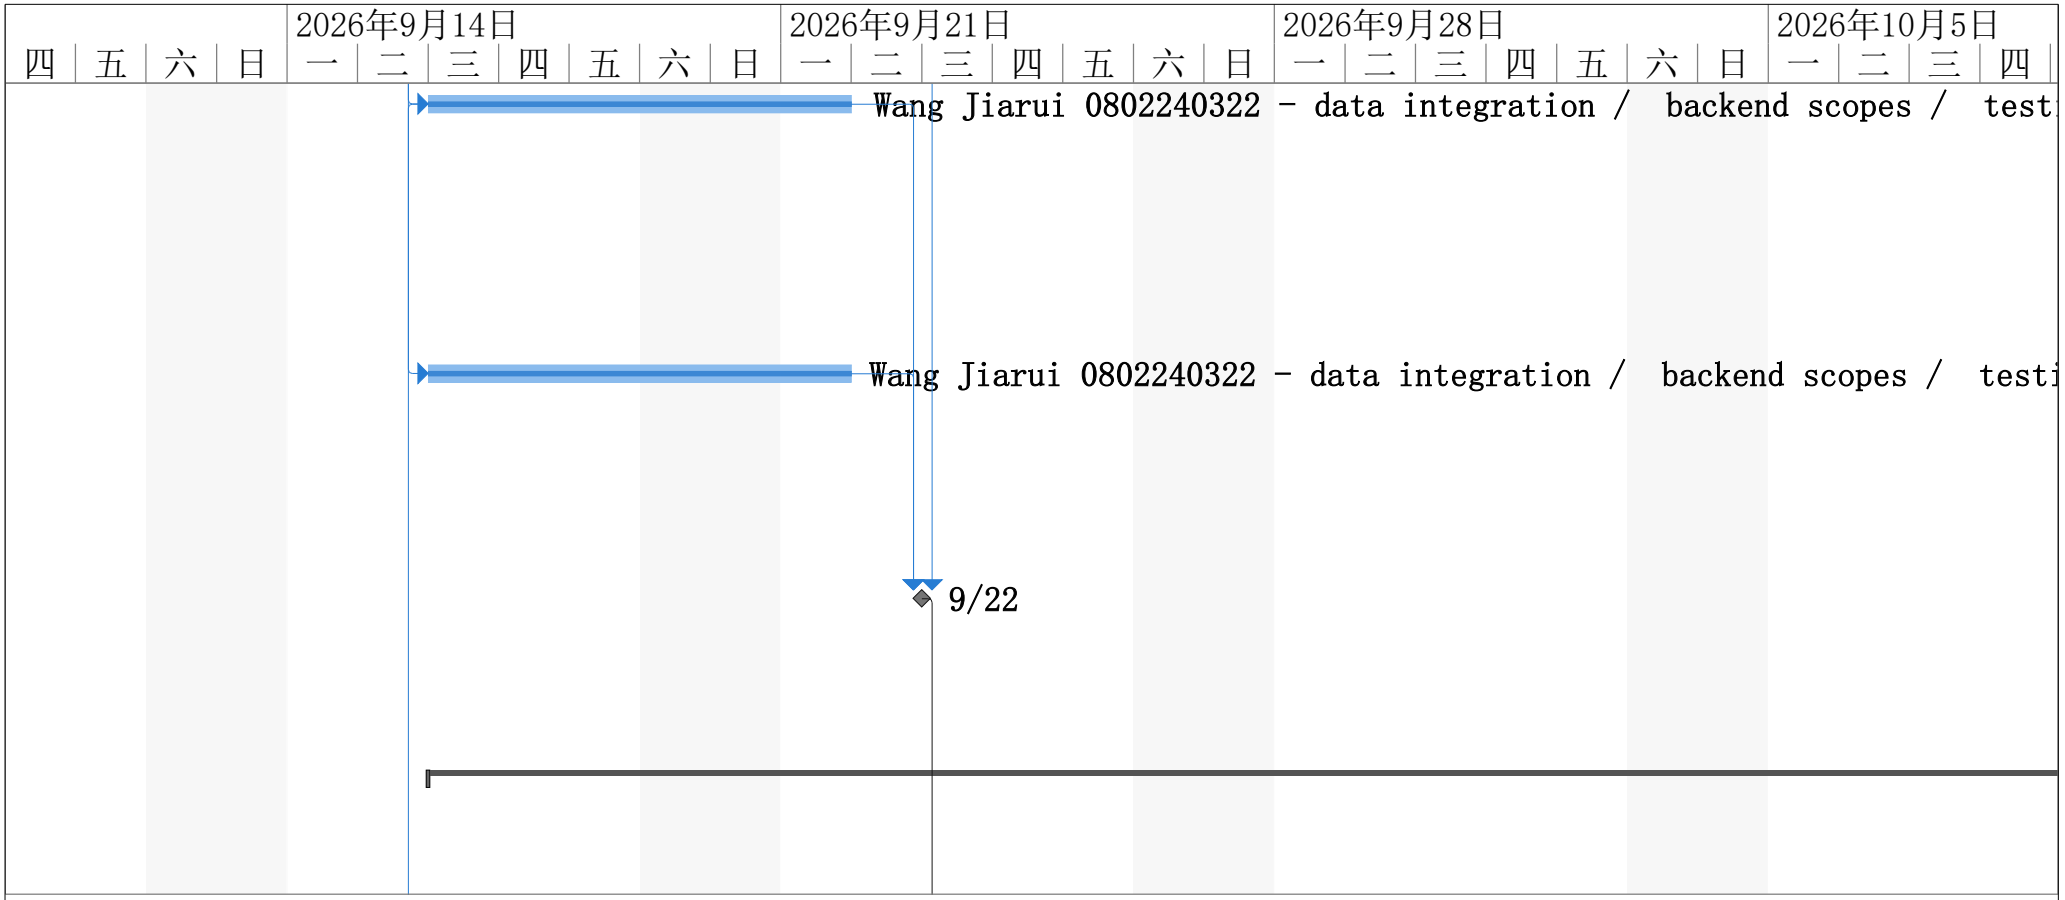


项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

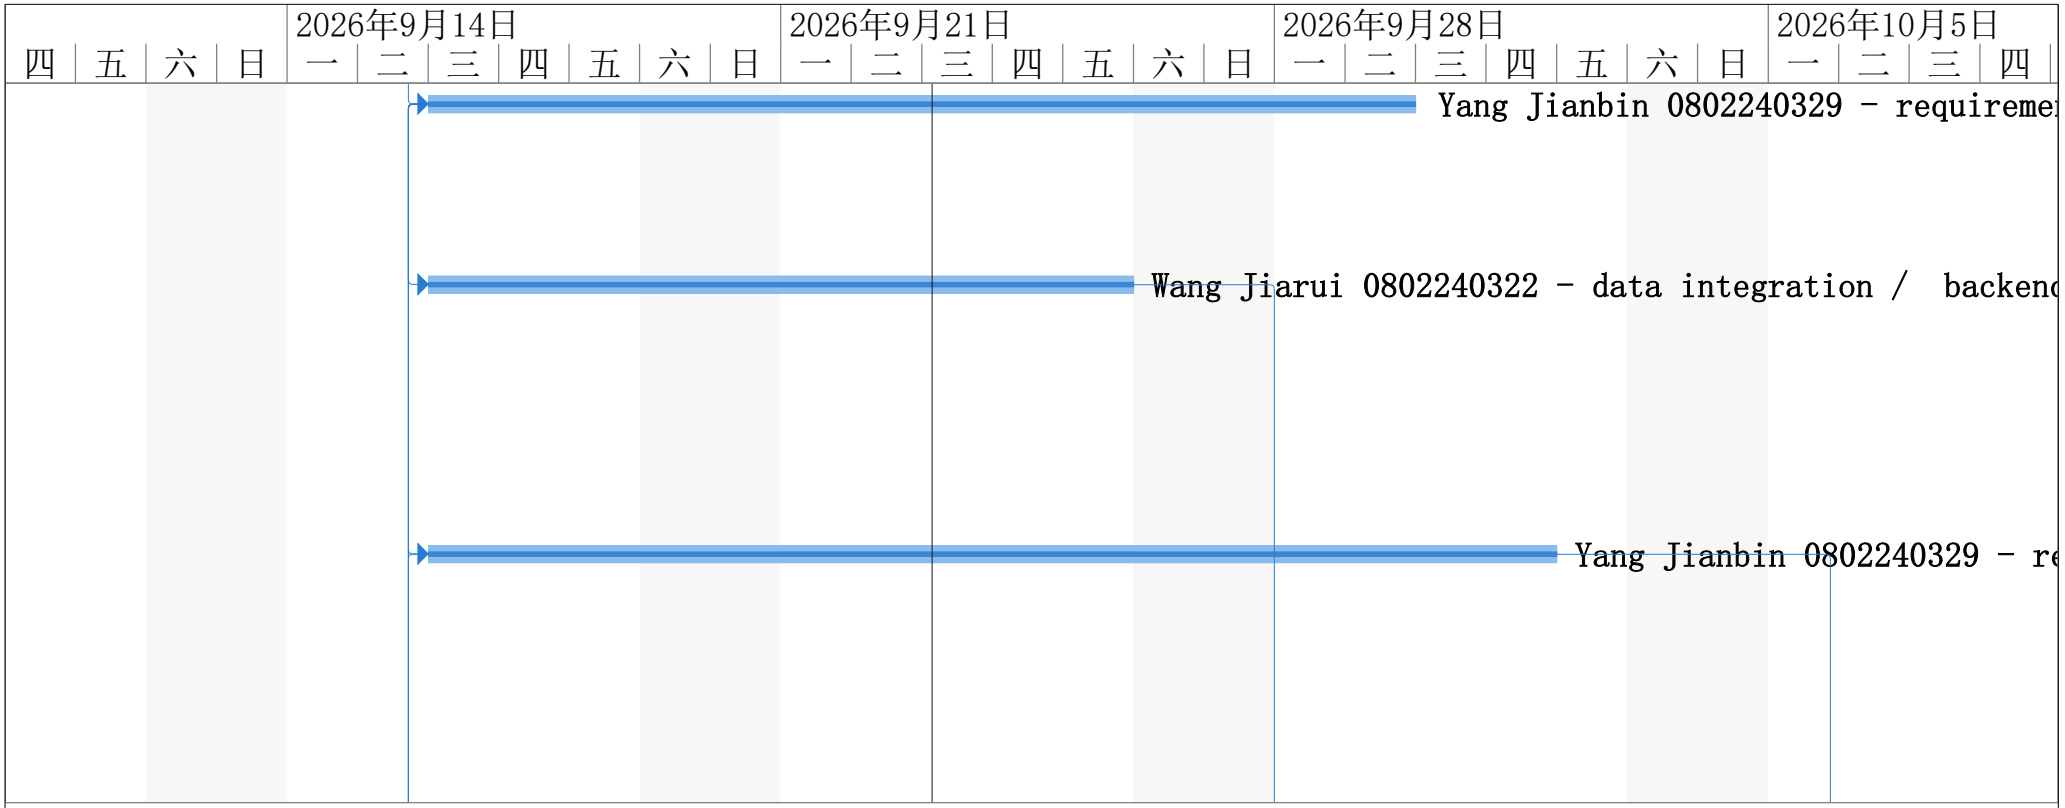


项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

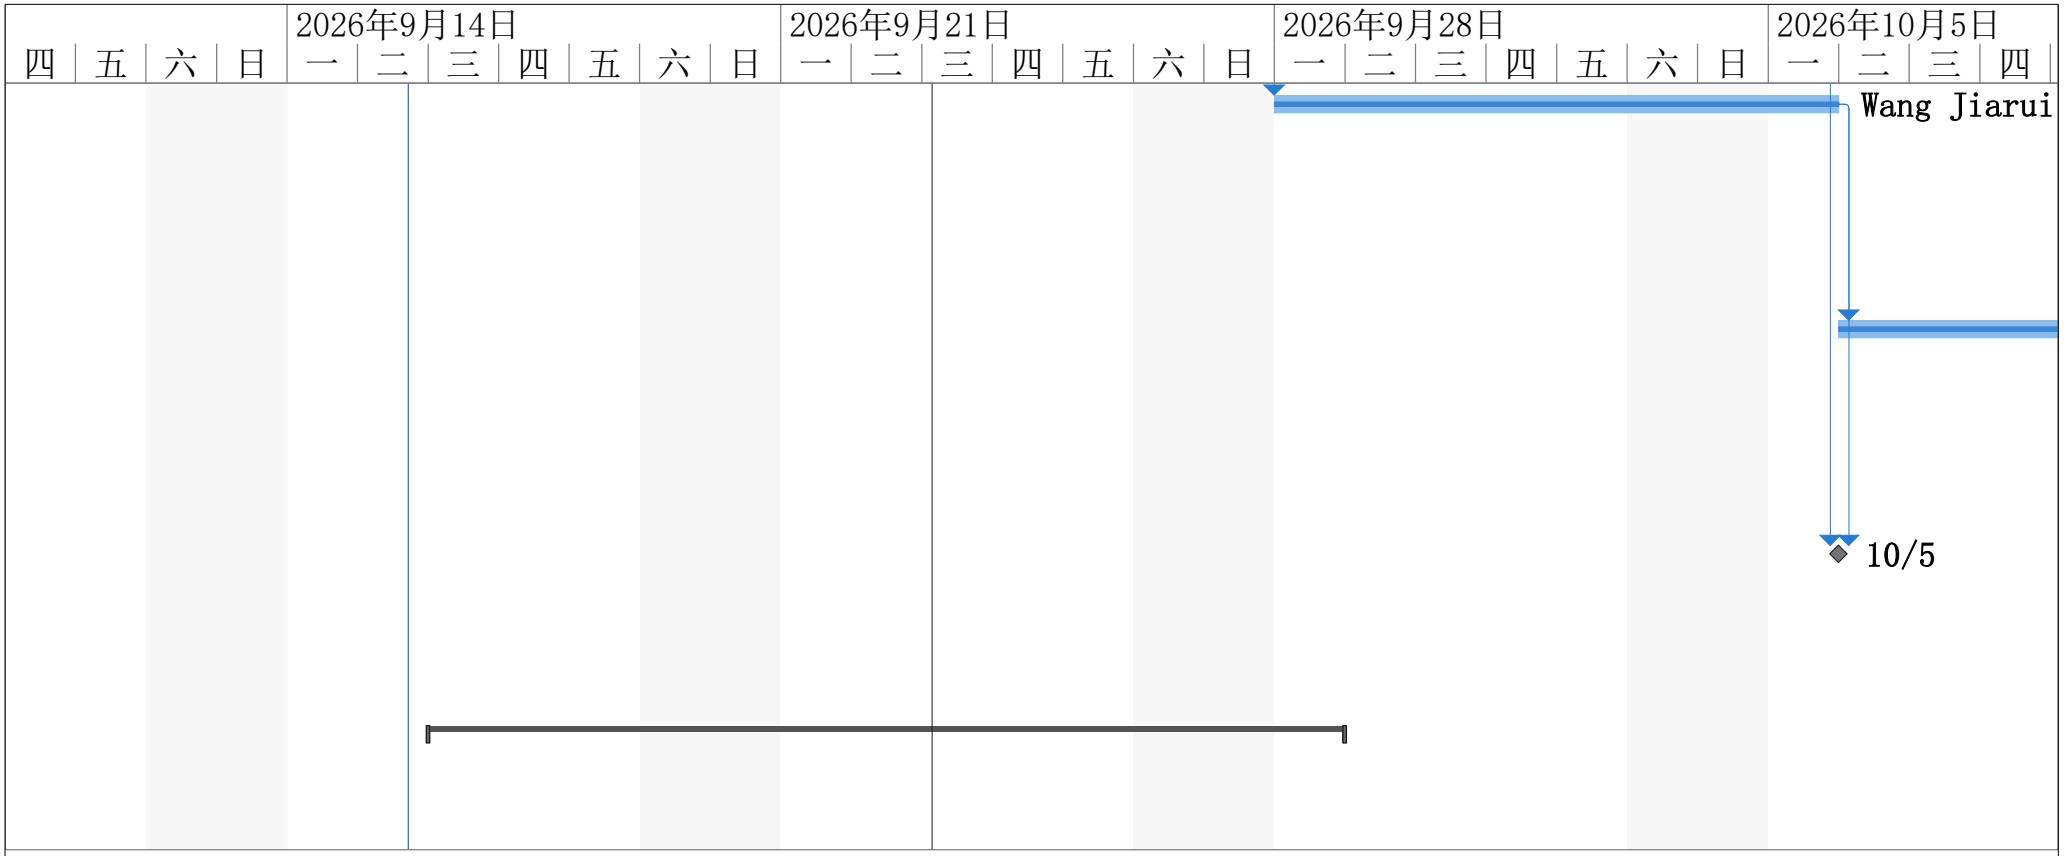


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

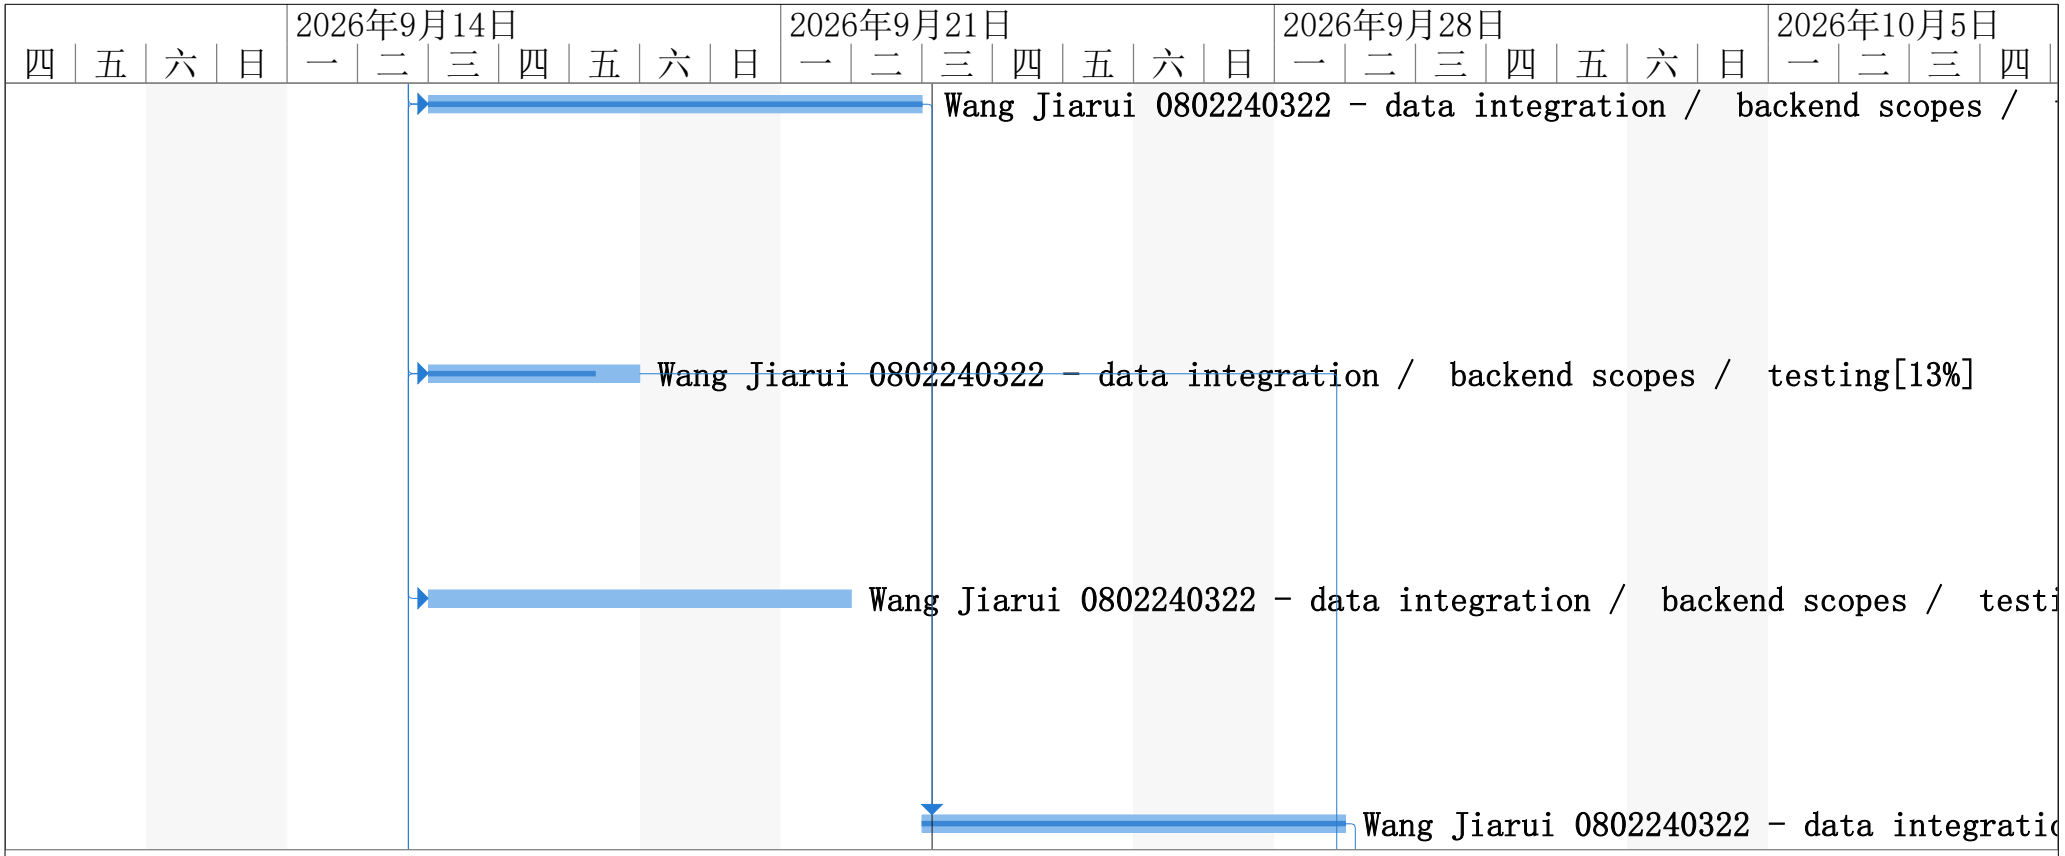


项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

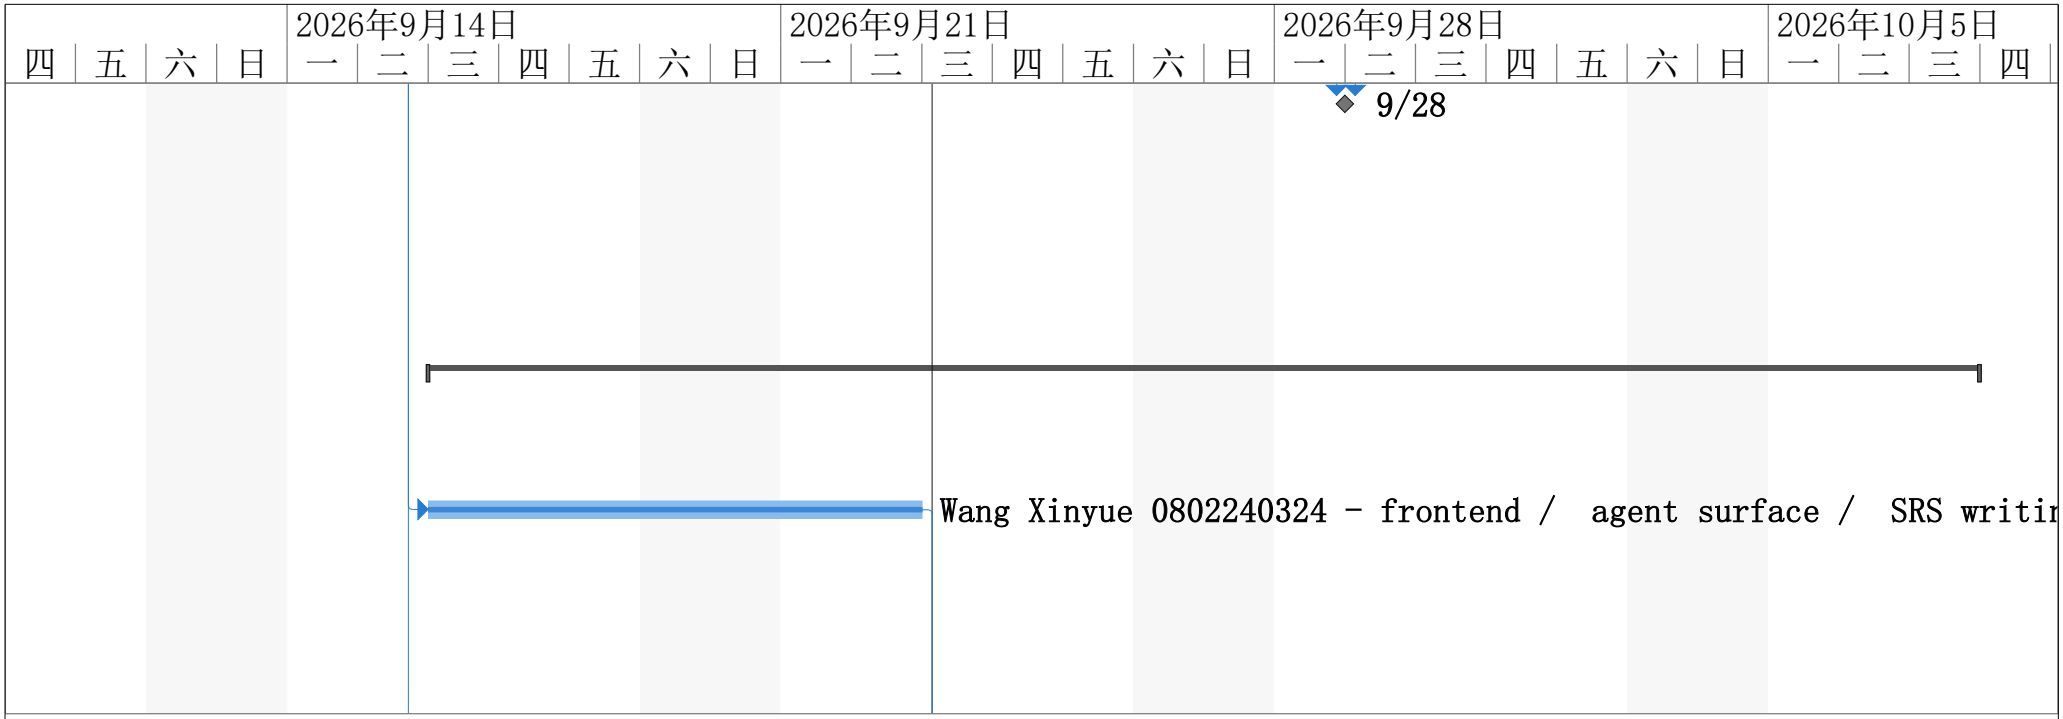


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

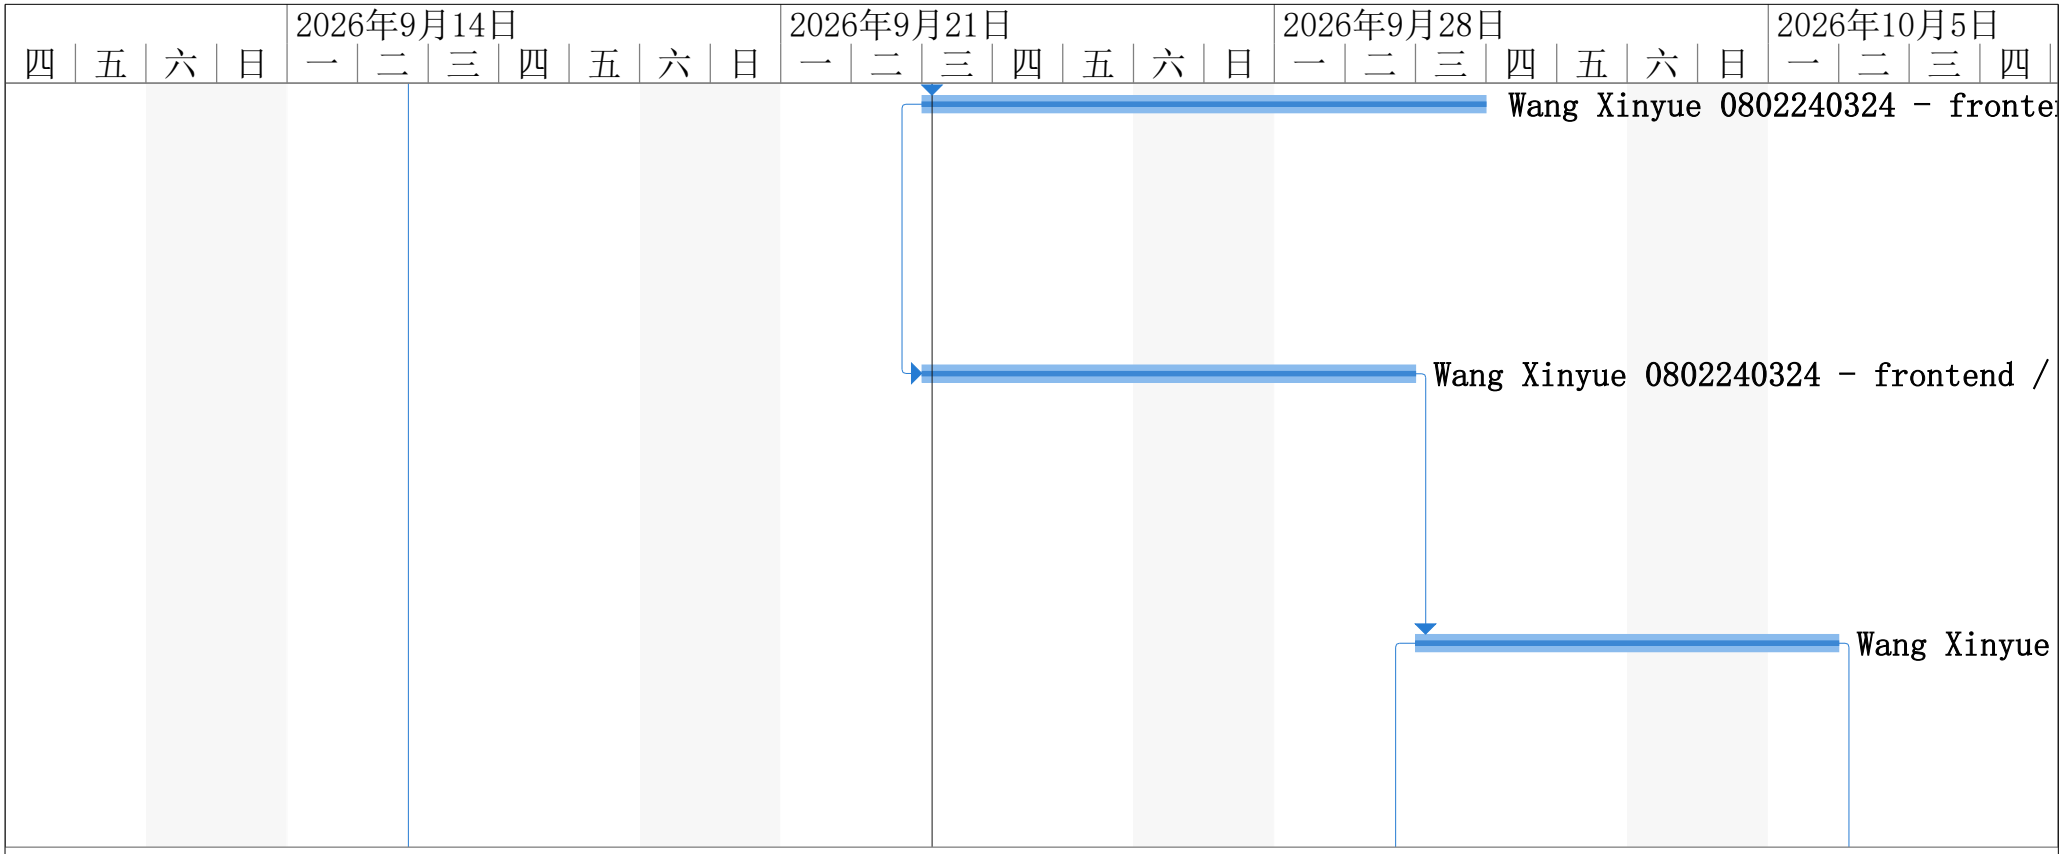


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

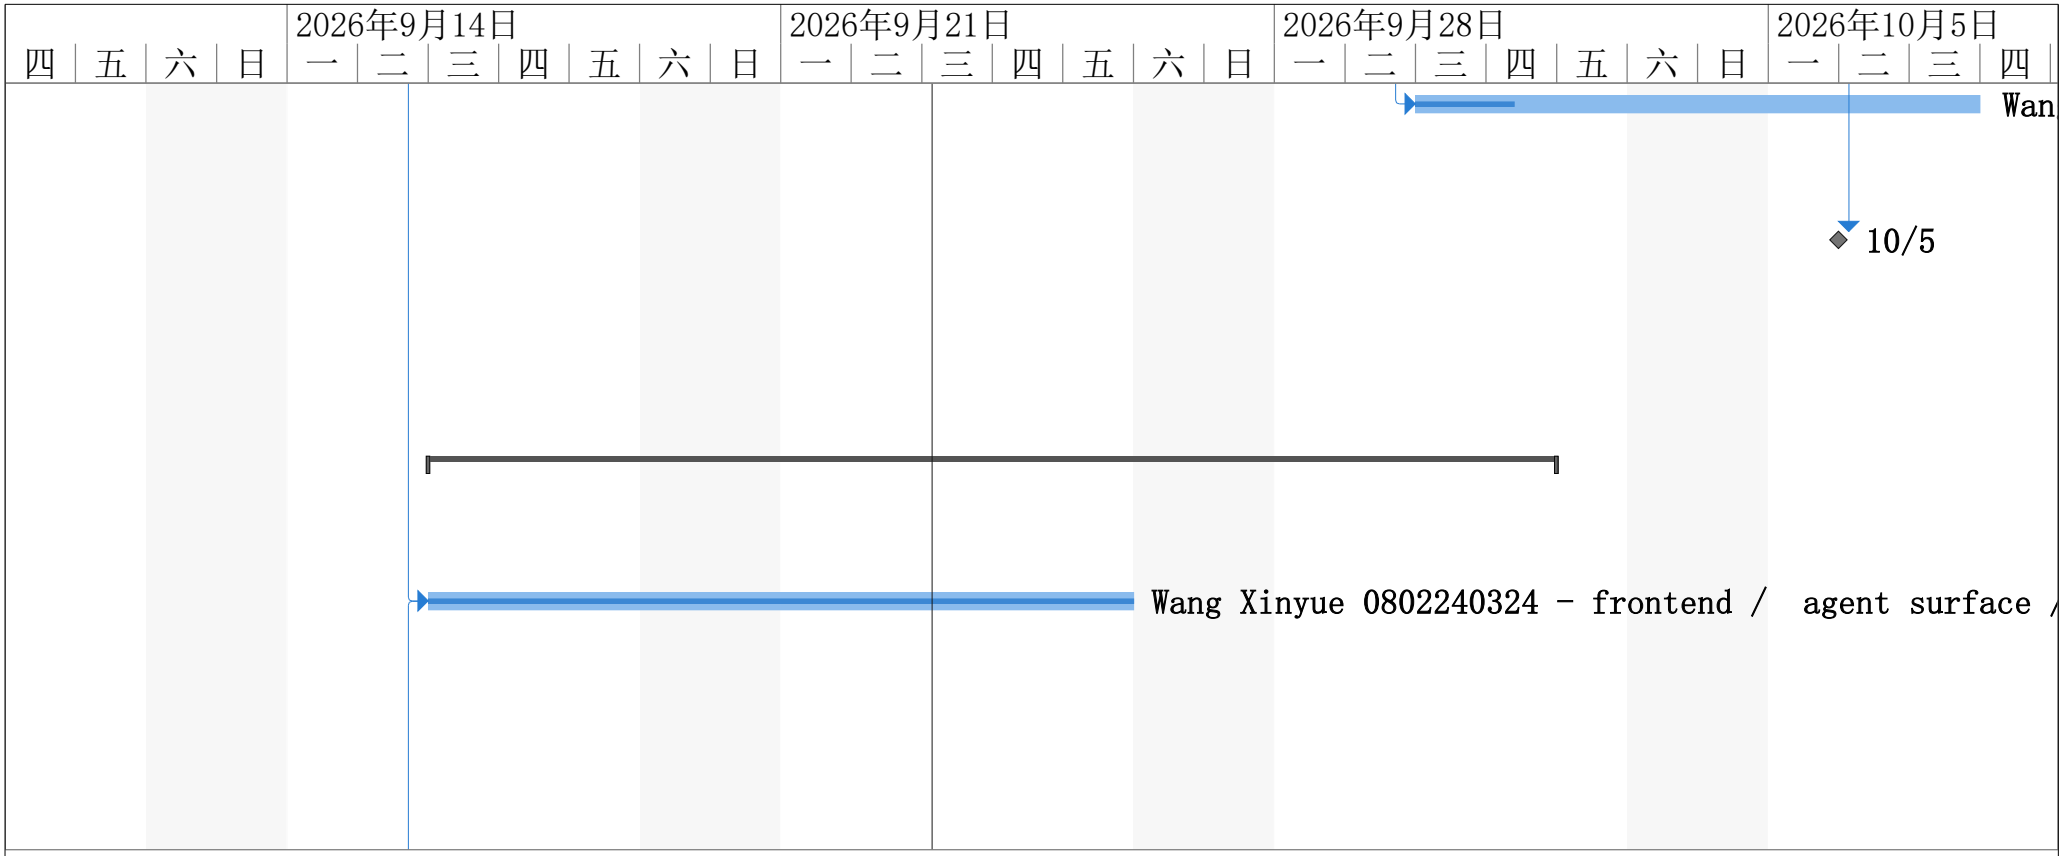


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

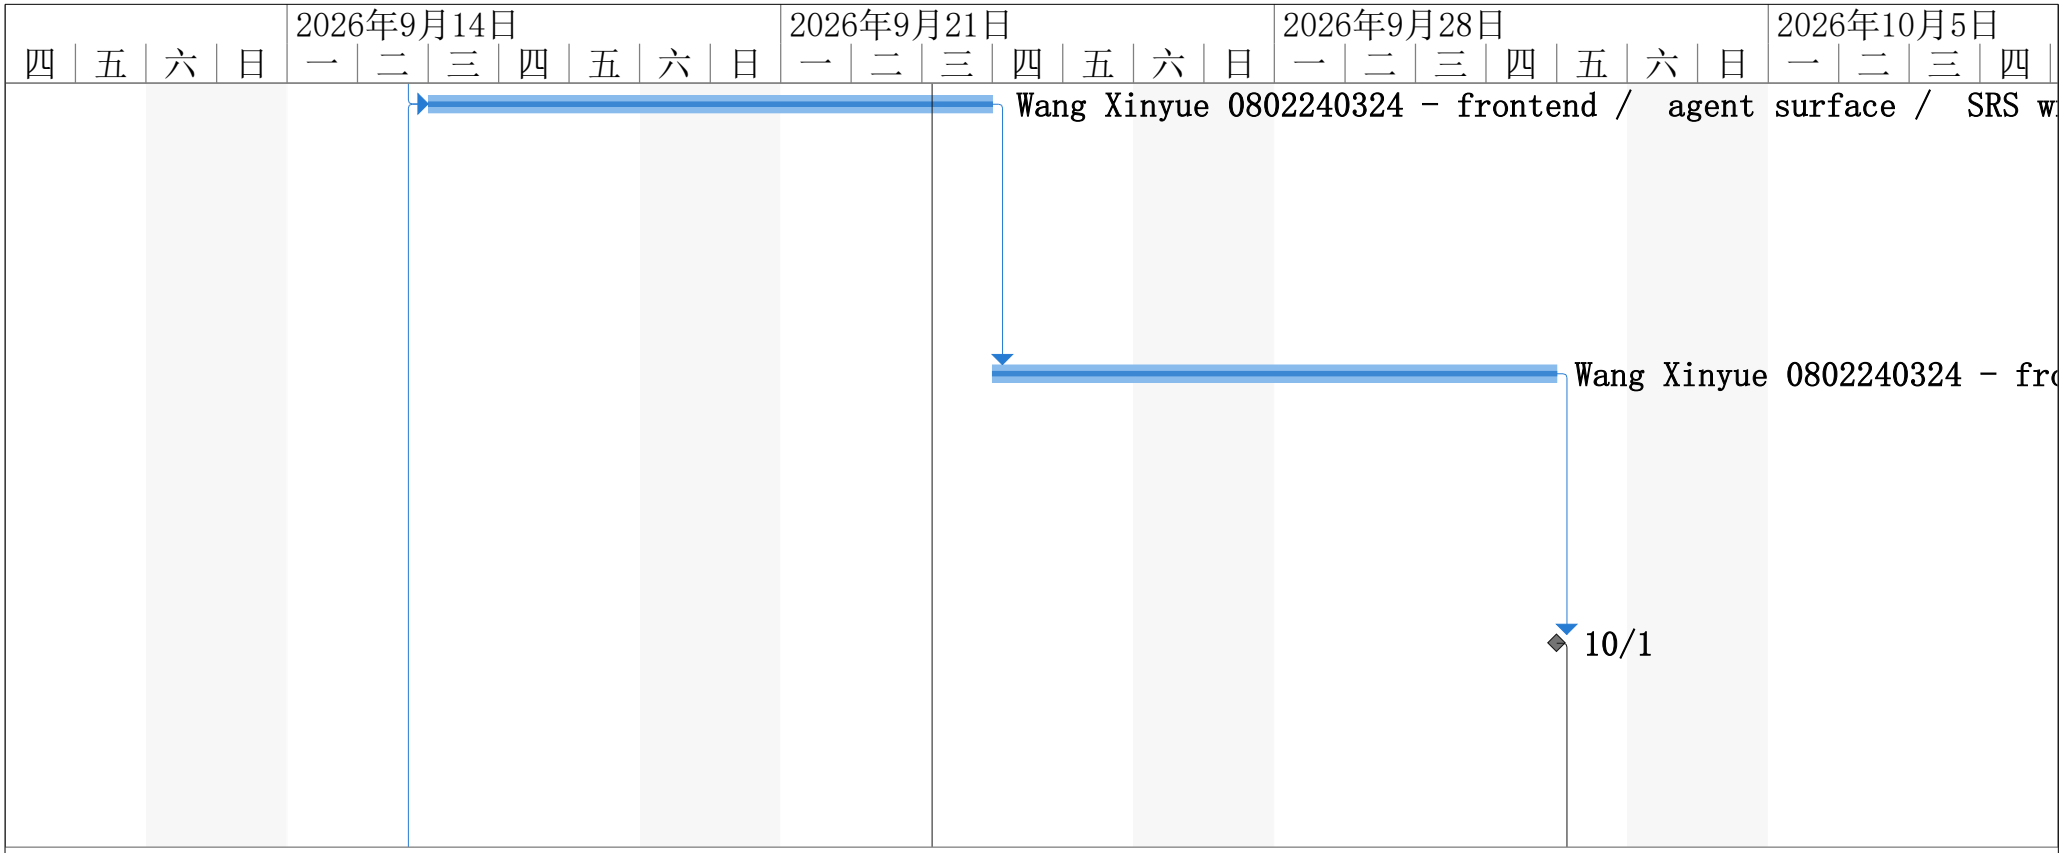


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

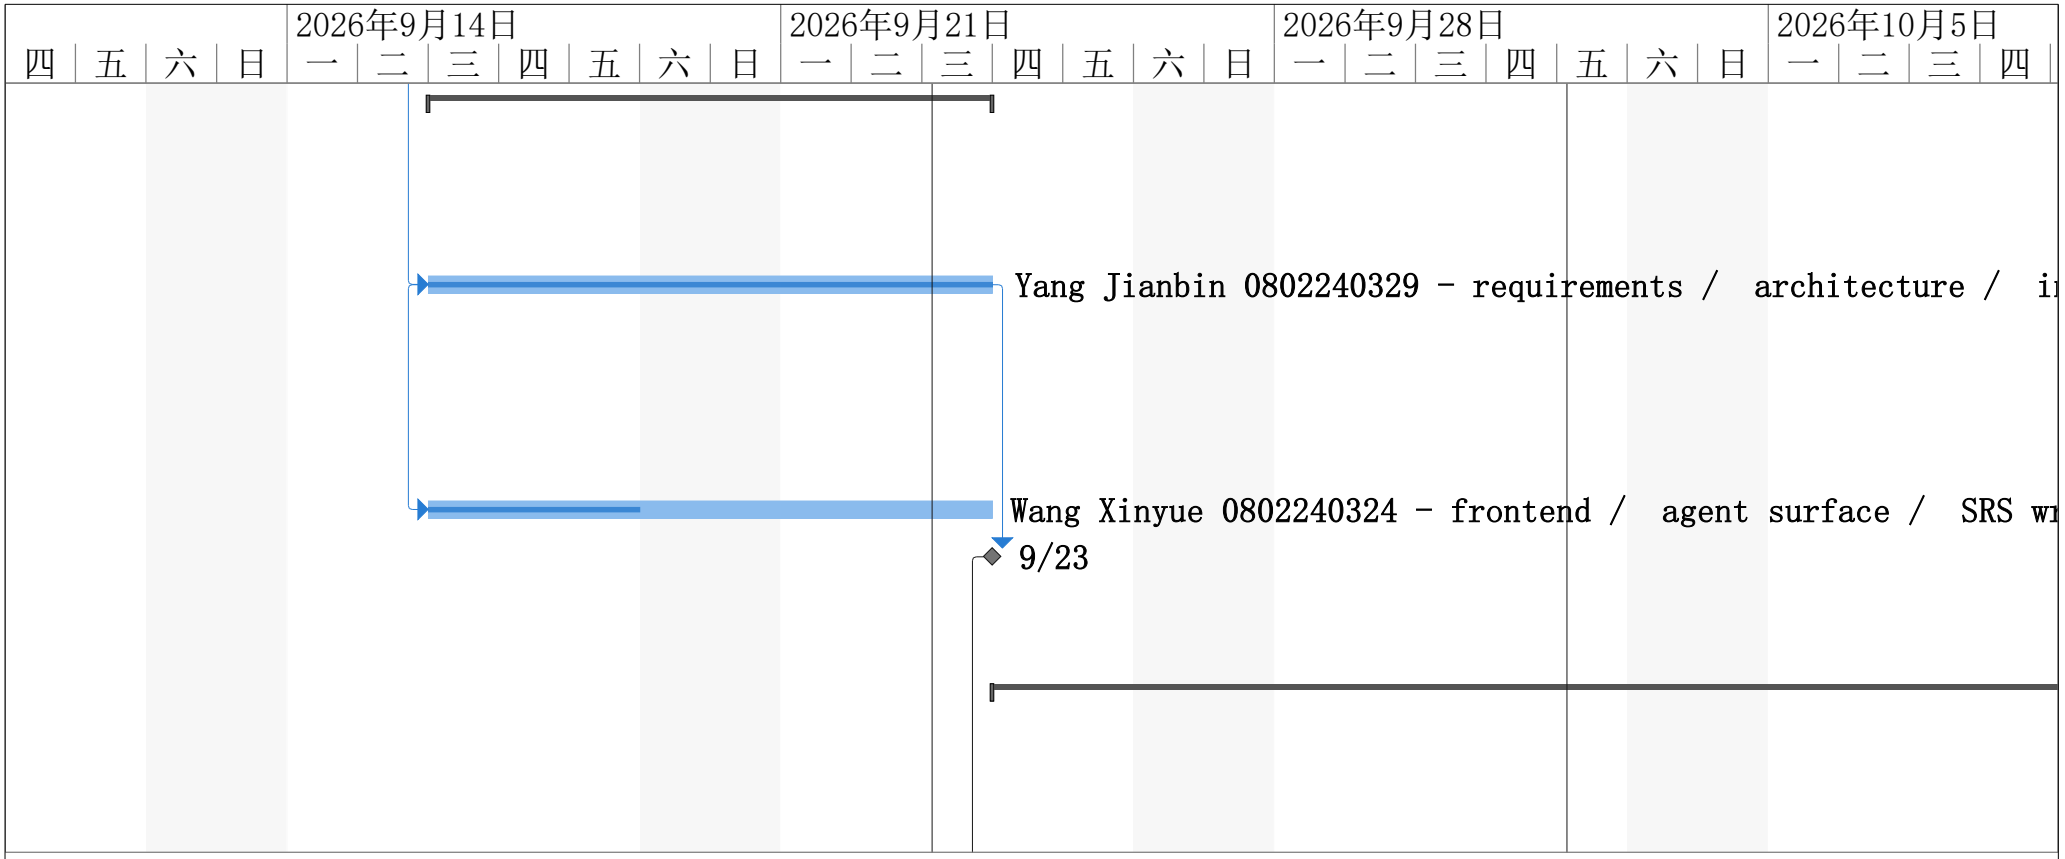


项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

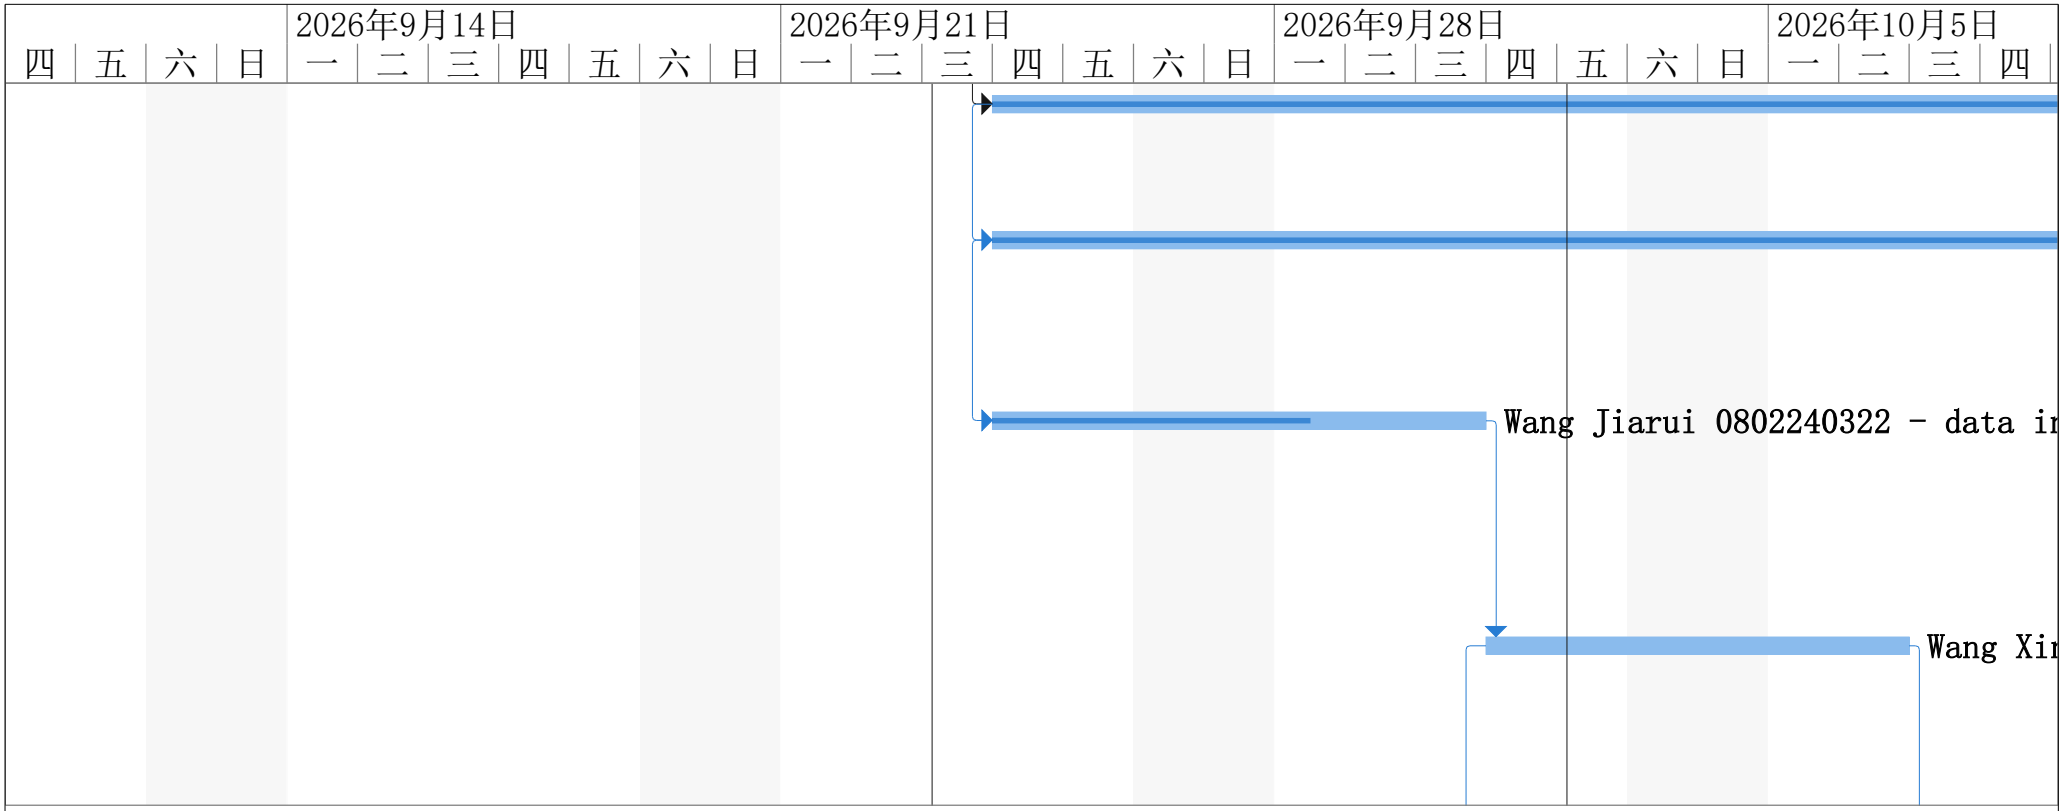


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

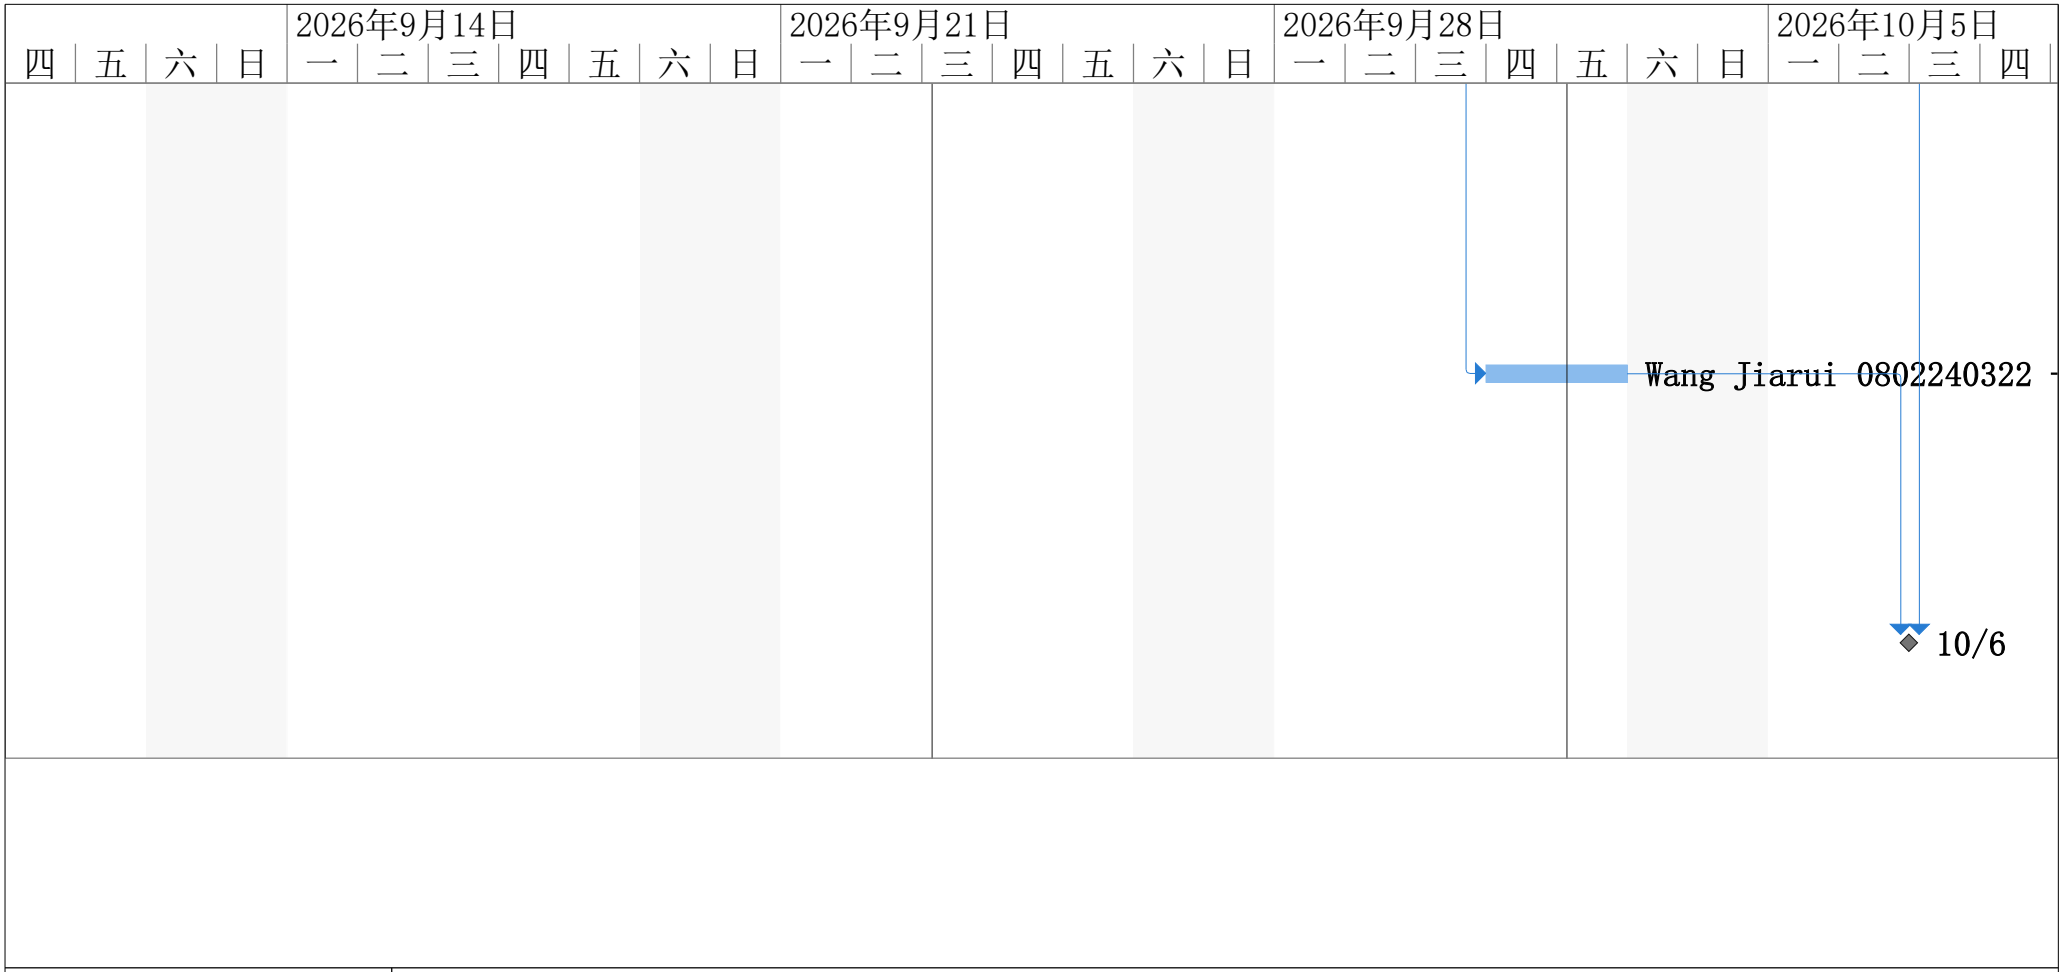


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

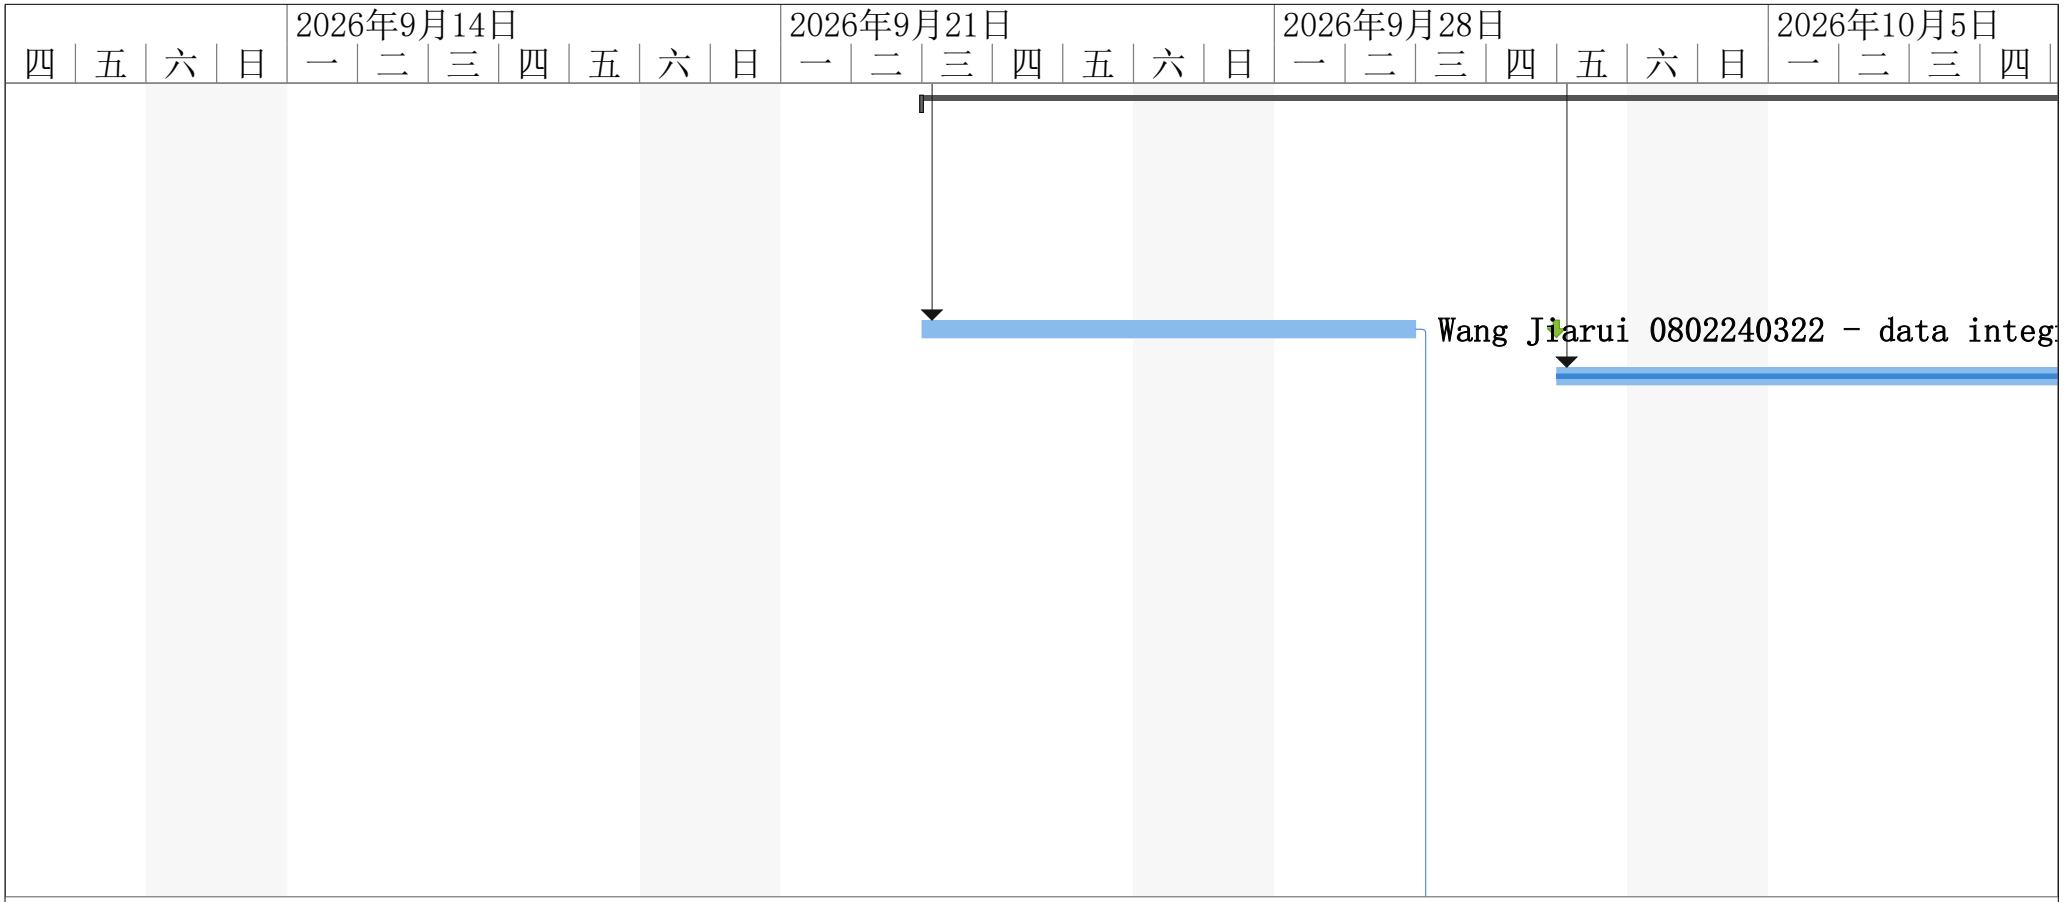


项目：CityNexus_Software Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

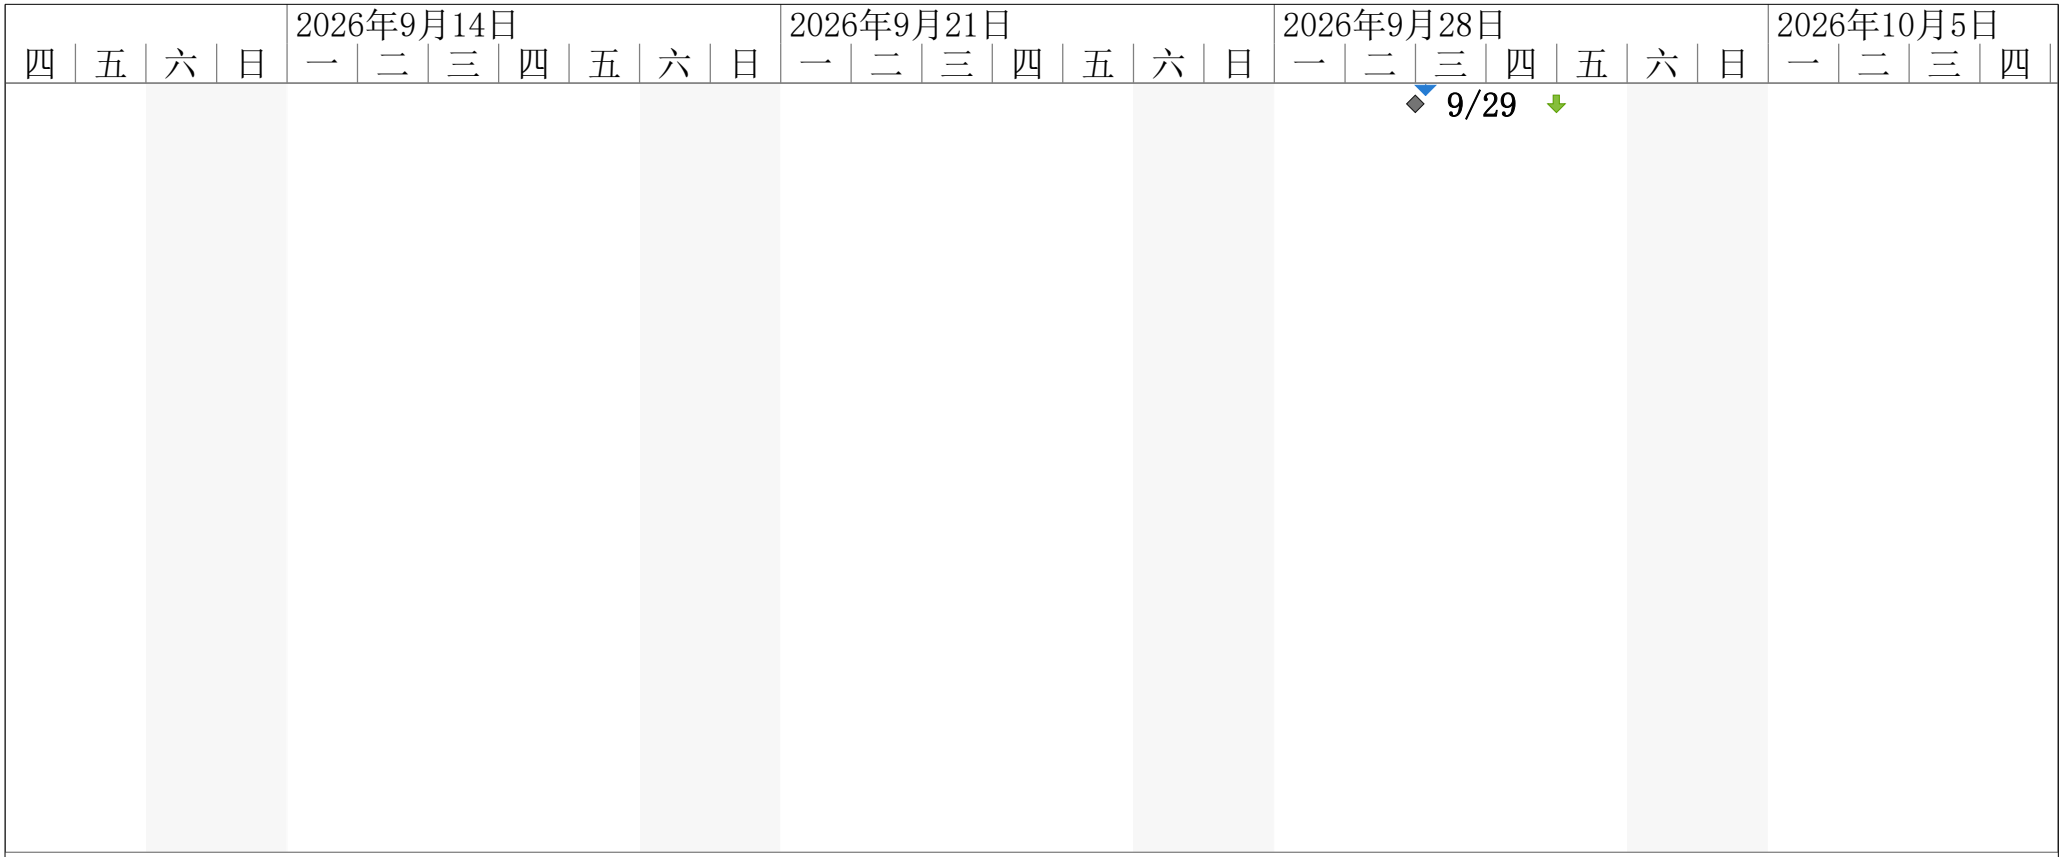

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

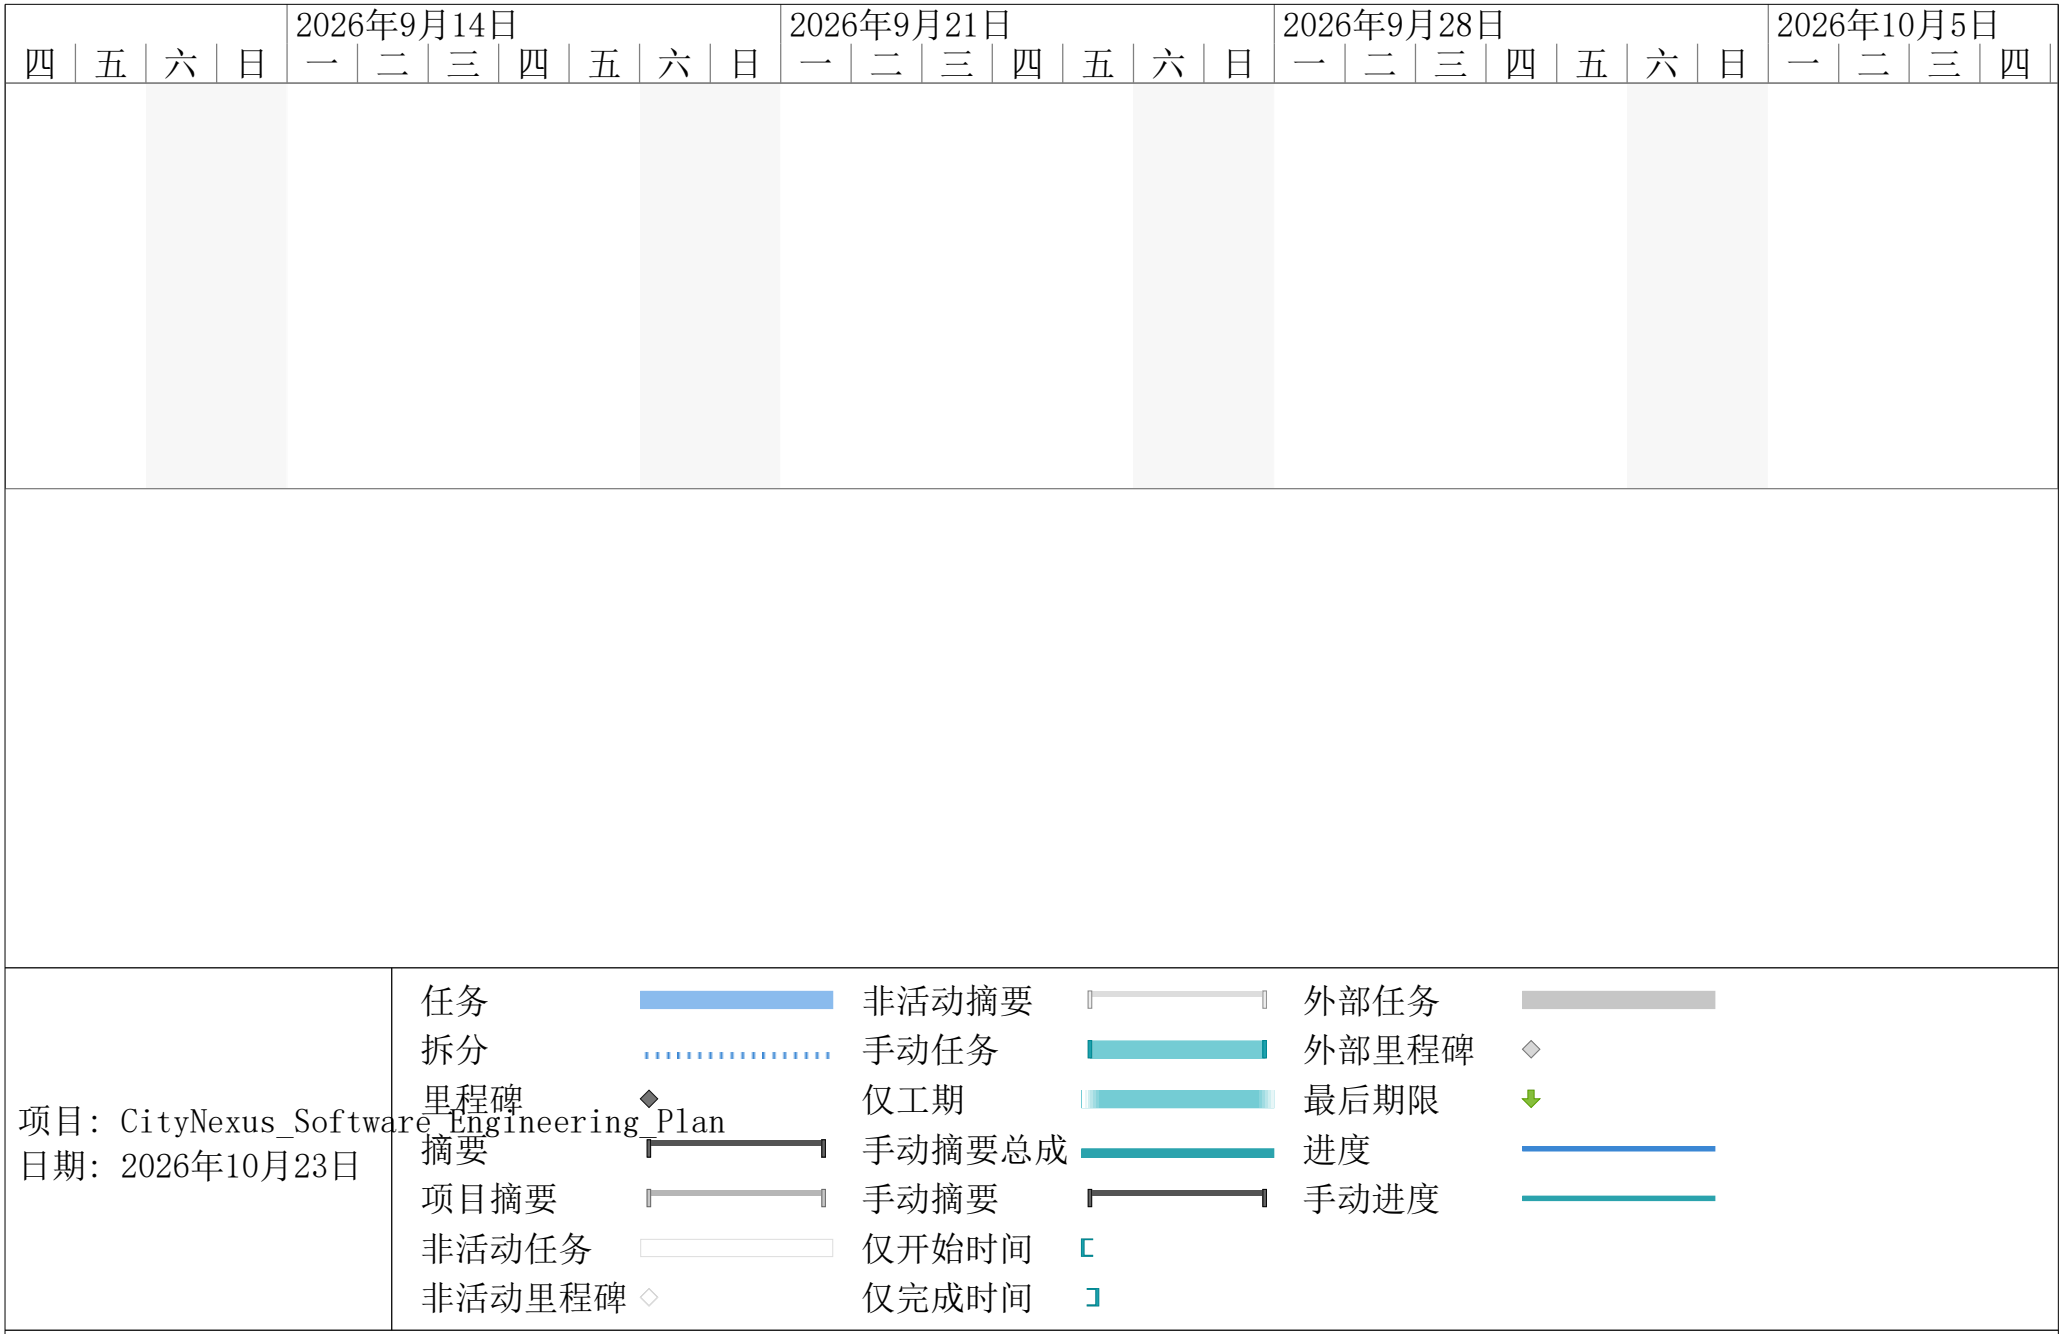
2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
2026年10月5日
四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四
项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

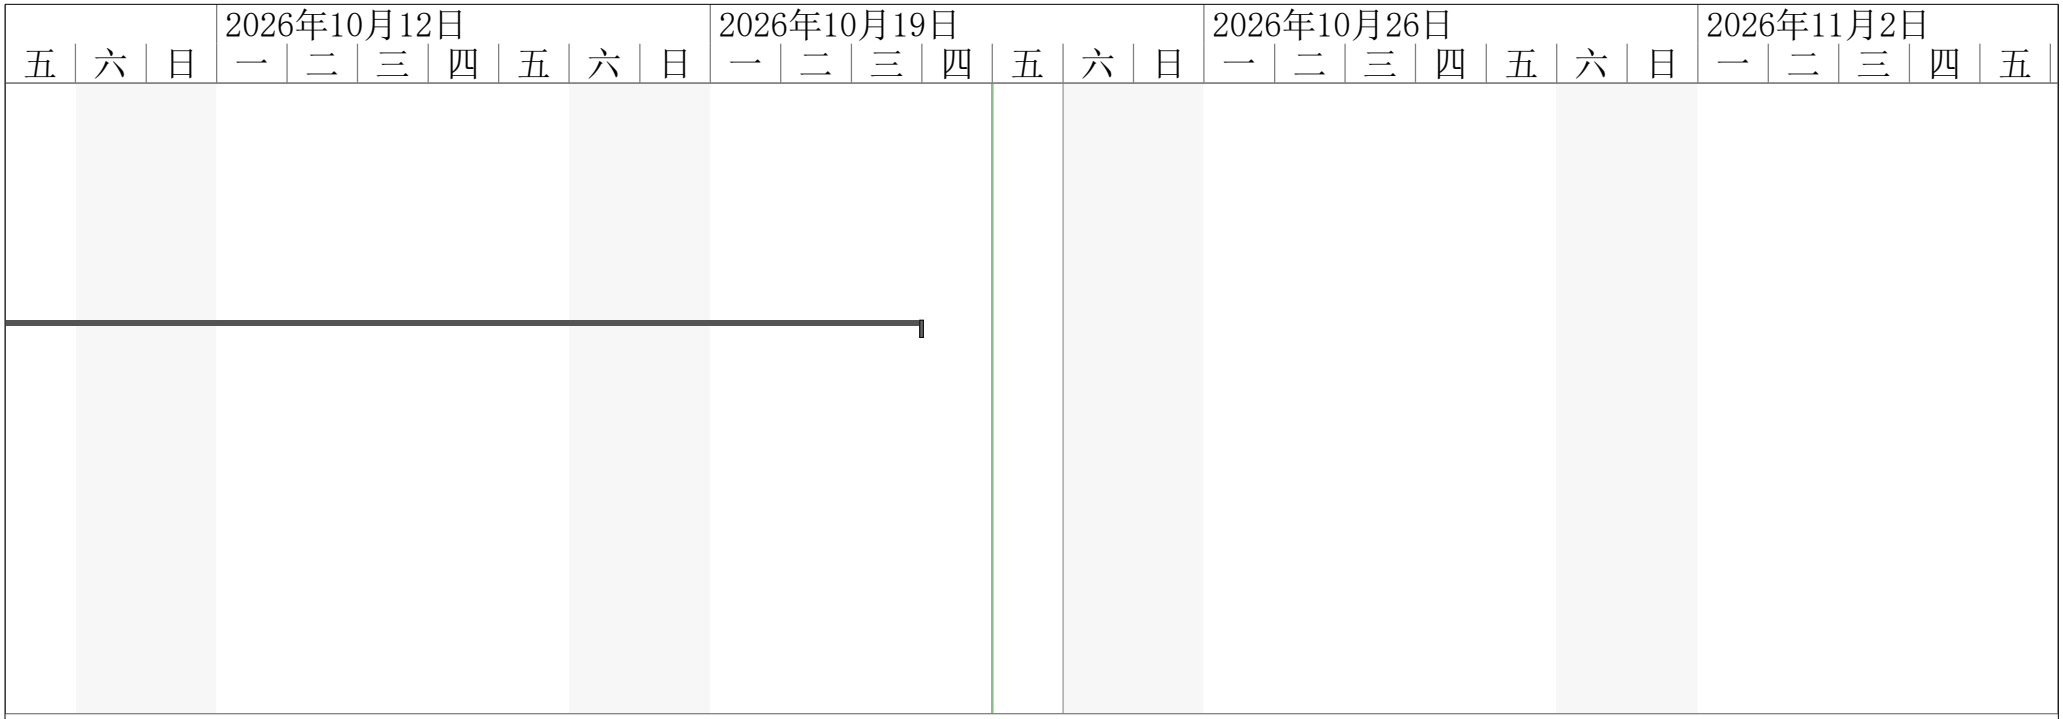

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

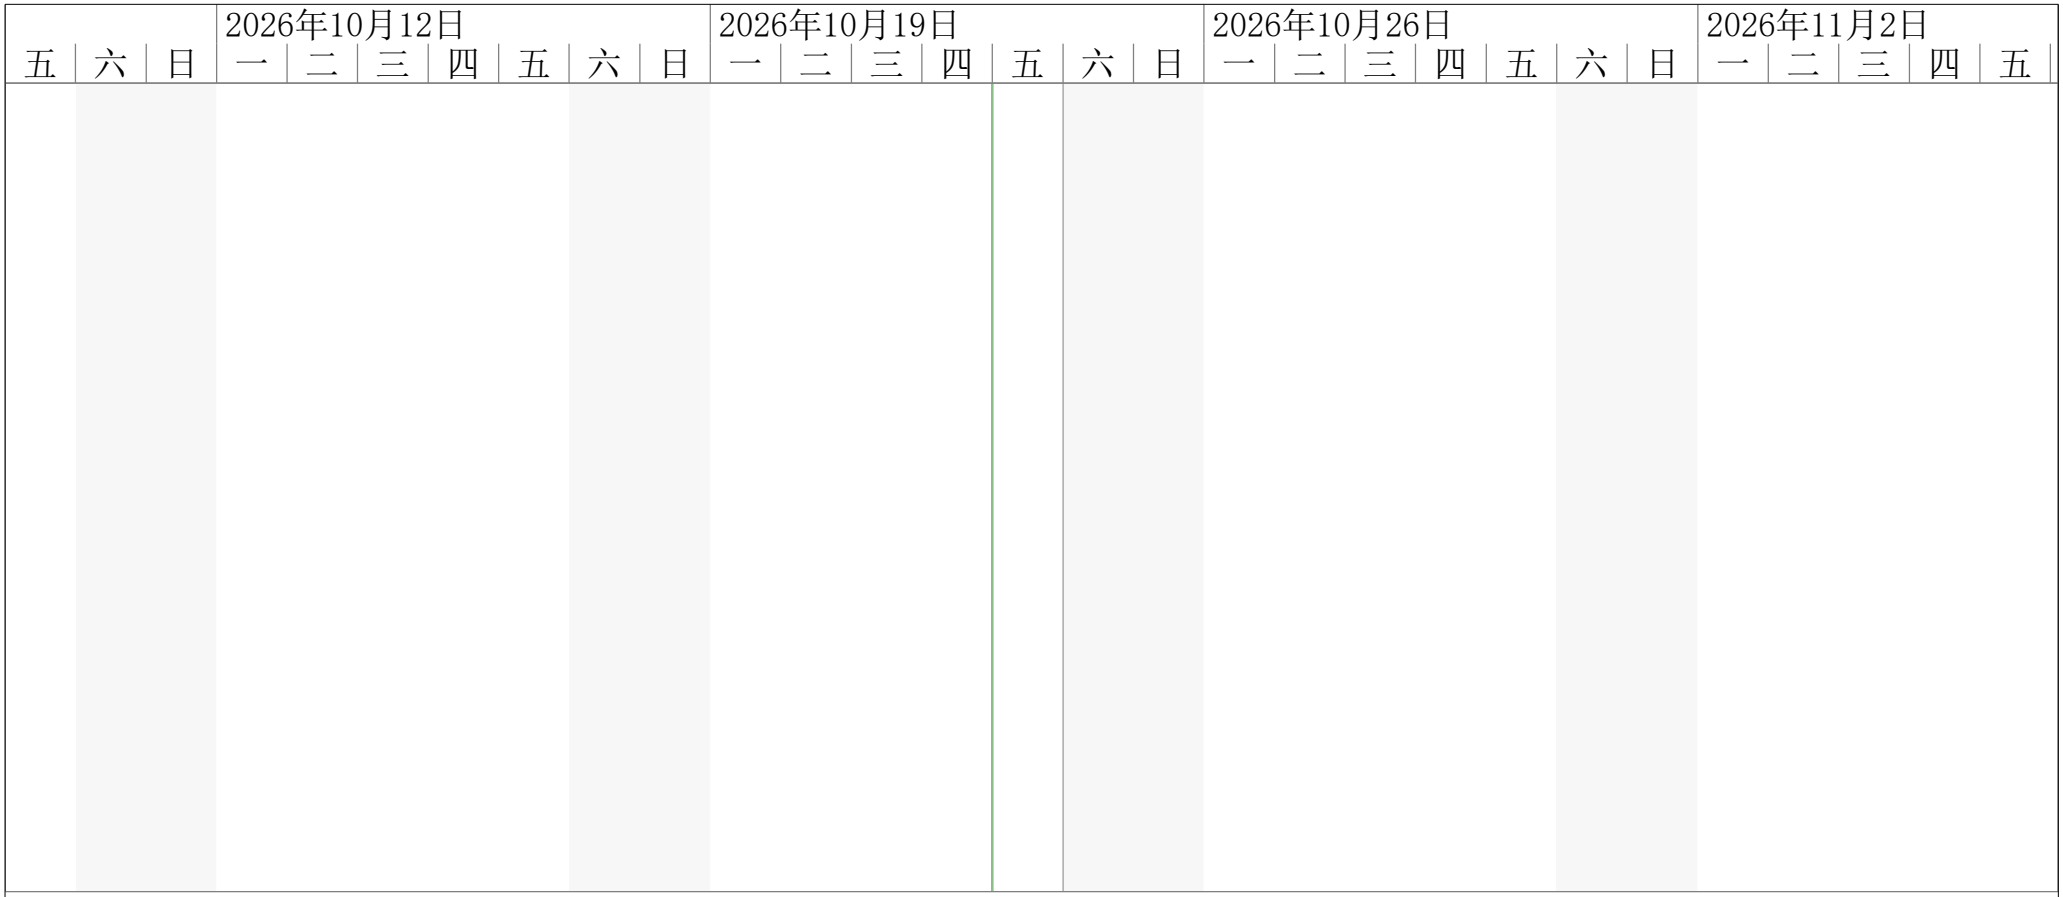

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

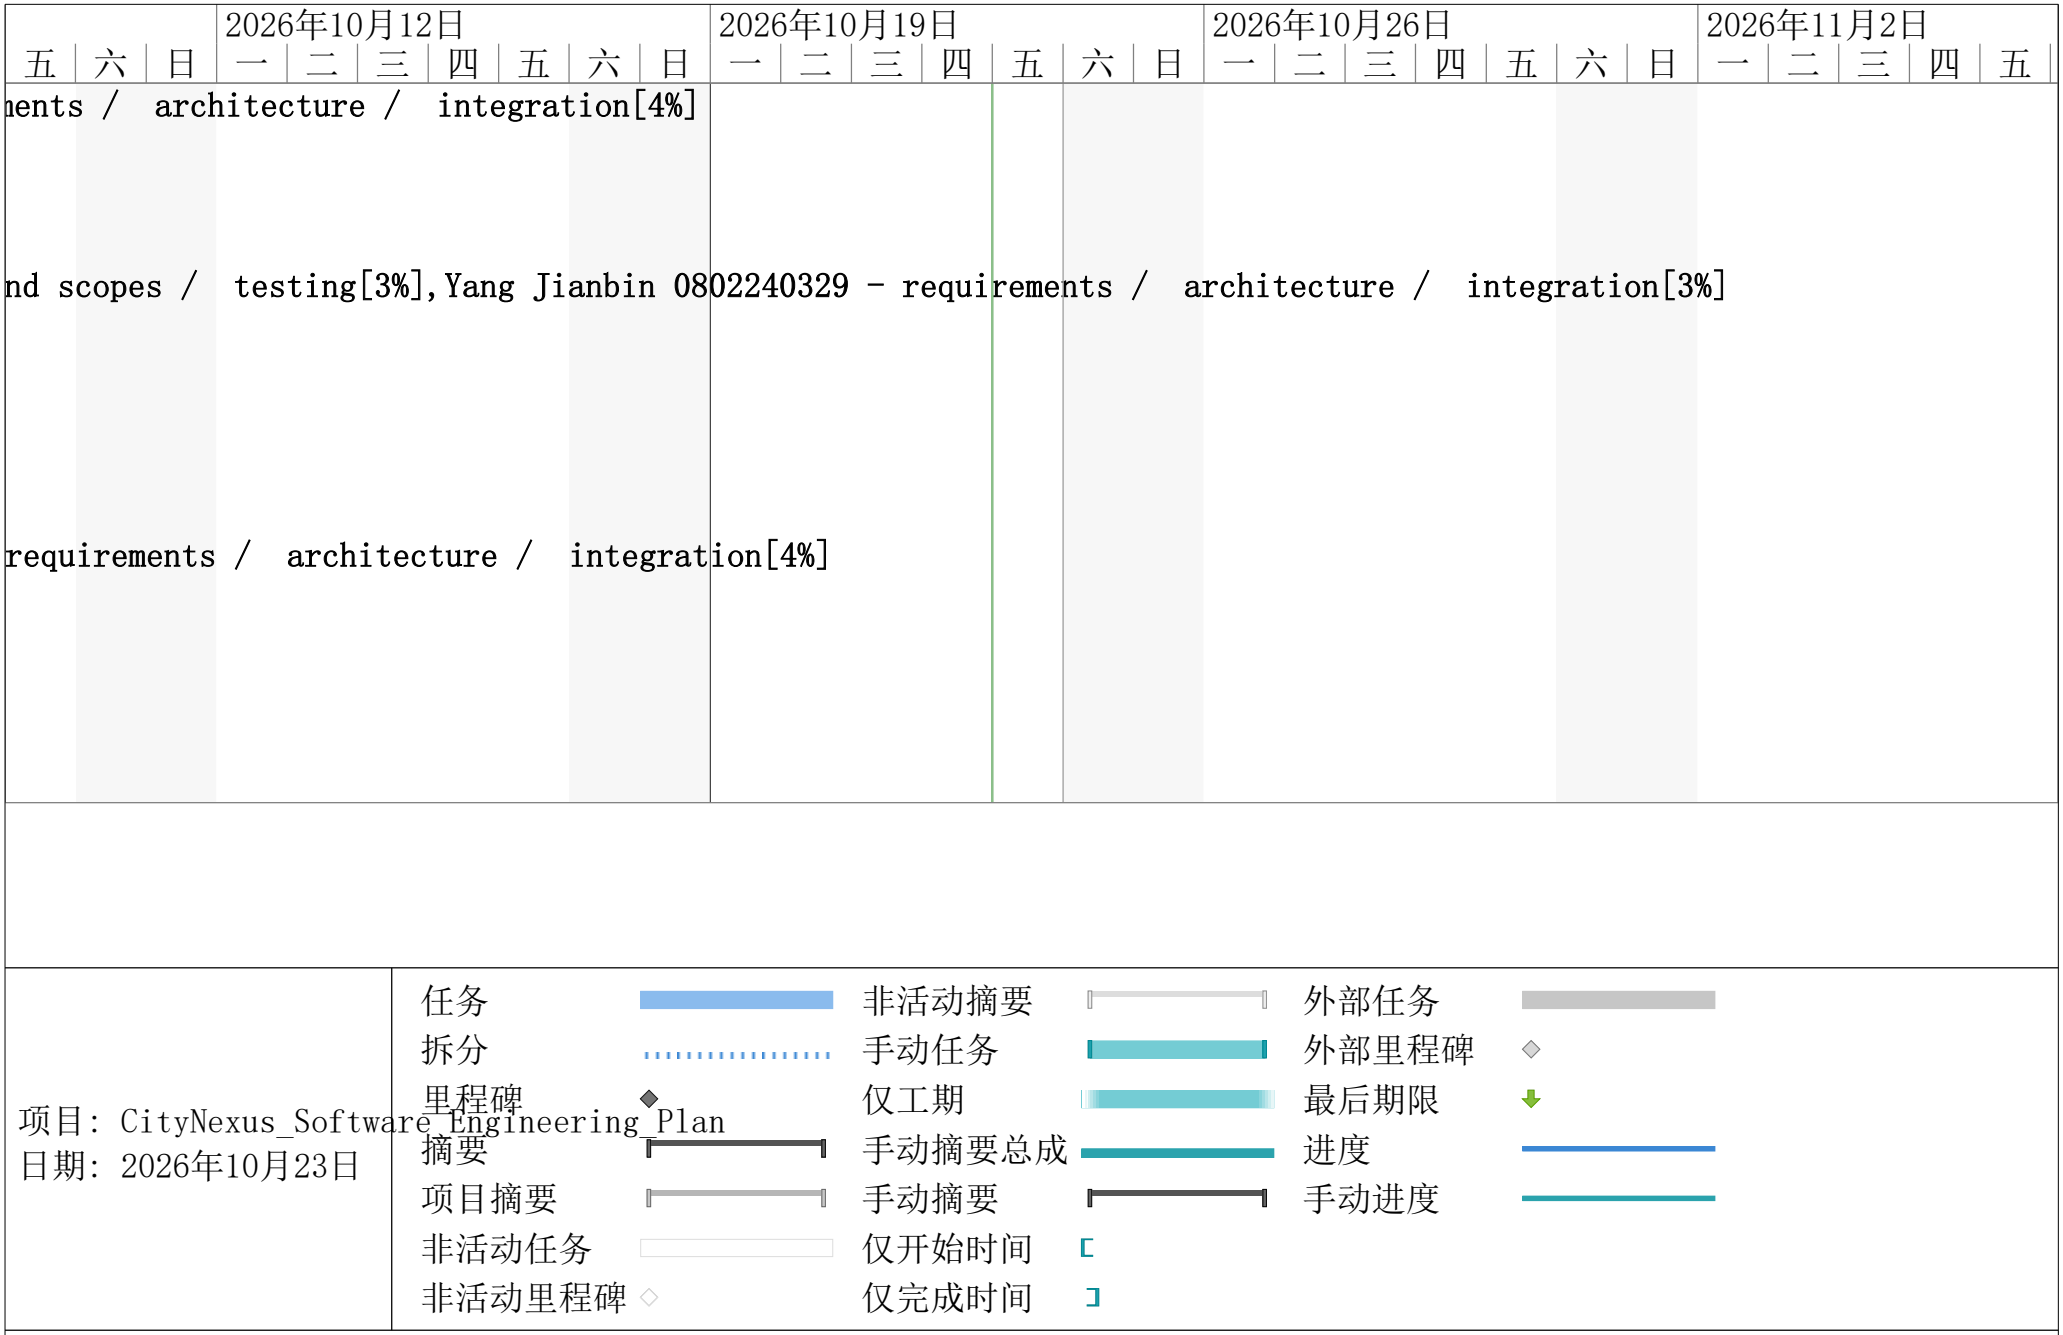
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
ments / architecture / integration[4%]
nd scopes / testing[3%],Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[3%]
requirements / architecture / integration[4%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

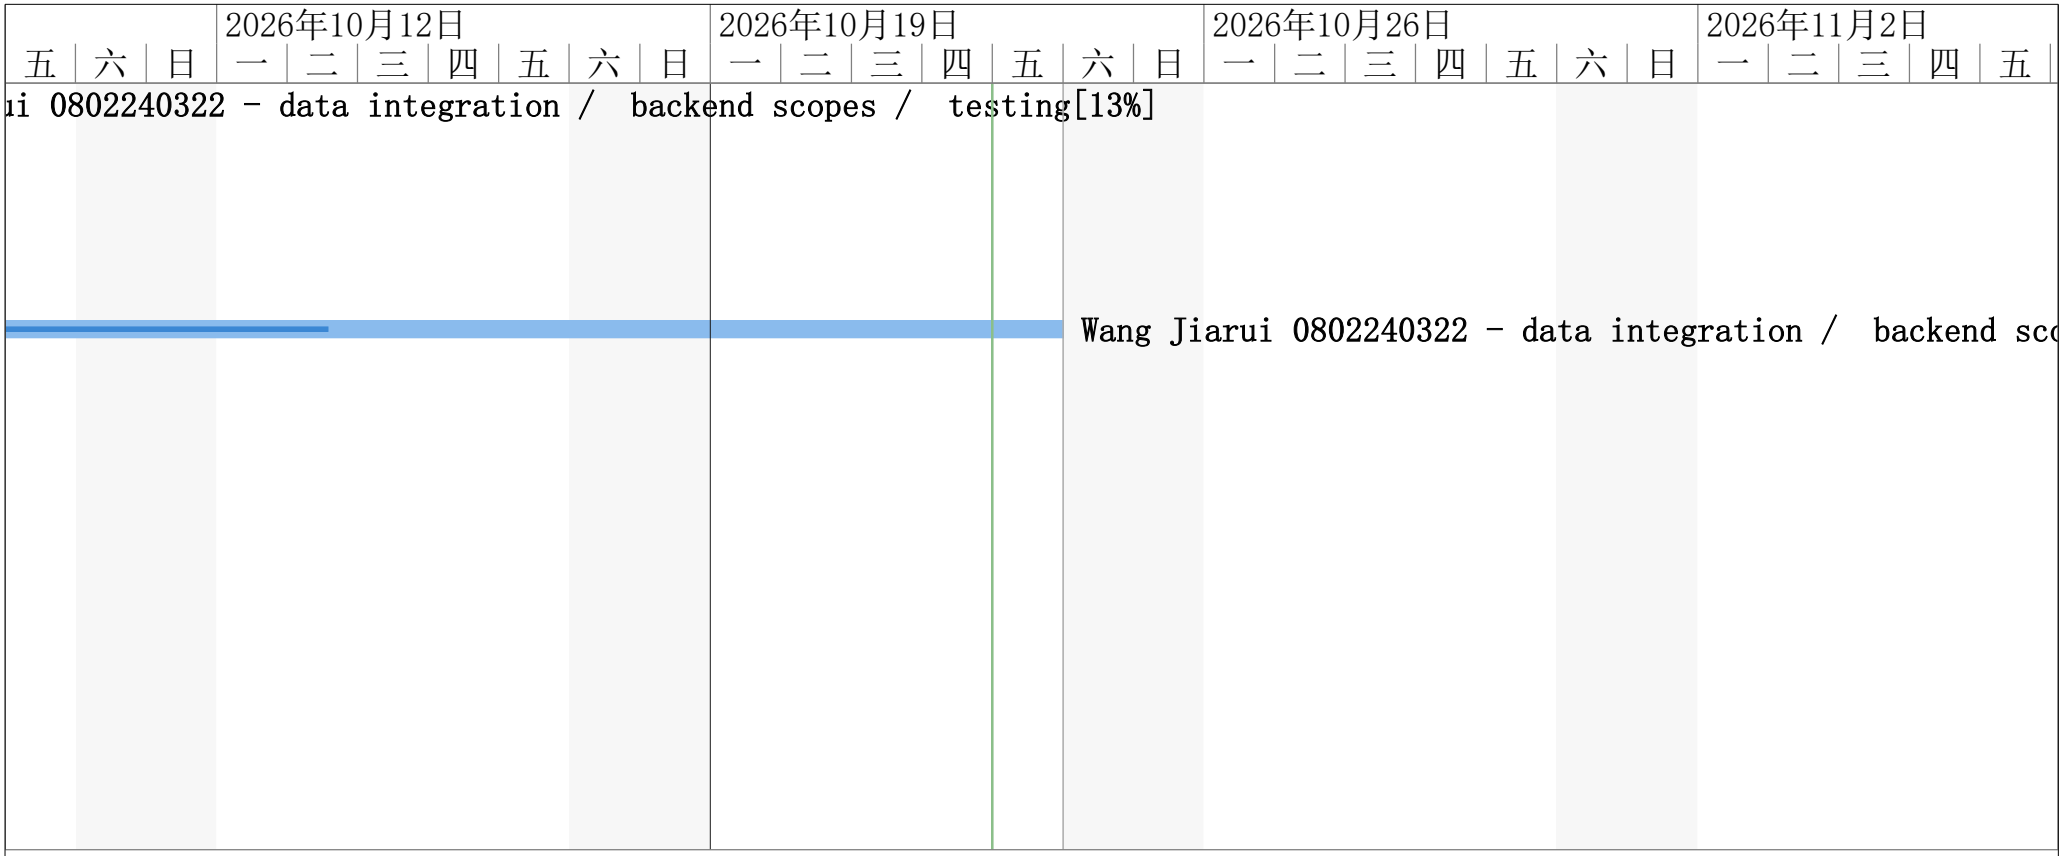

项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

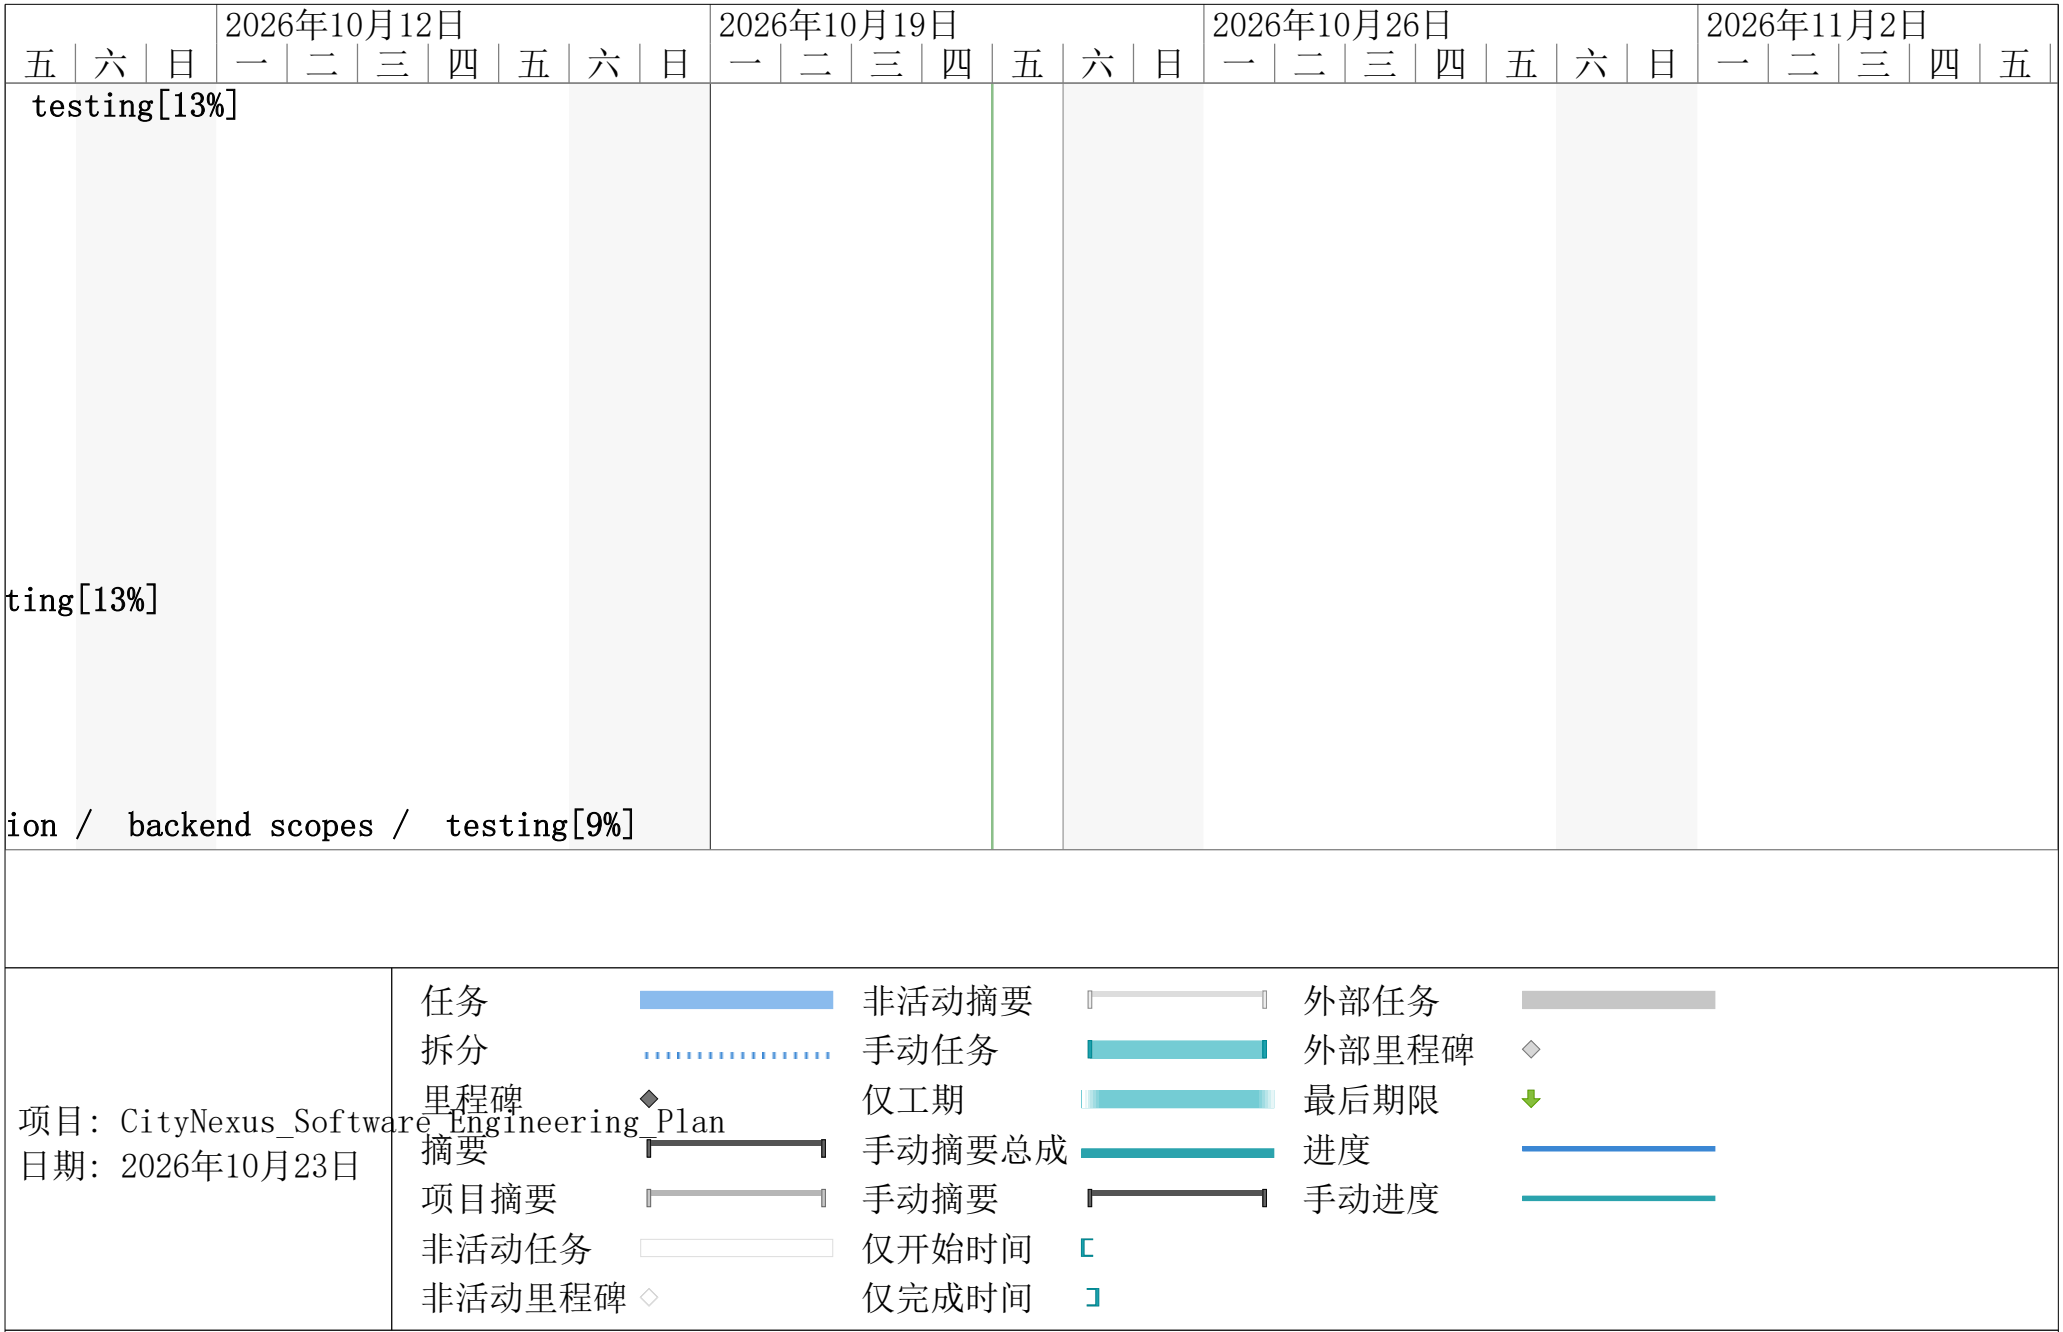
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
testing[13%]
ting[13%]
ion / backend scopes / testing[9%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	





项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

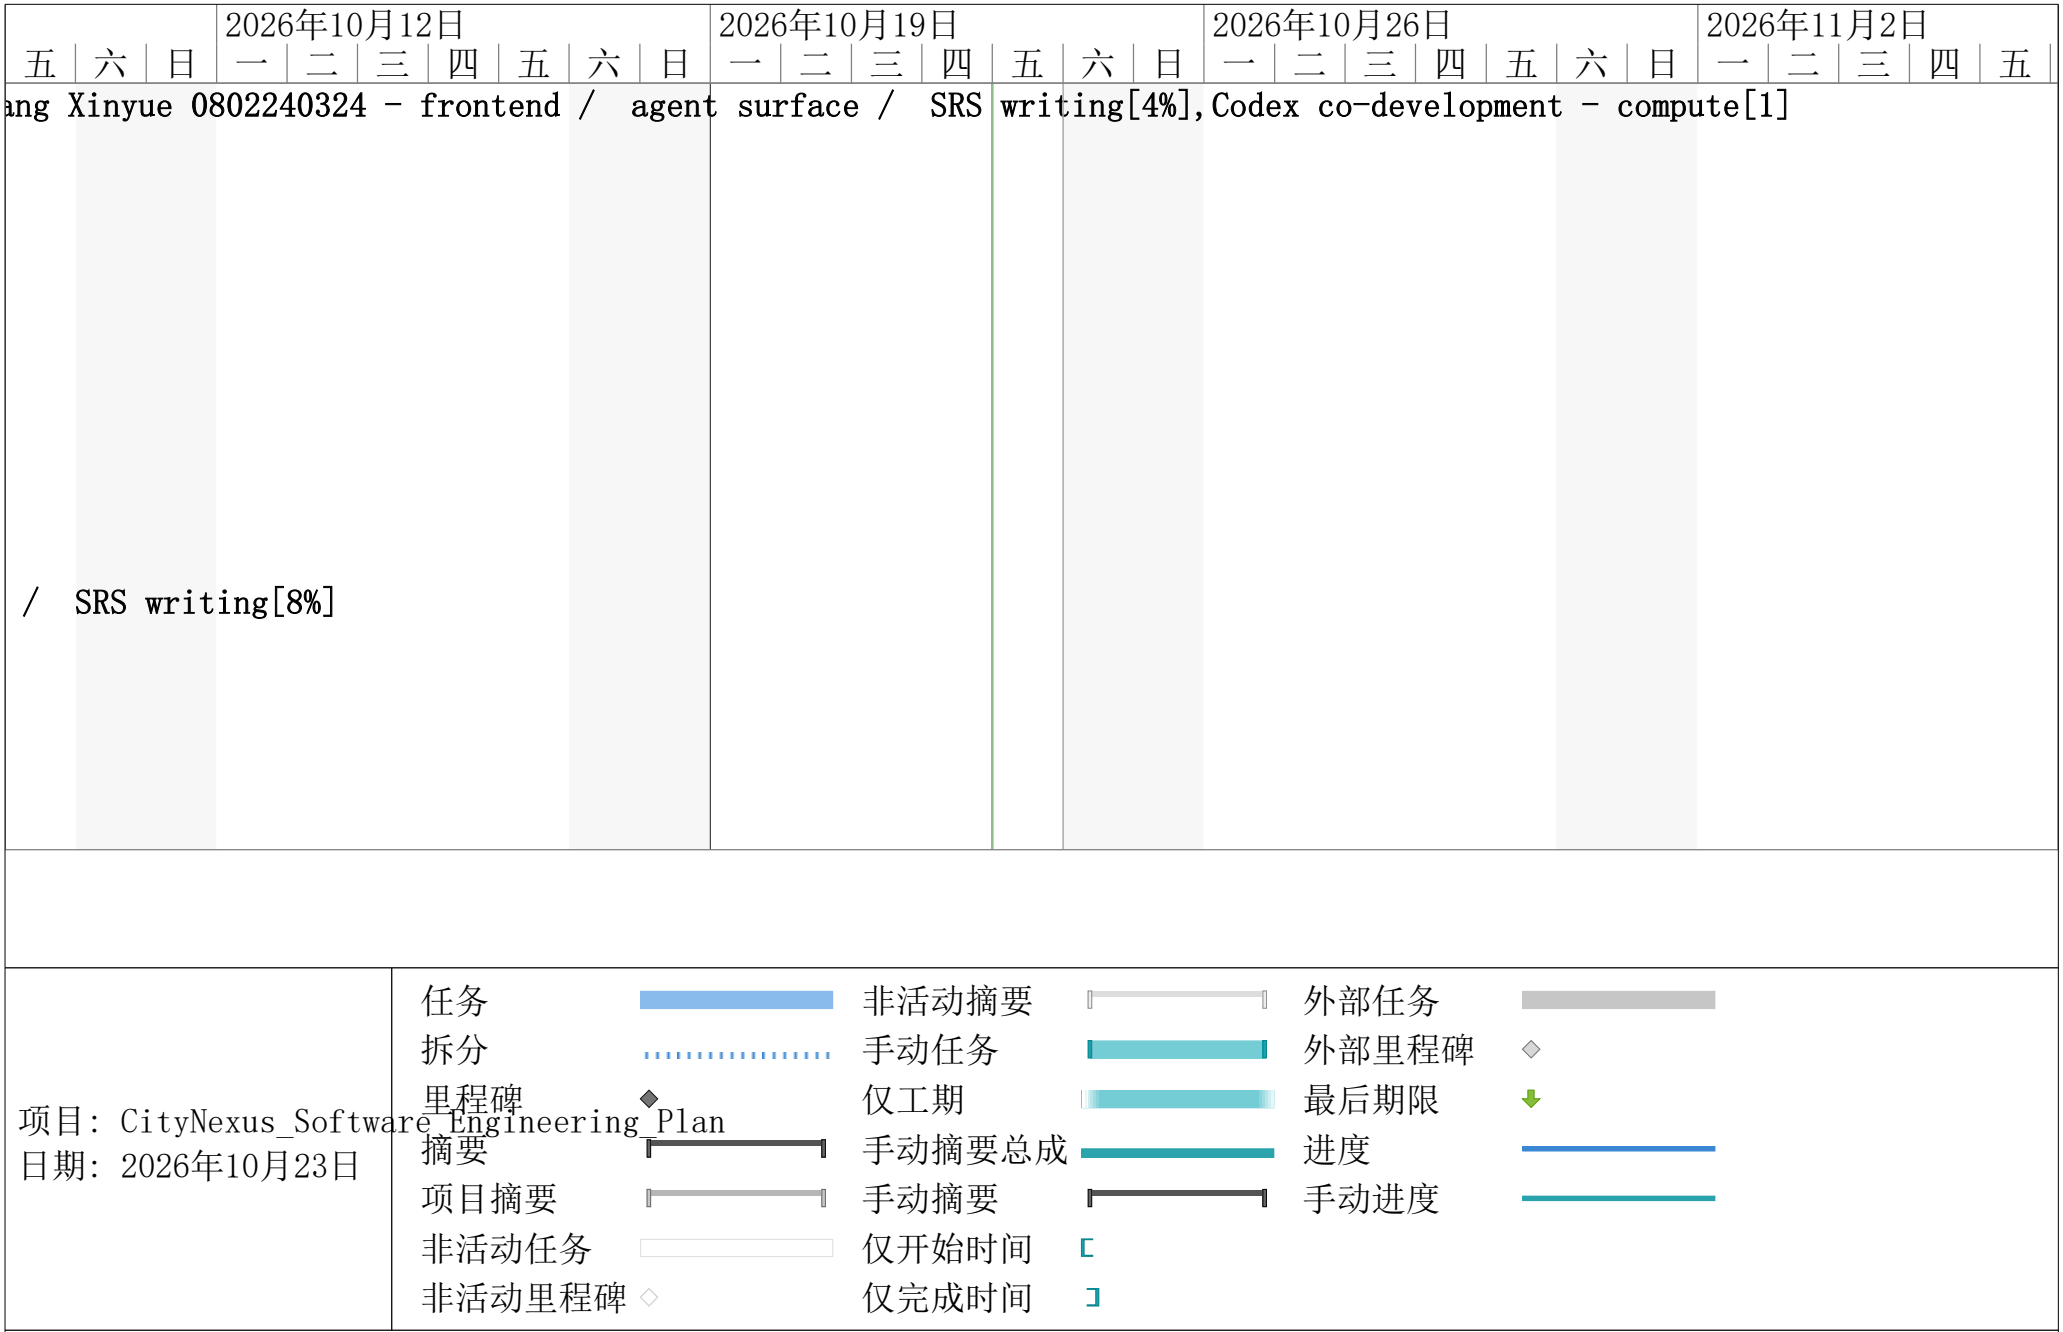
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
ang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[4%],Codex co-development - compute[1]
/ SRS writing[8%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

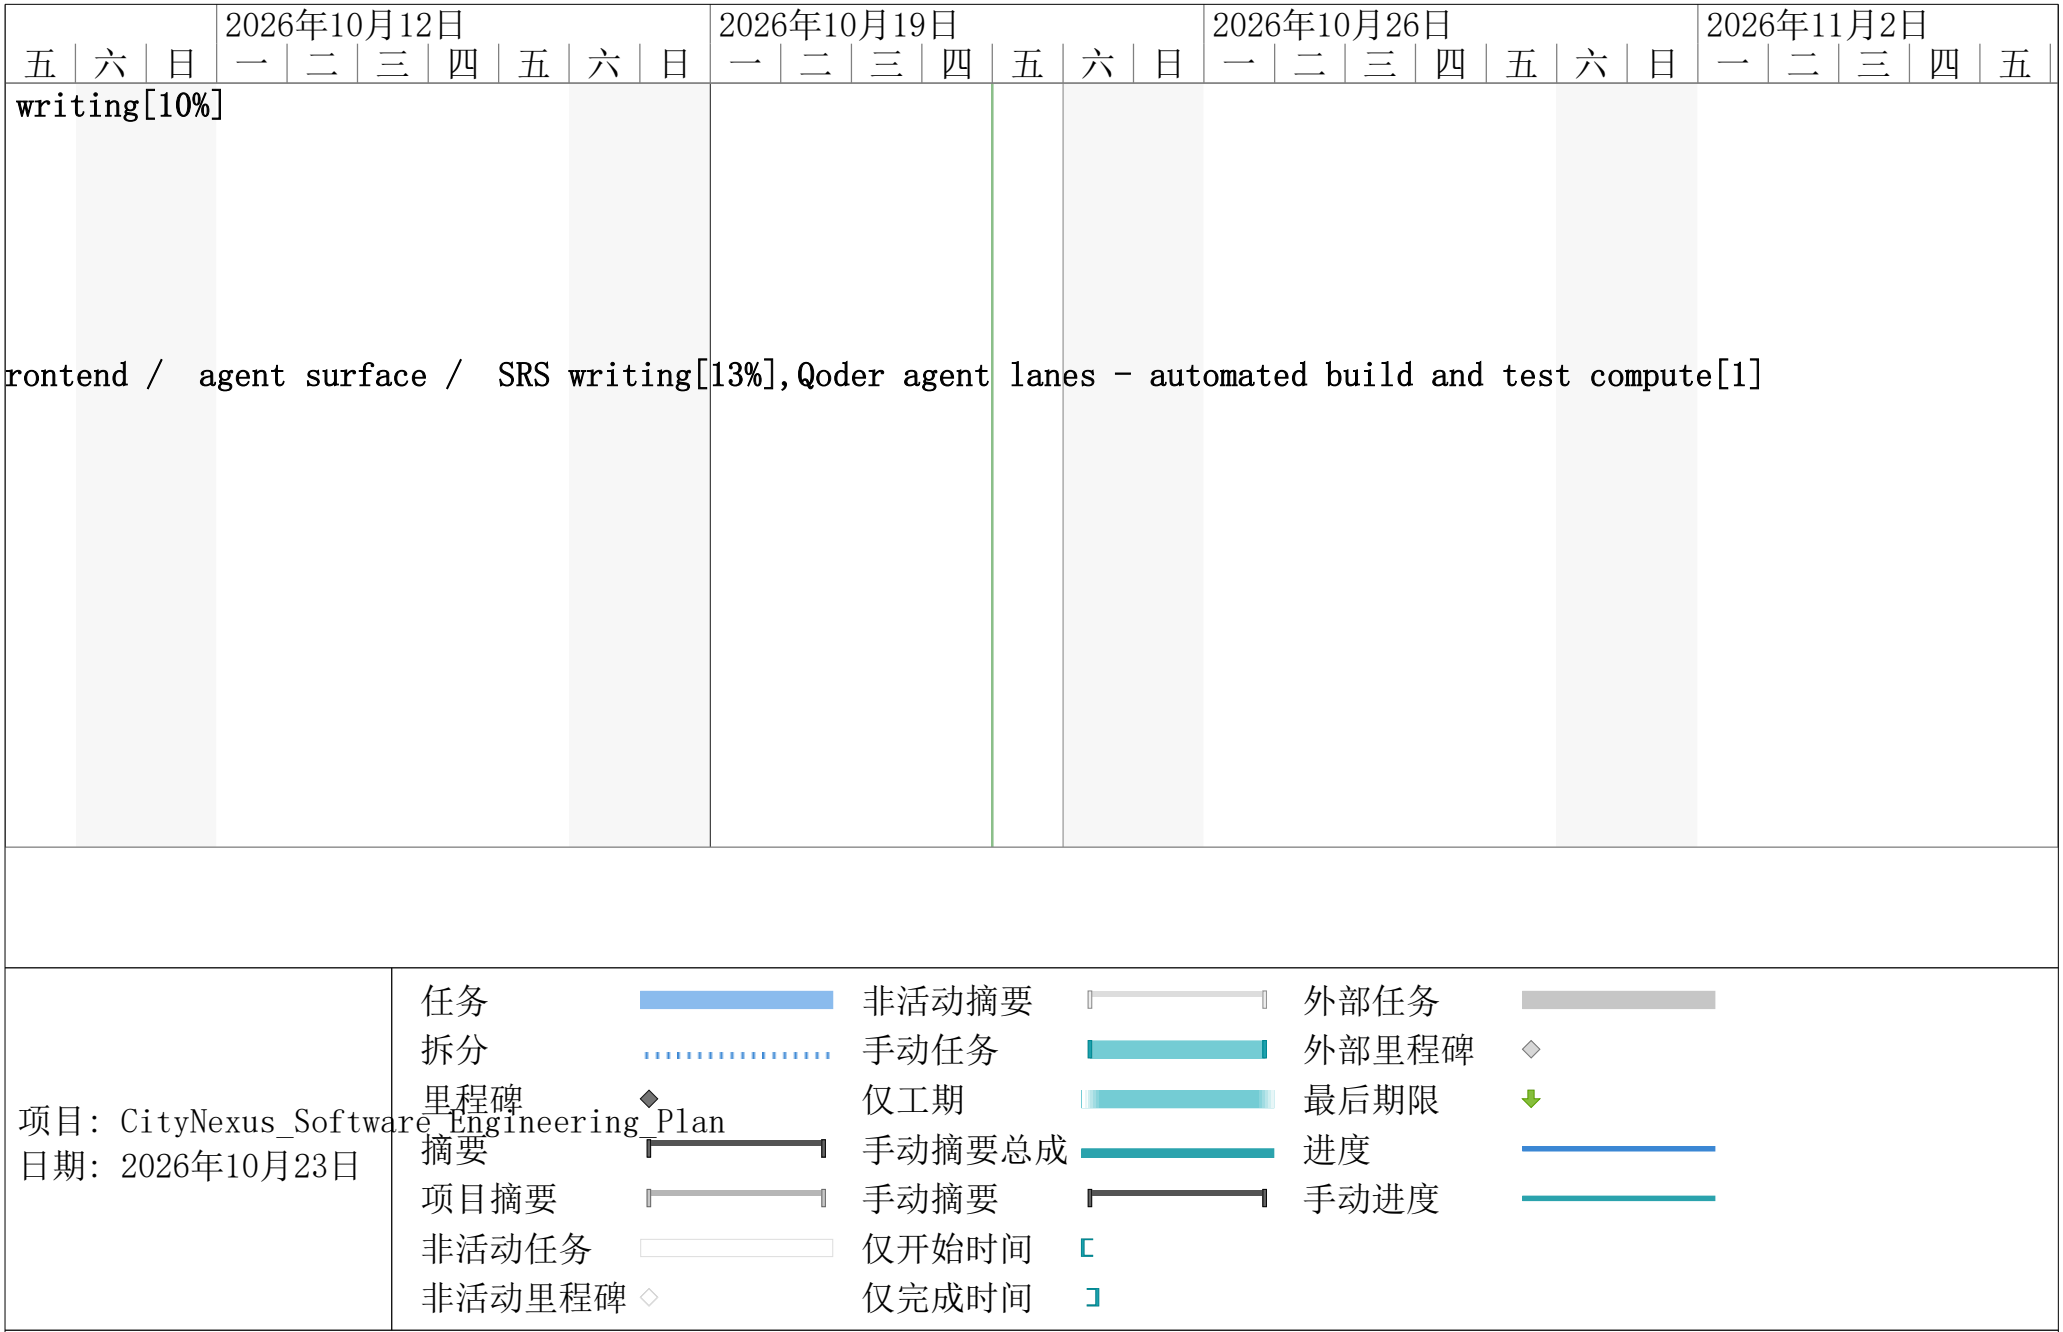

2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
writing[10%]
rontend / agent surface / SRS writing[13%],Qoder agent lanes - automated build and test compute[1]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

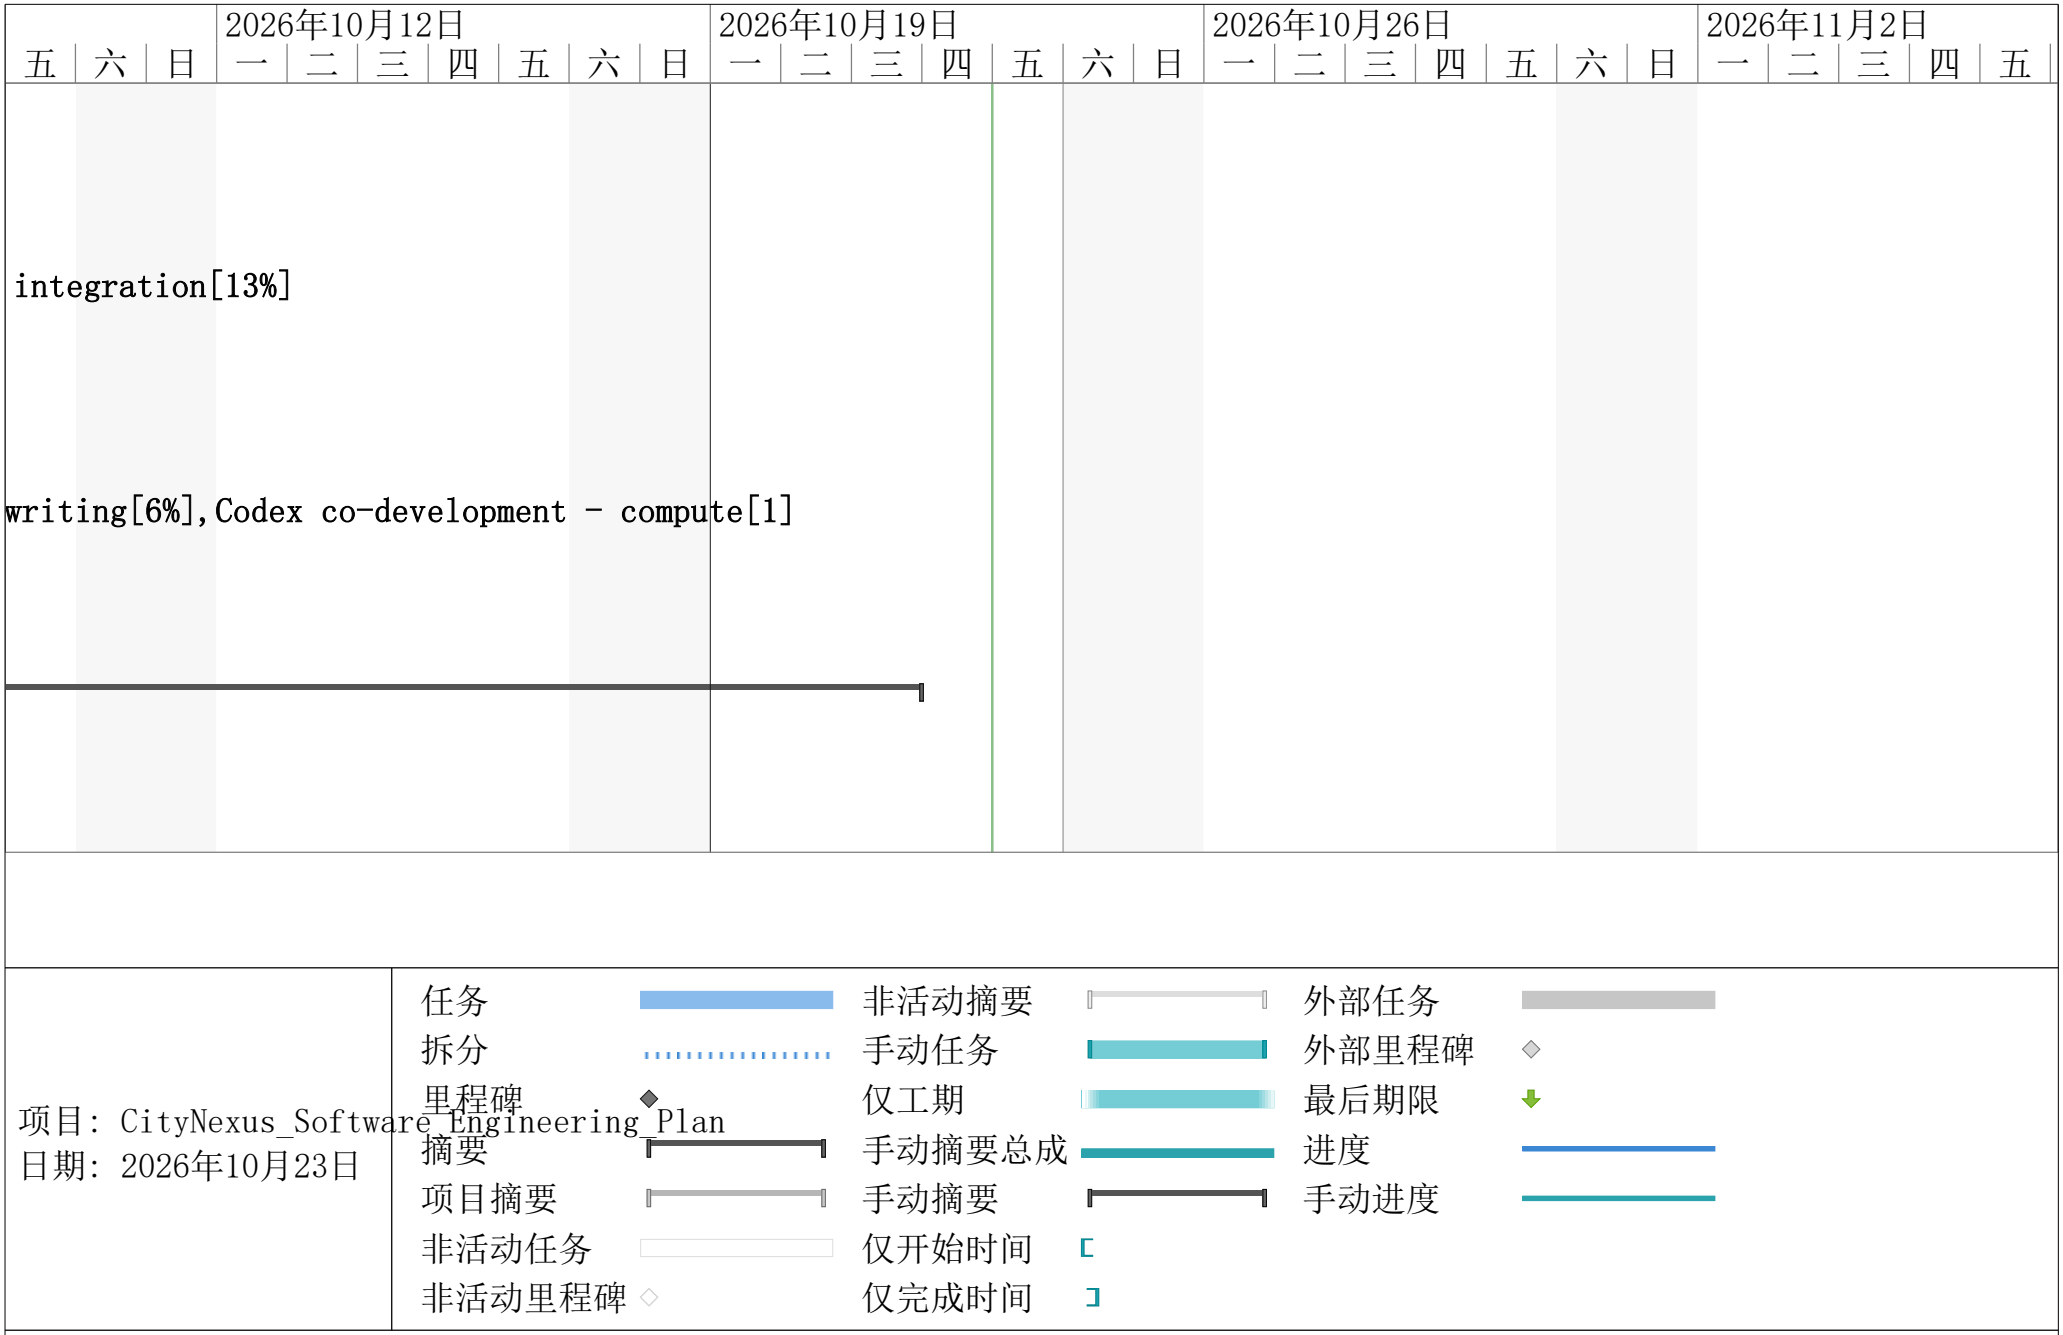
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
integration[13%]
writing[6%],Codex co-development - compute[1]
项目: CityNexus_Software Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

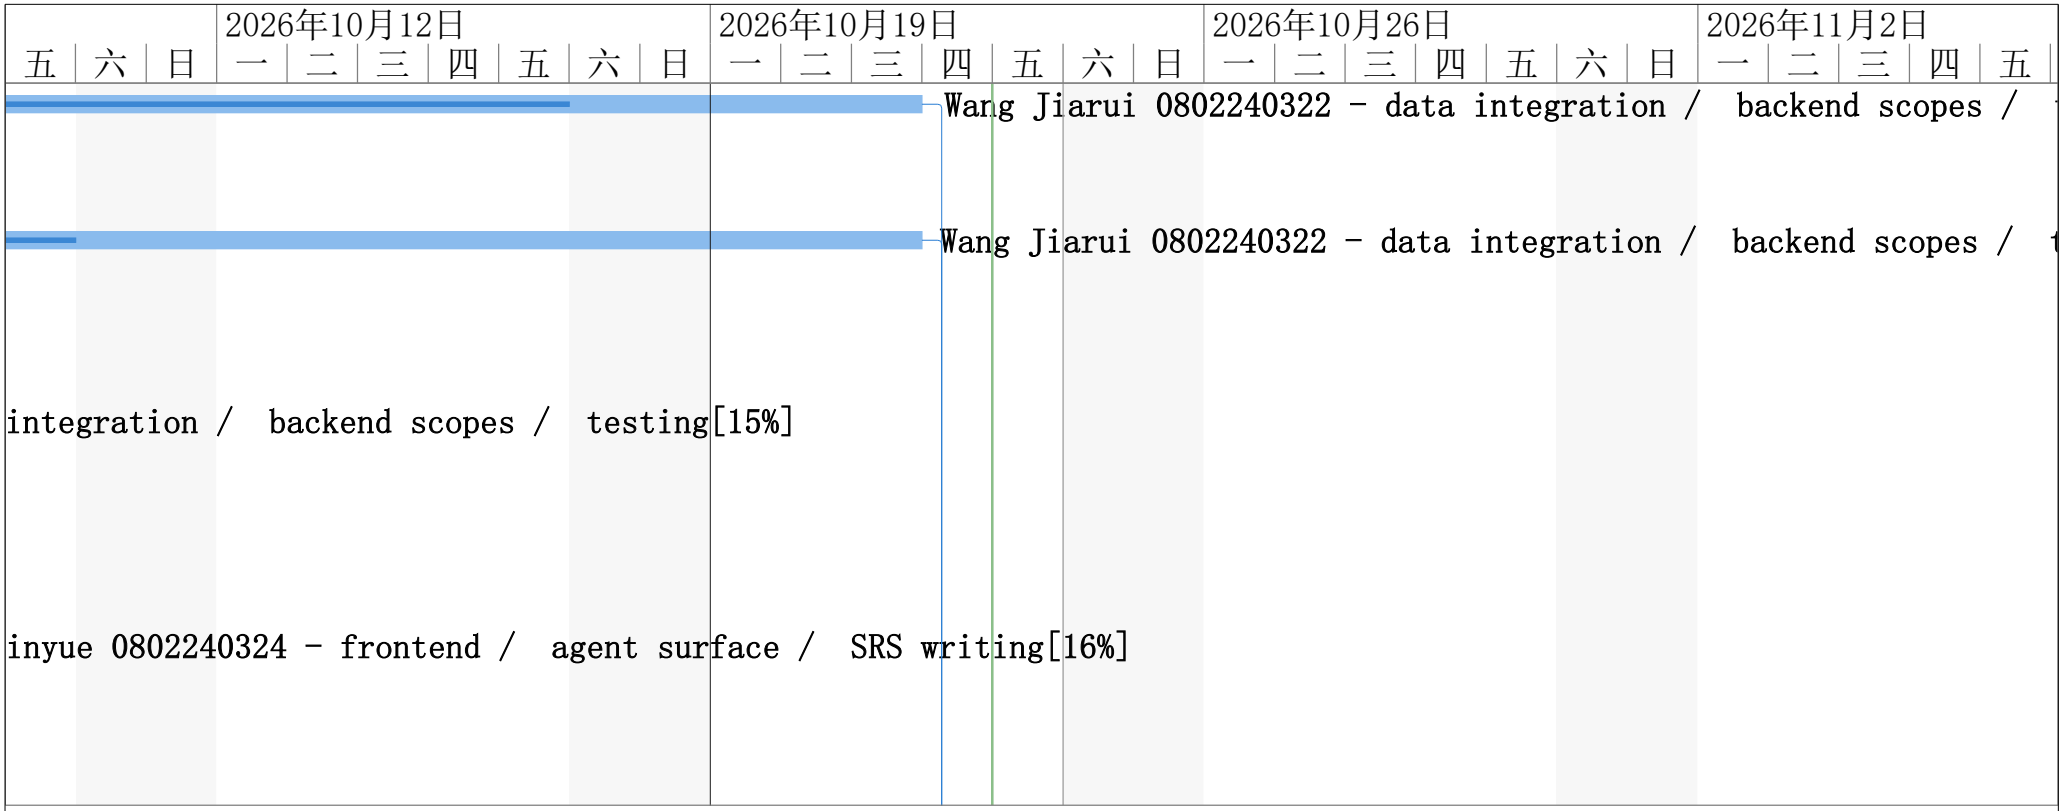

项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日


任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

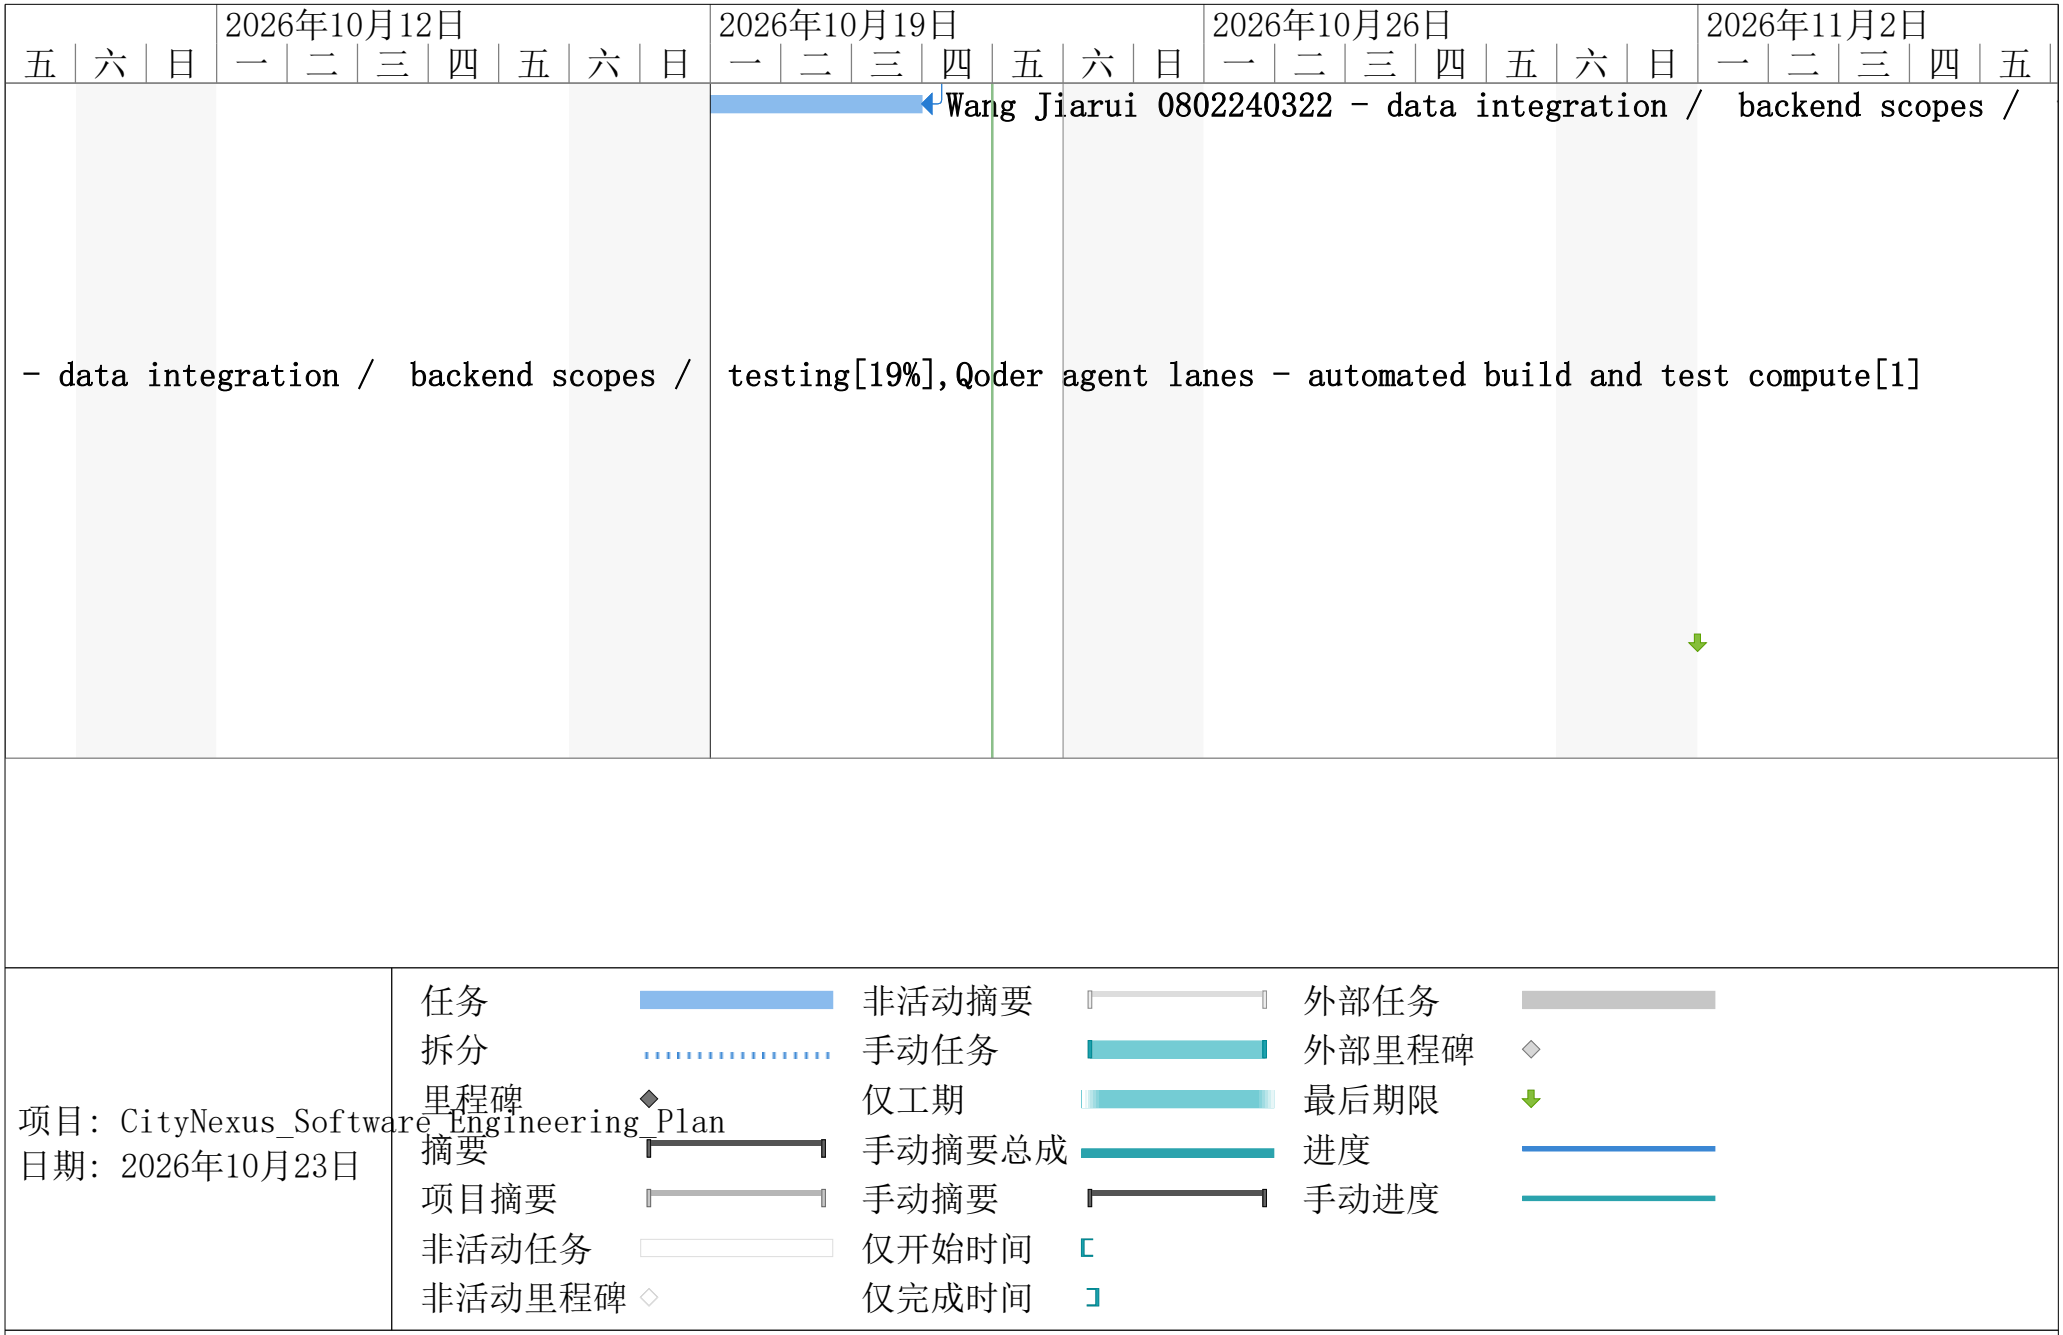
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五
Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes /
- data integration / backend scopes / testing[19%],Qoder agent lanes - automated build and test compute[1]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

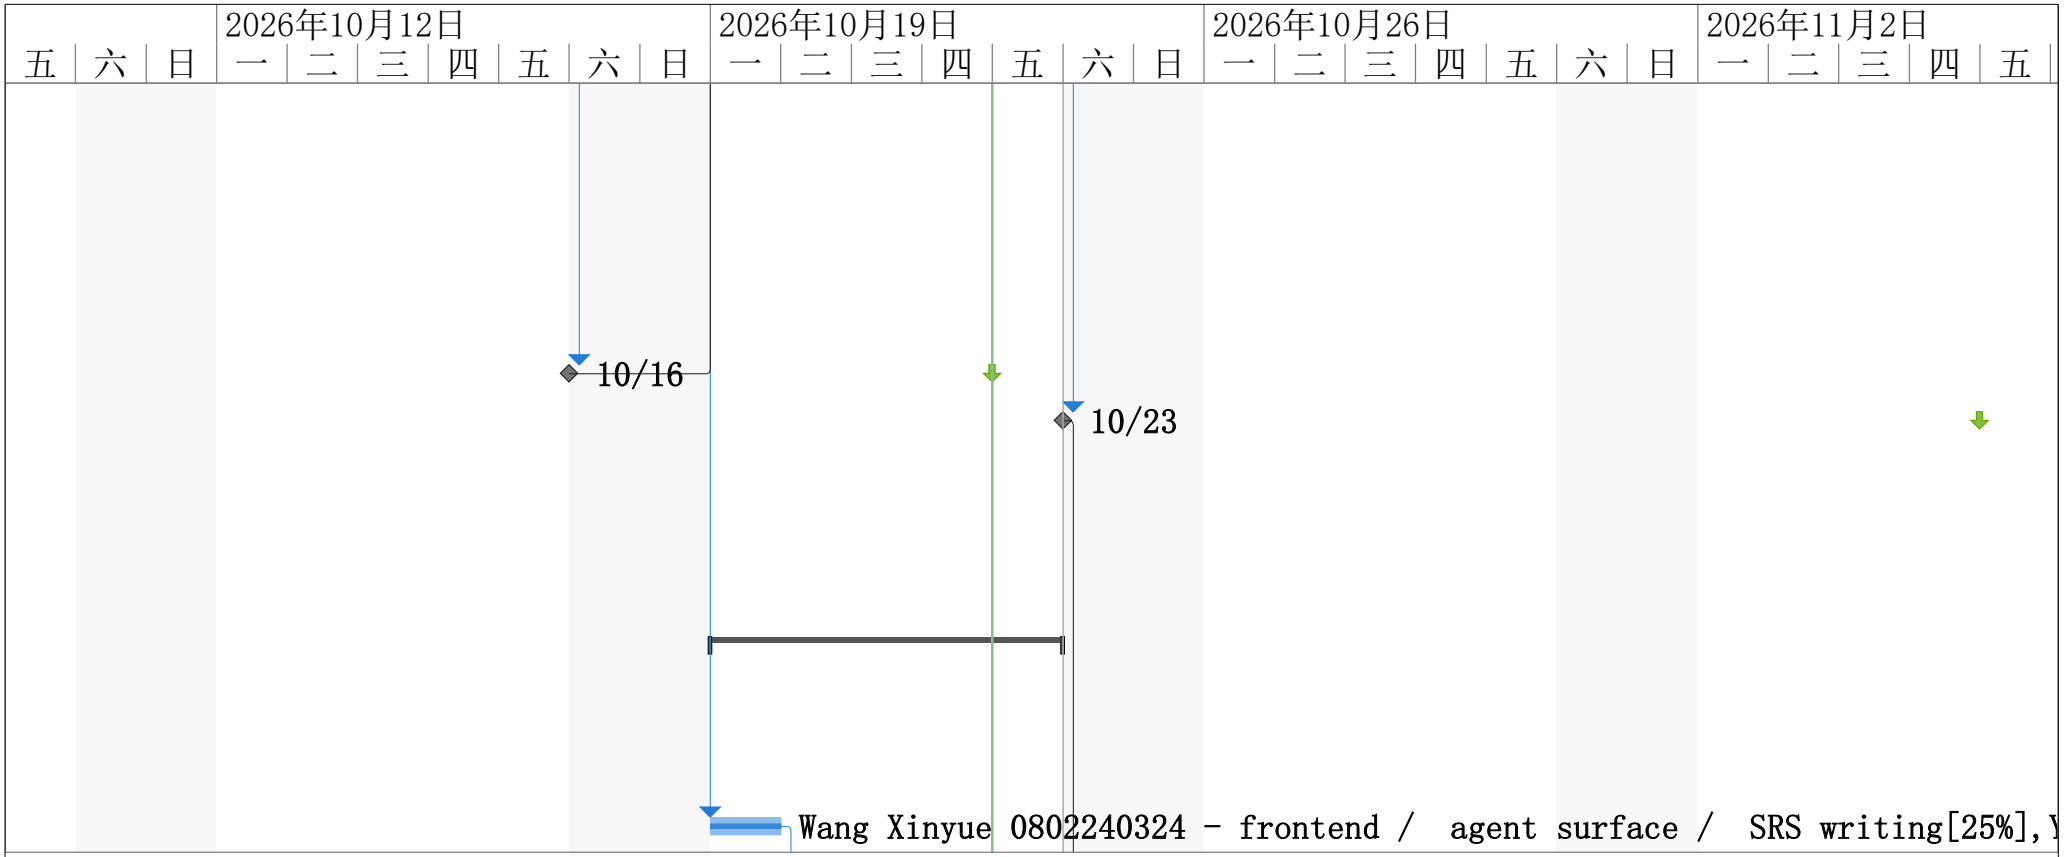

项目：CityNexus_Software Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

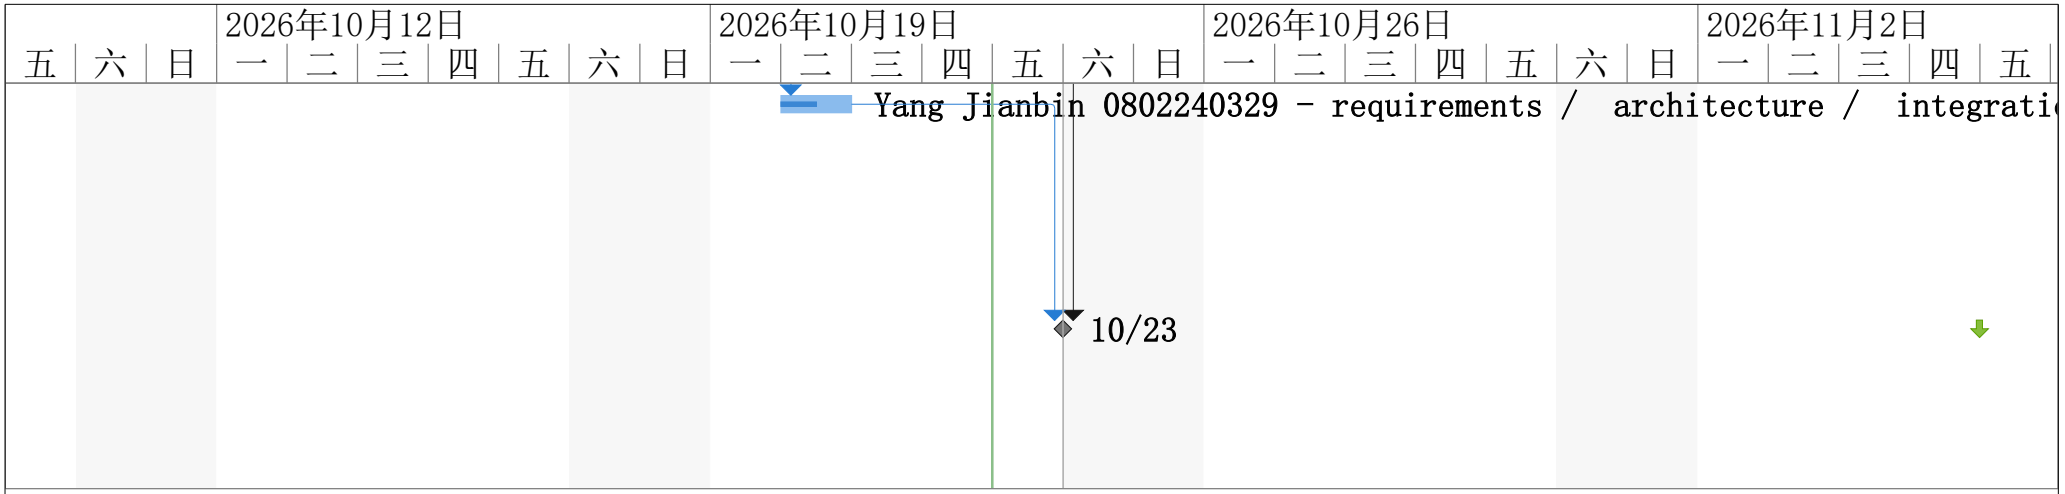

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

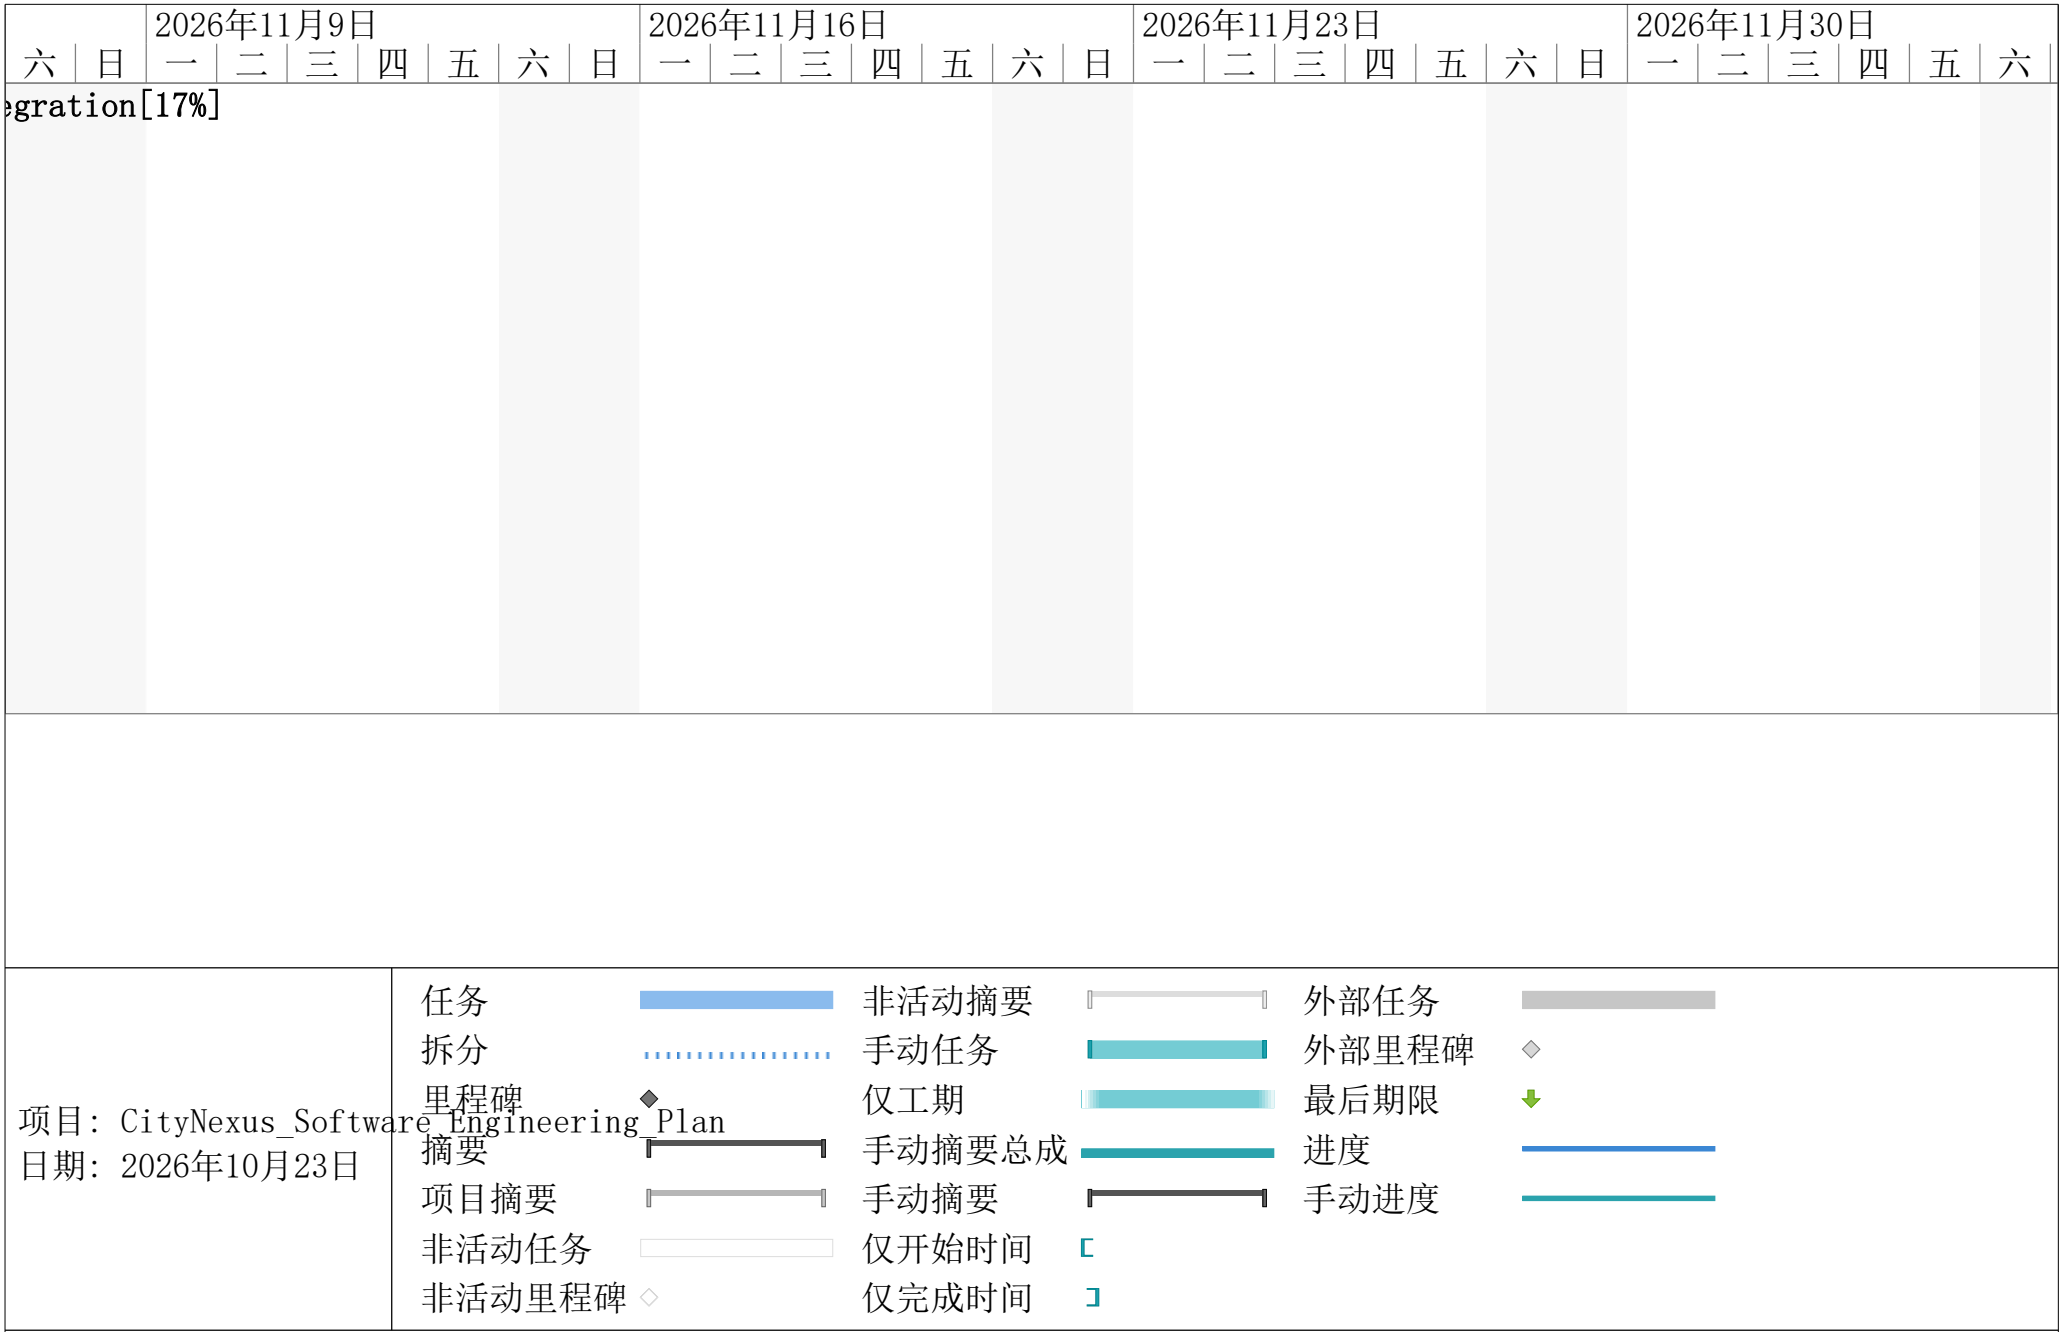
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
egration[17%]
项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

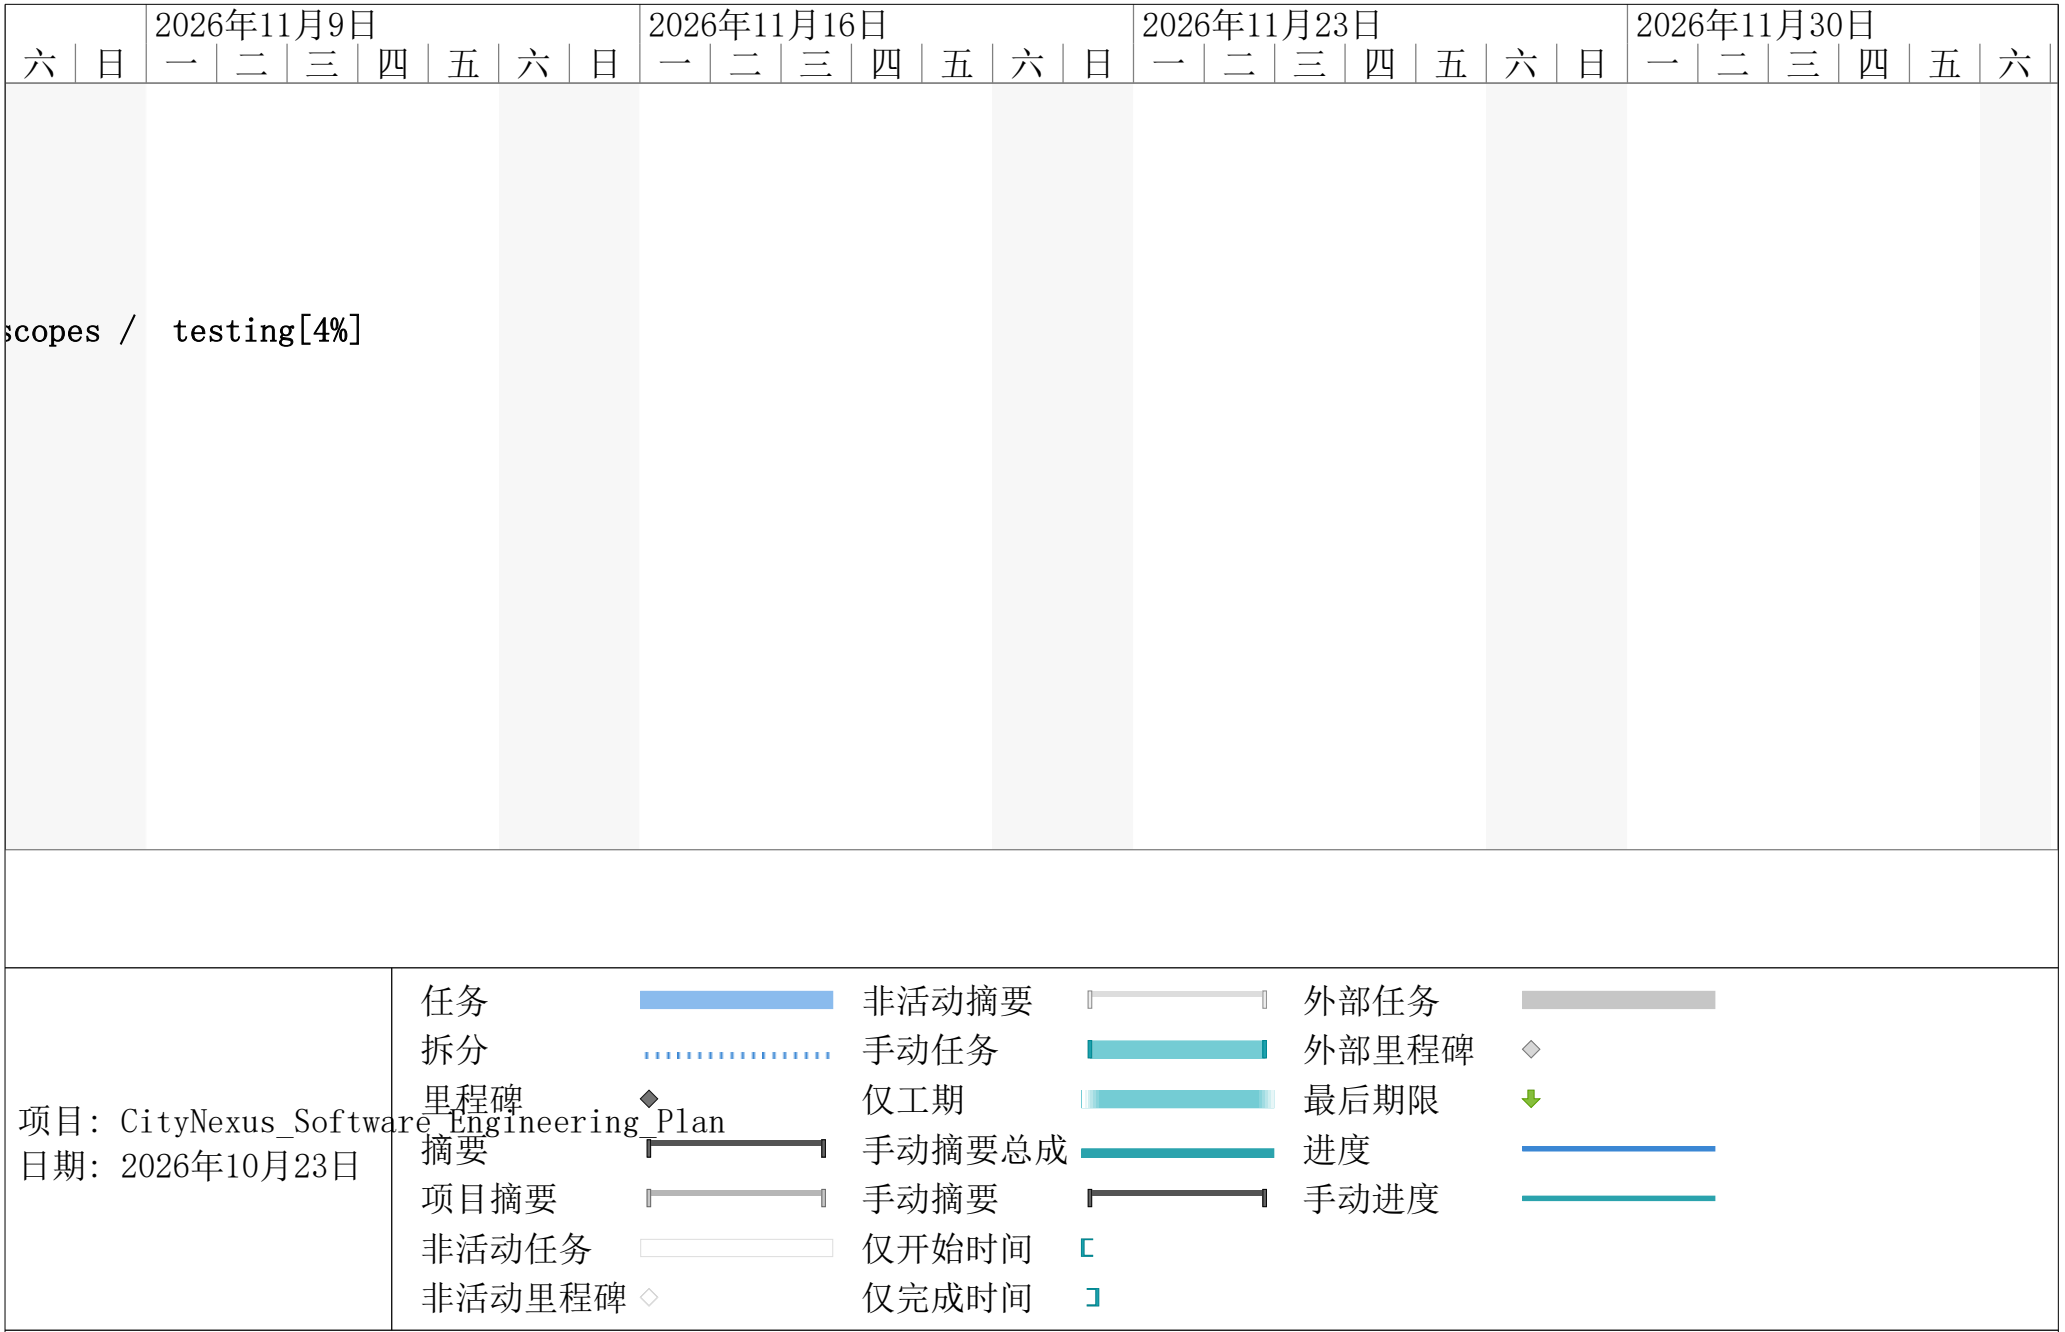
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
scopes / testing[4%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

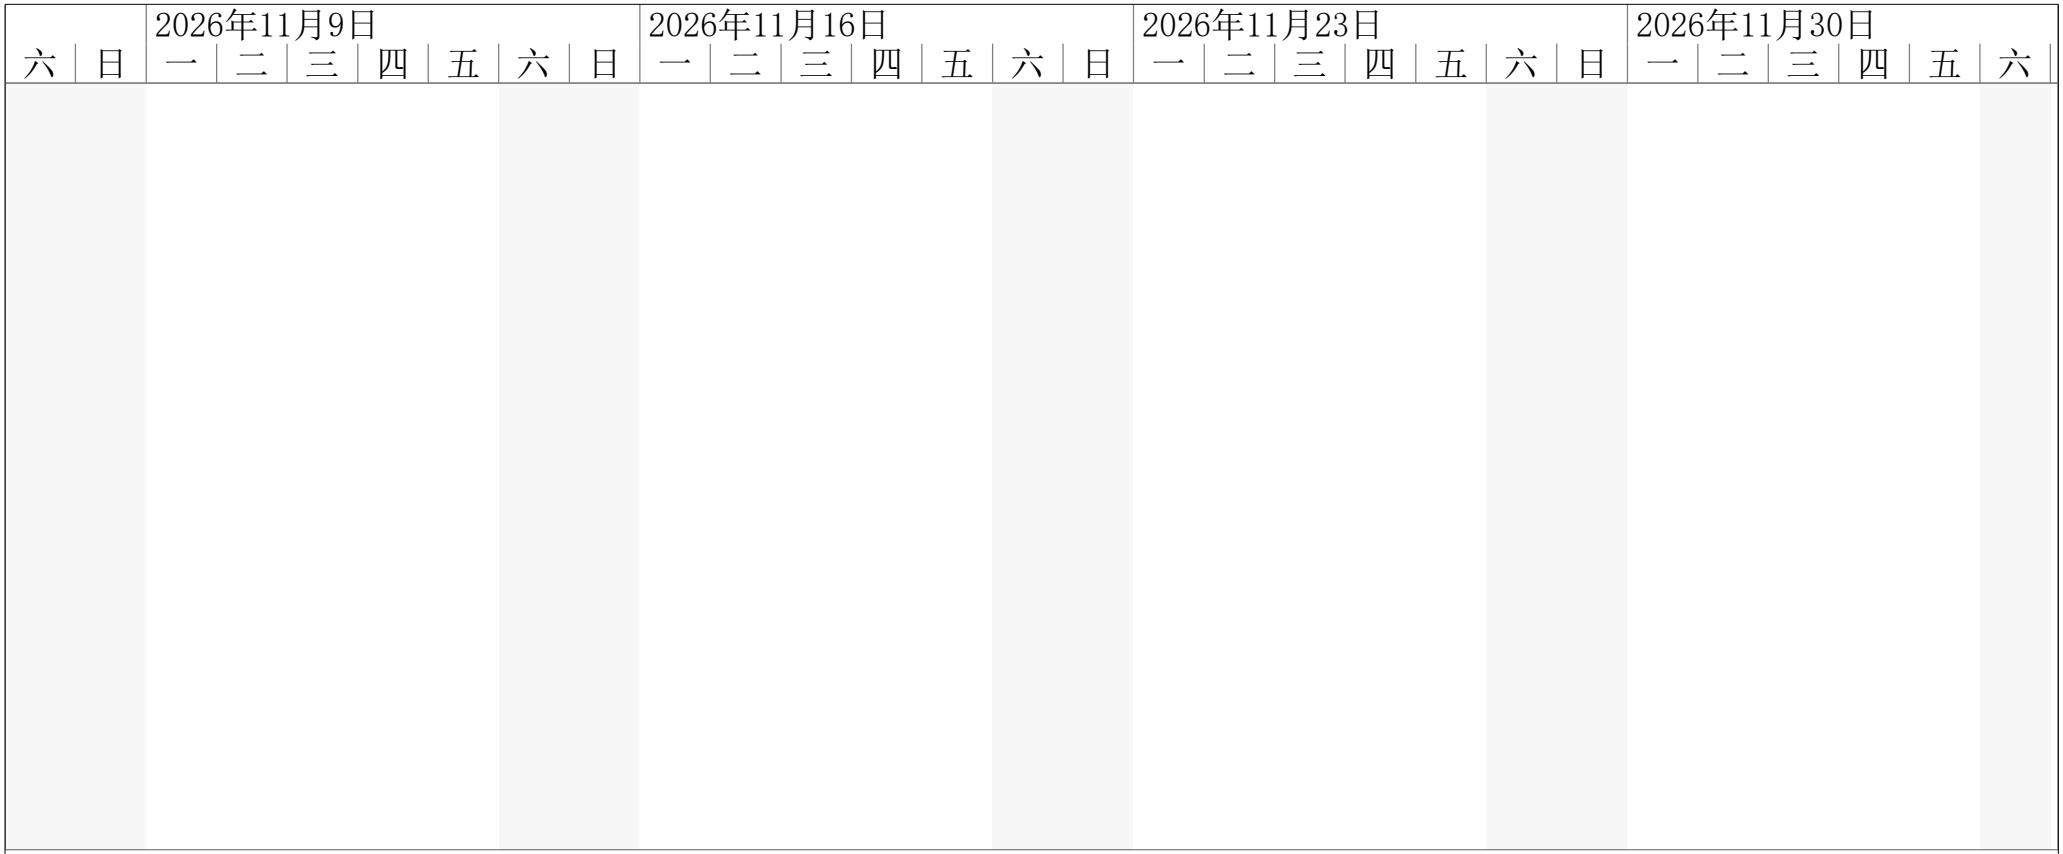


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

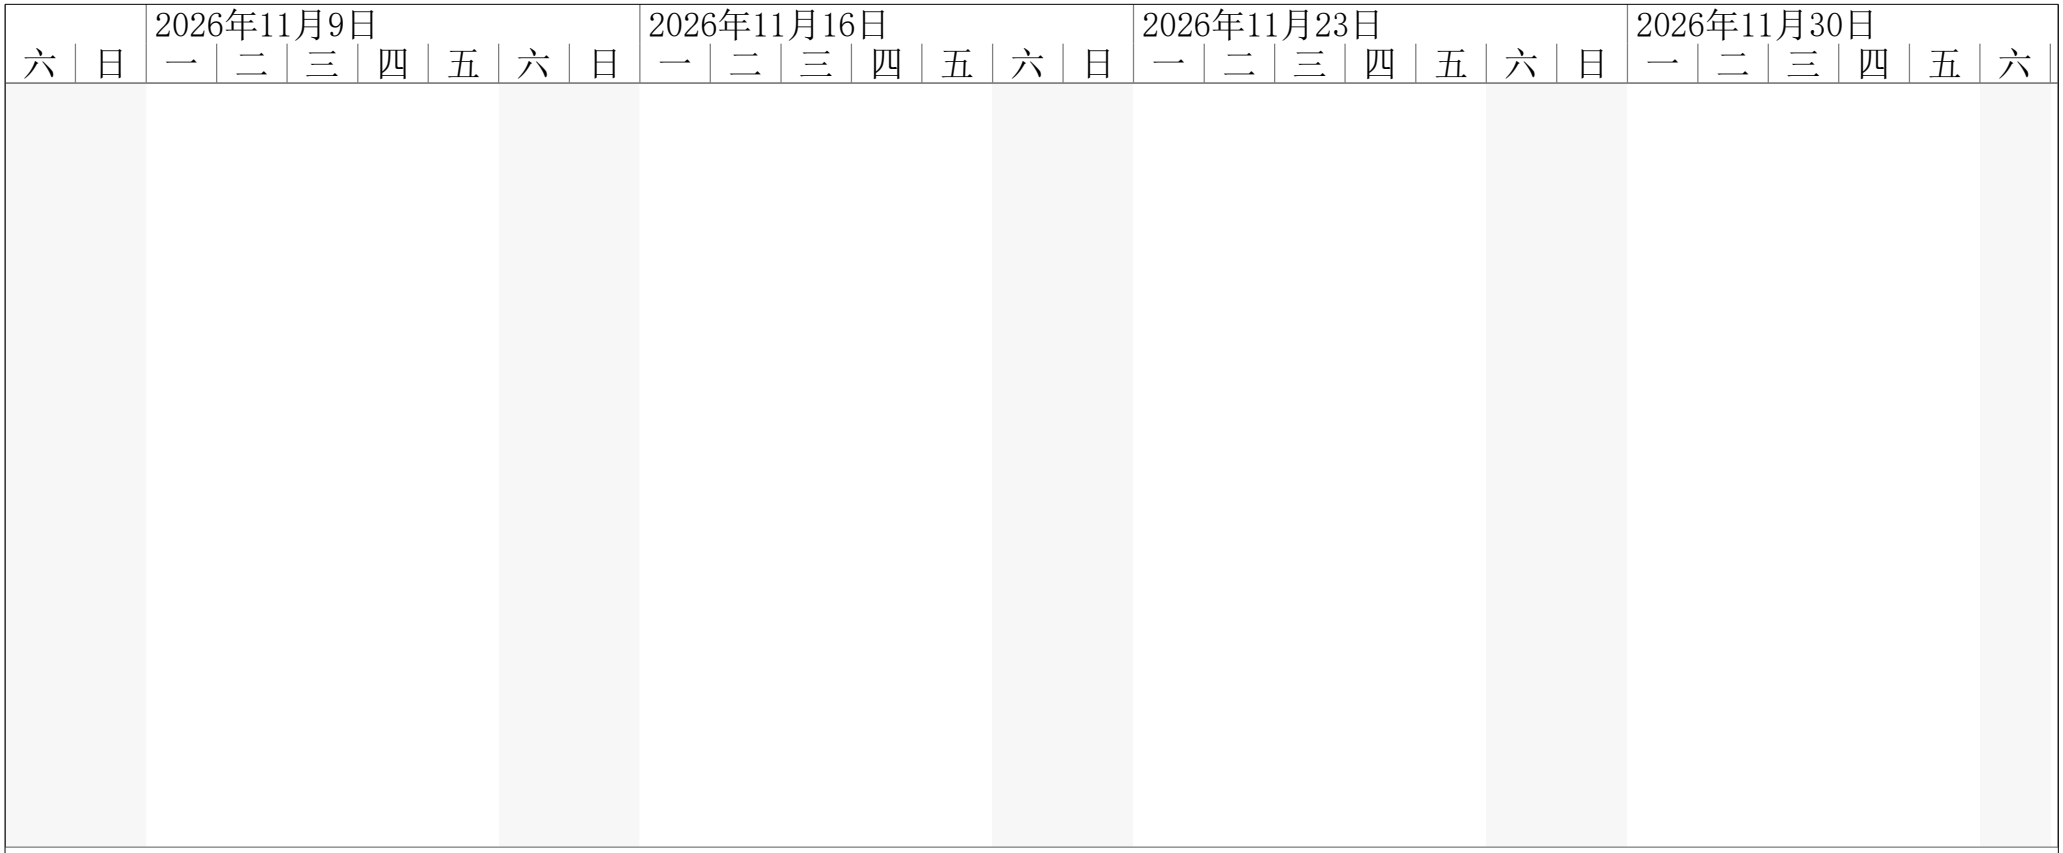


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

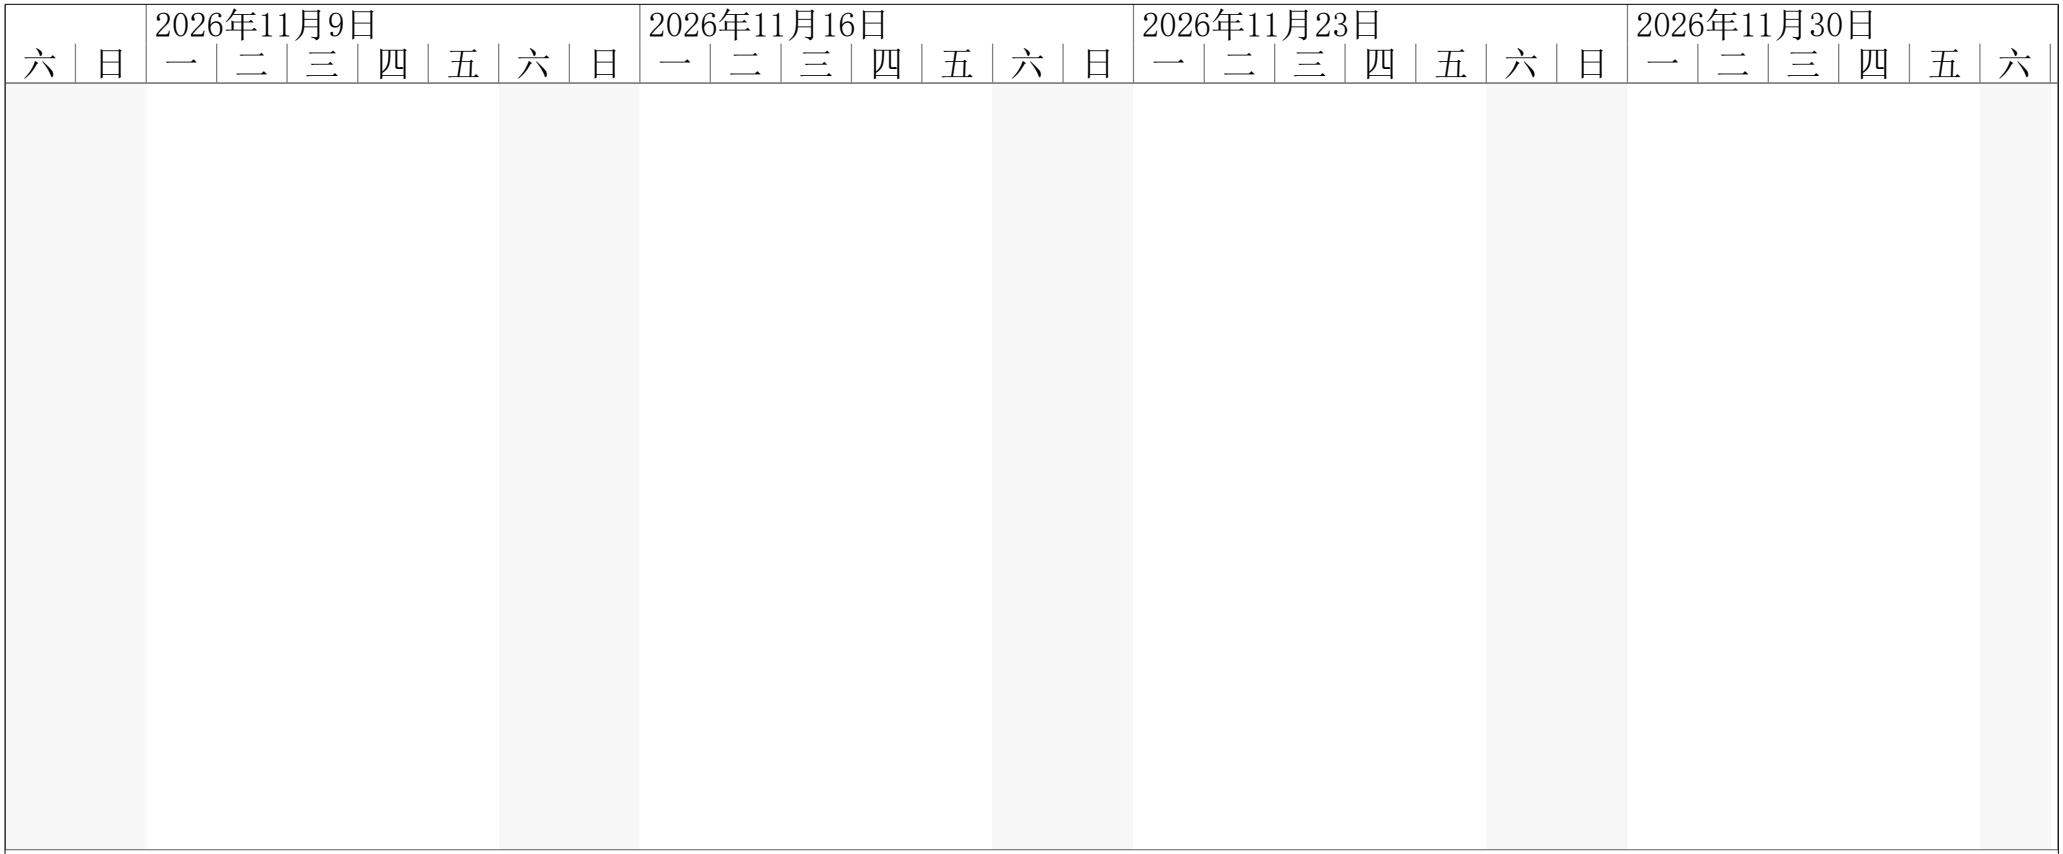

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

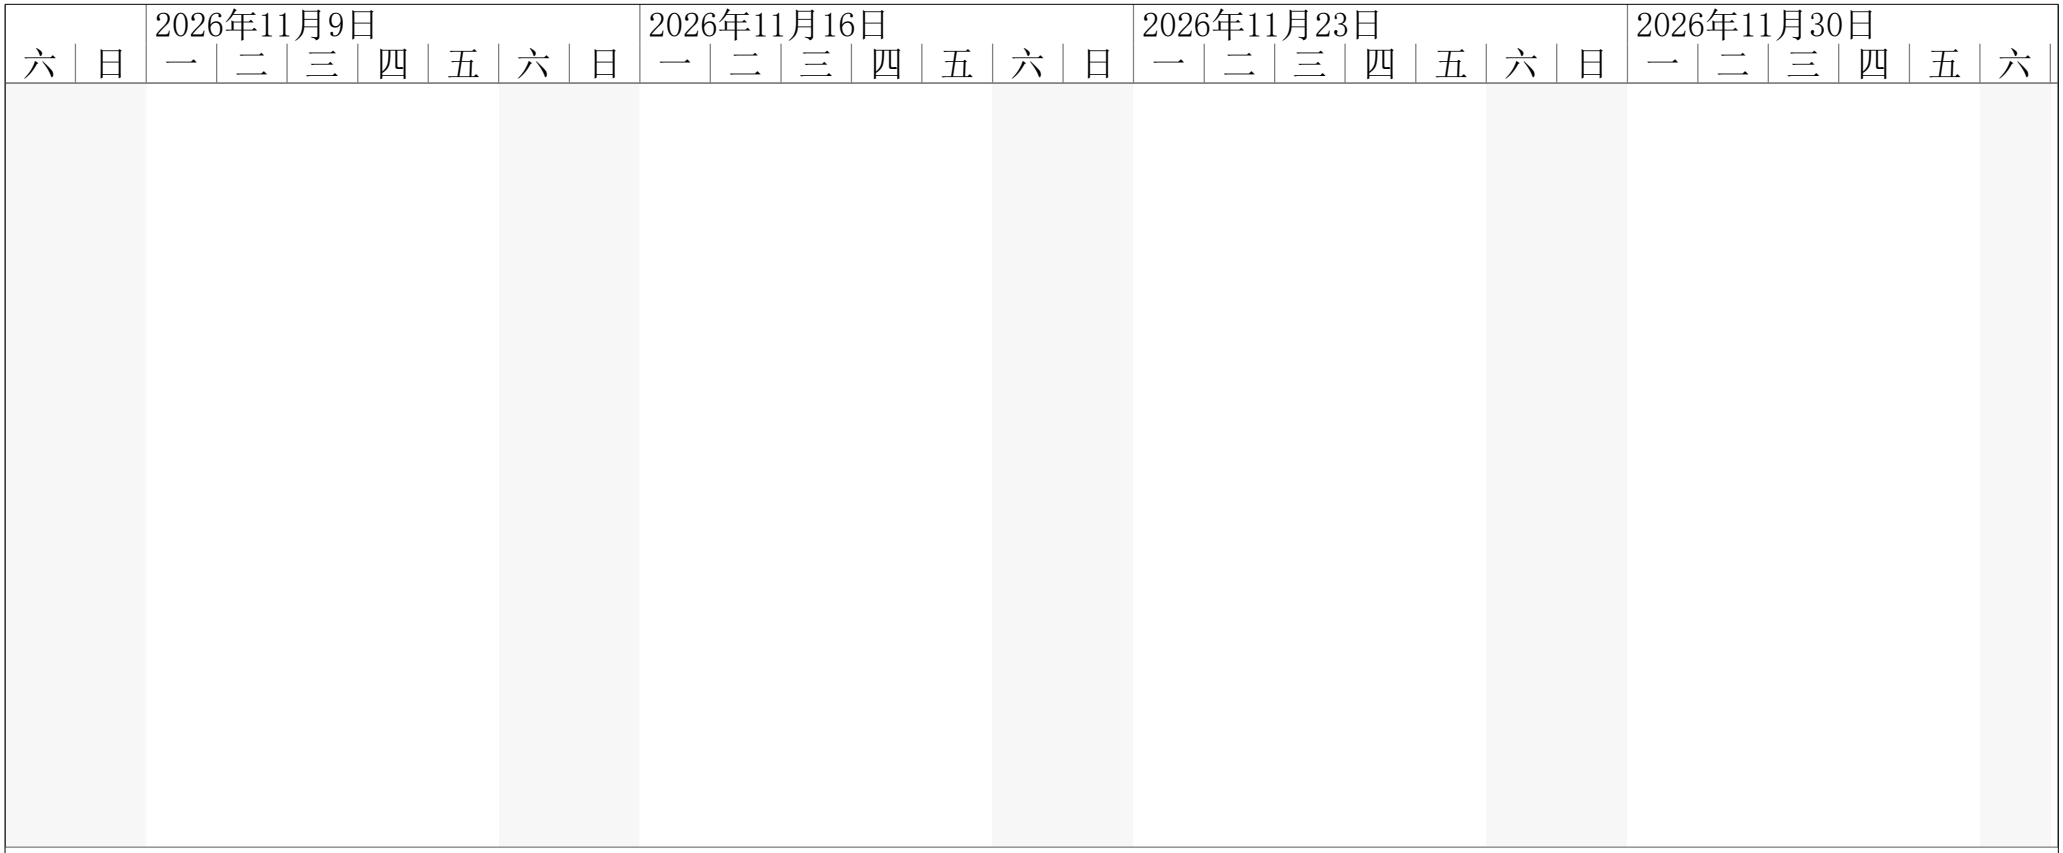


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度





项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日


任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

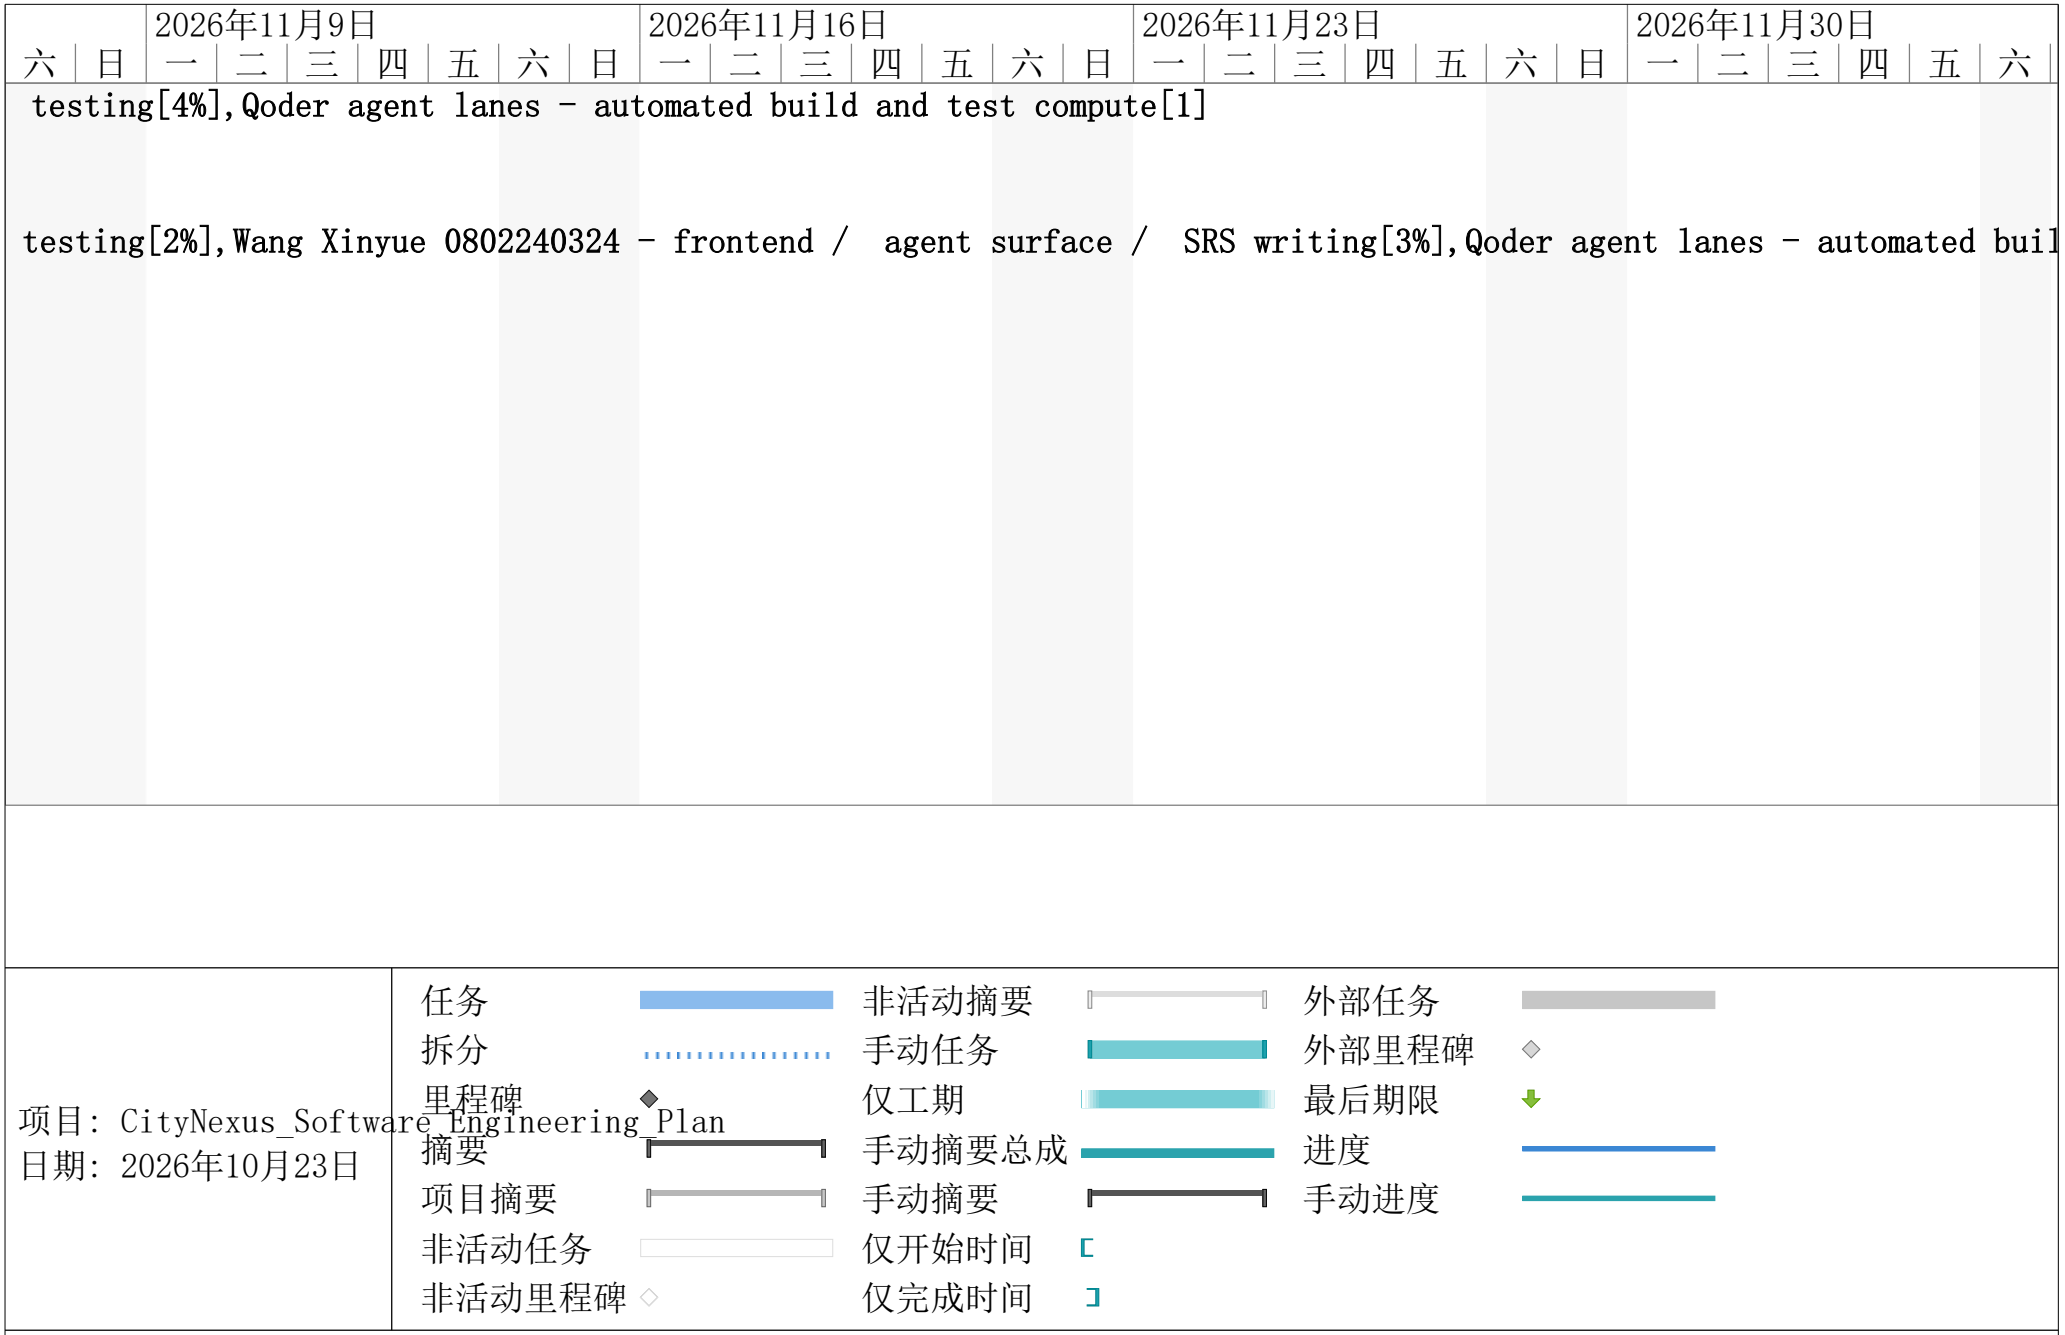

2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
testing[4%],Qoder agent lanes - automated build and test compute[1]
testing[2%],Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[3%],Qoder agent lanes - automated bui
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

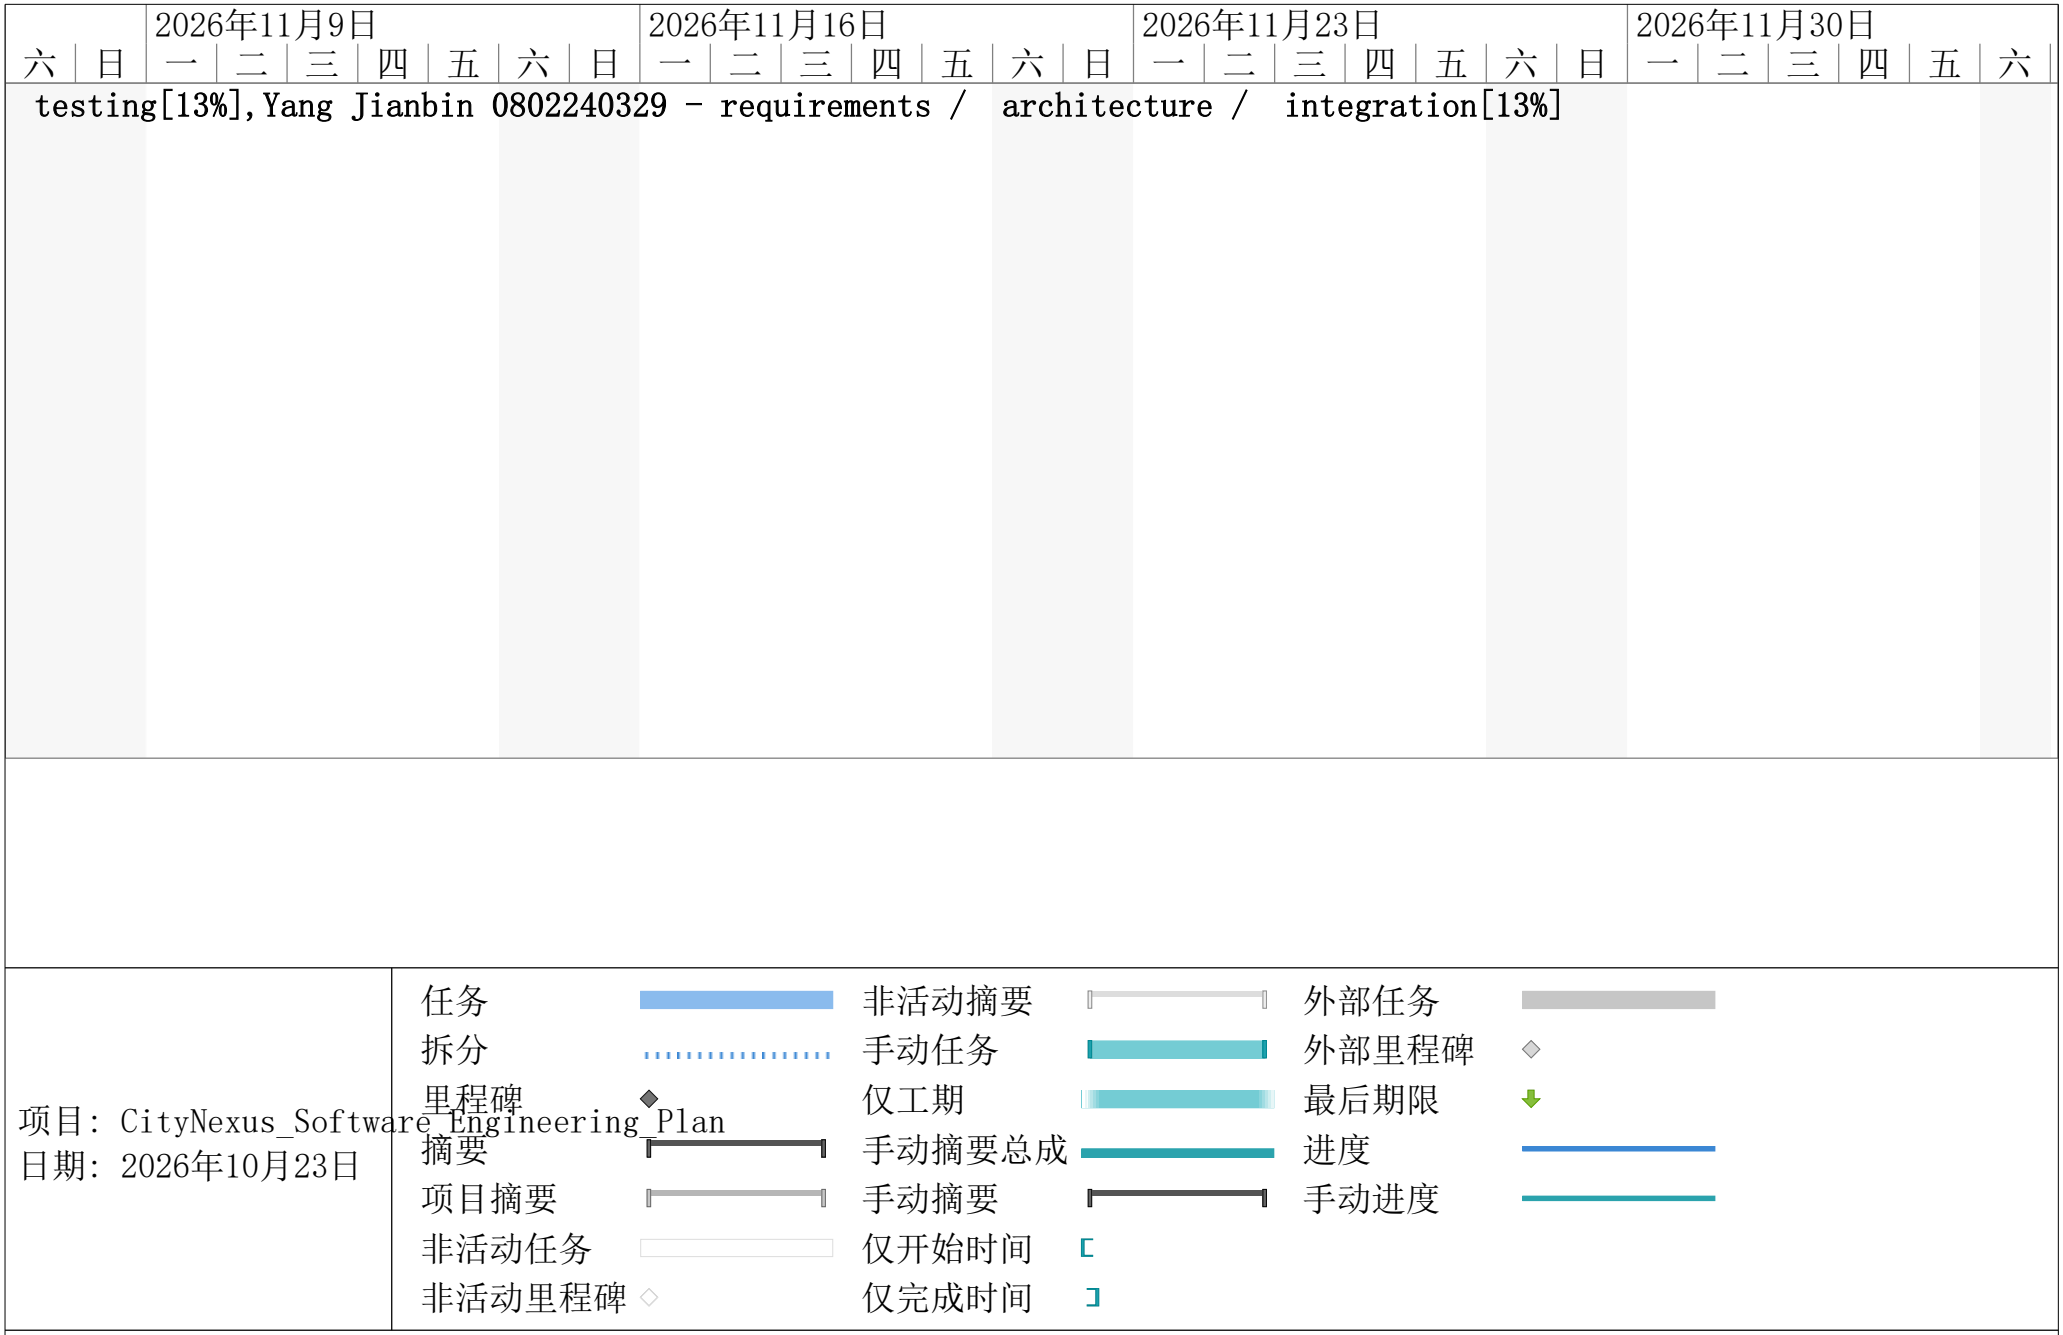
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
testing[13%],Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[13%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

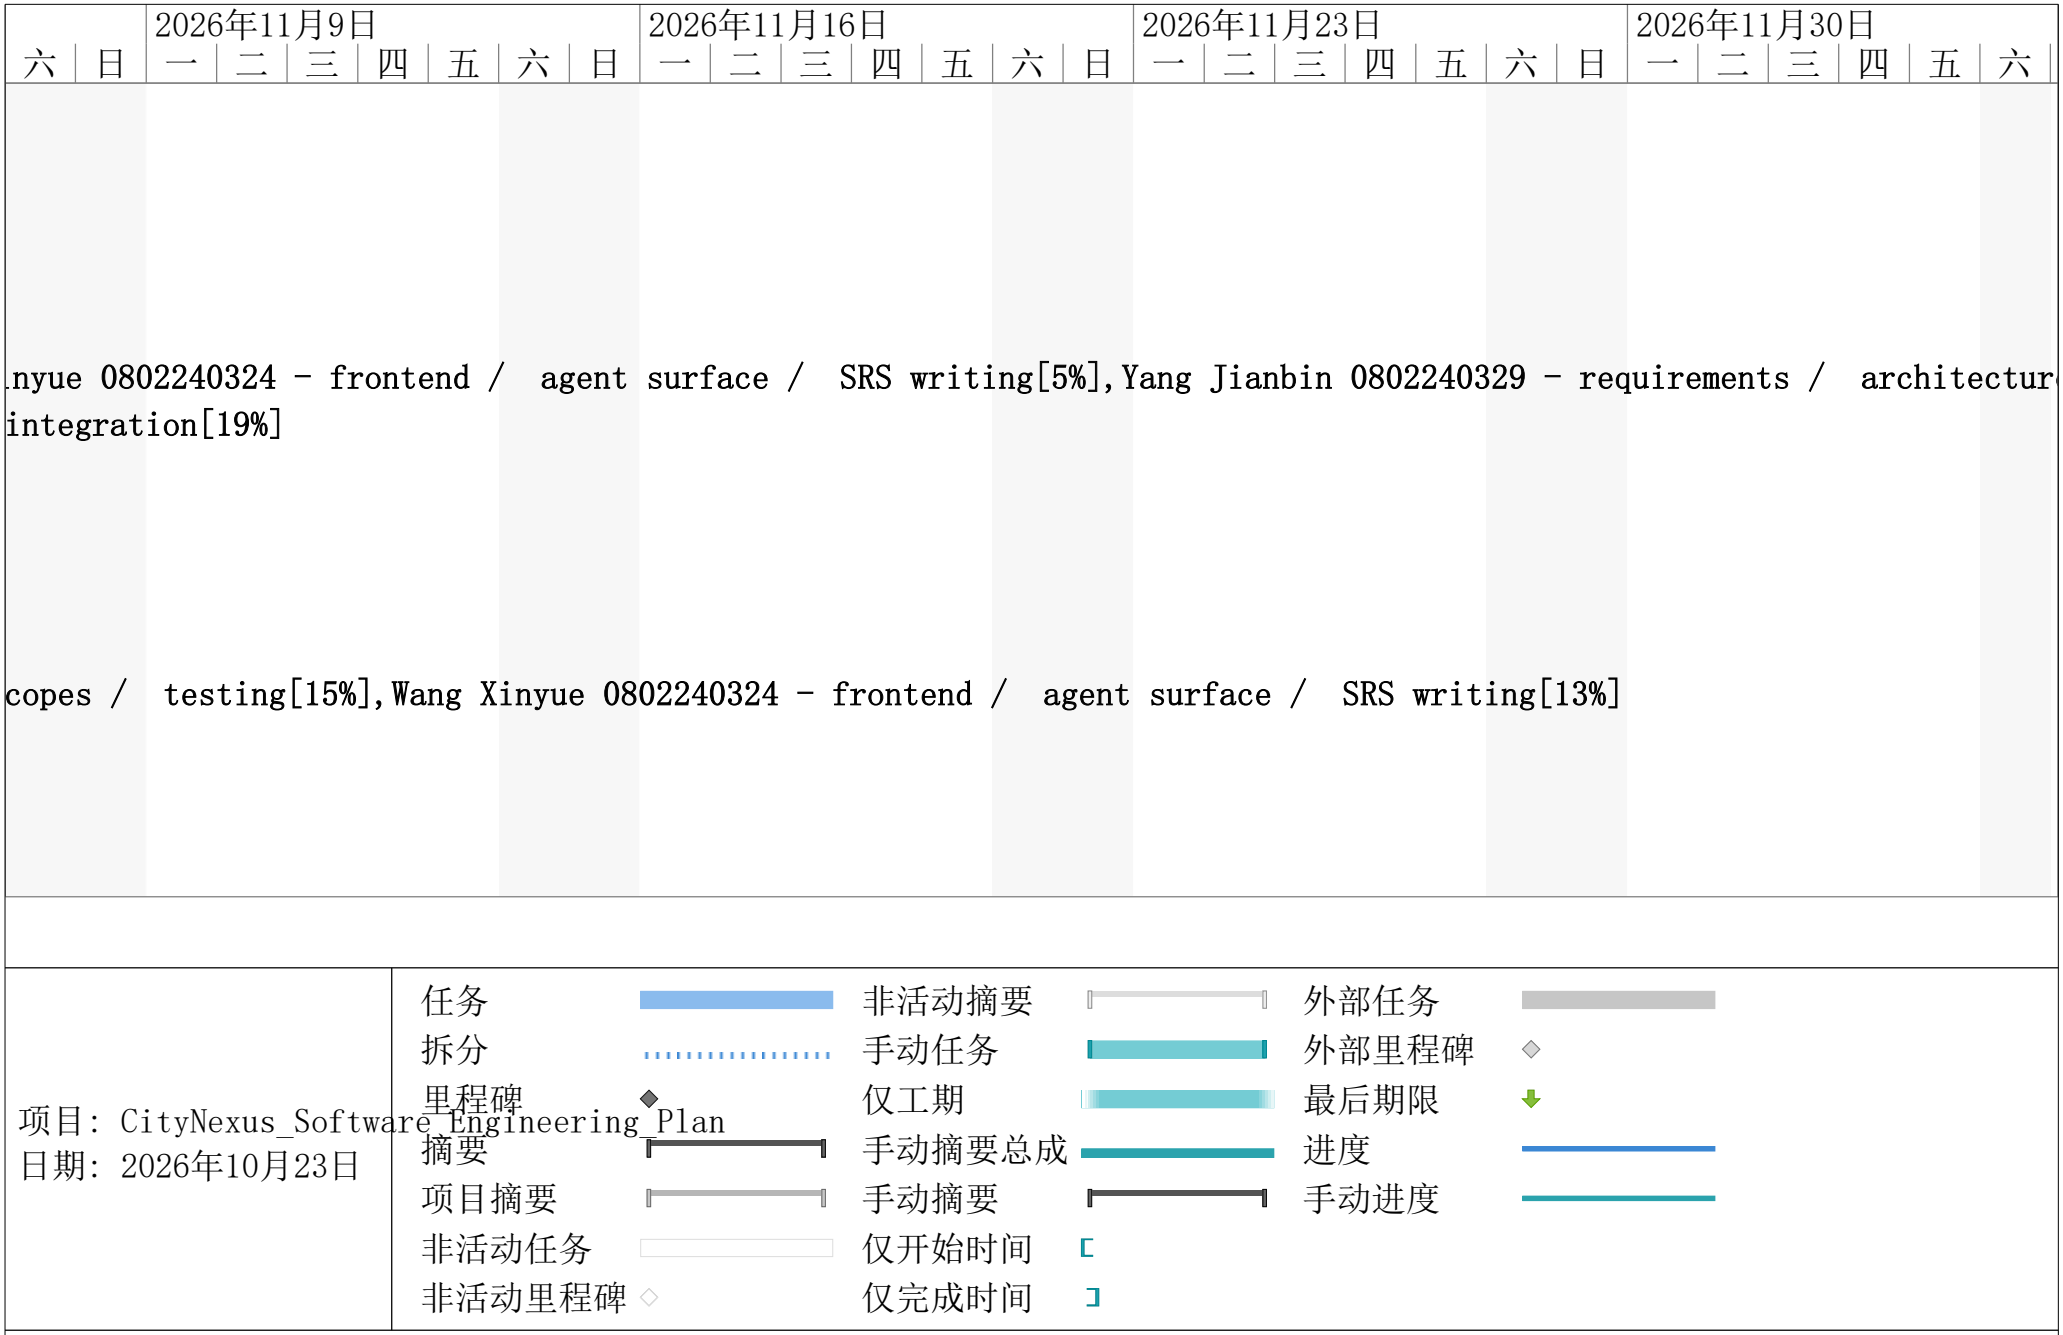
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
nyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[5%],Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architectur
integration[19%]
copes / testing[15%],Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[13%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

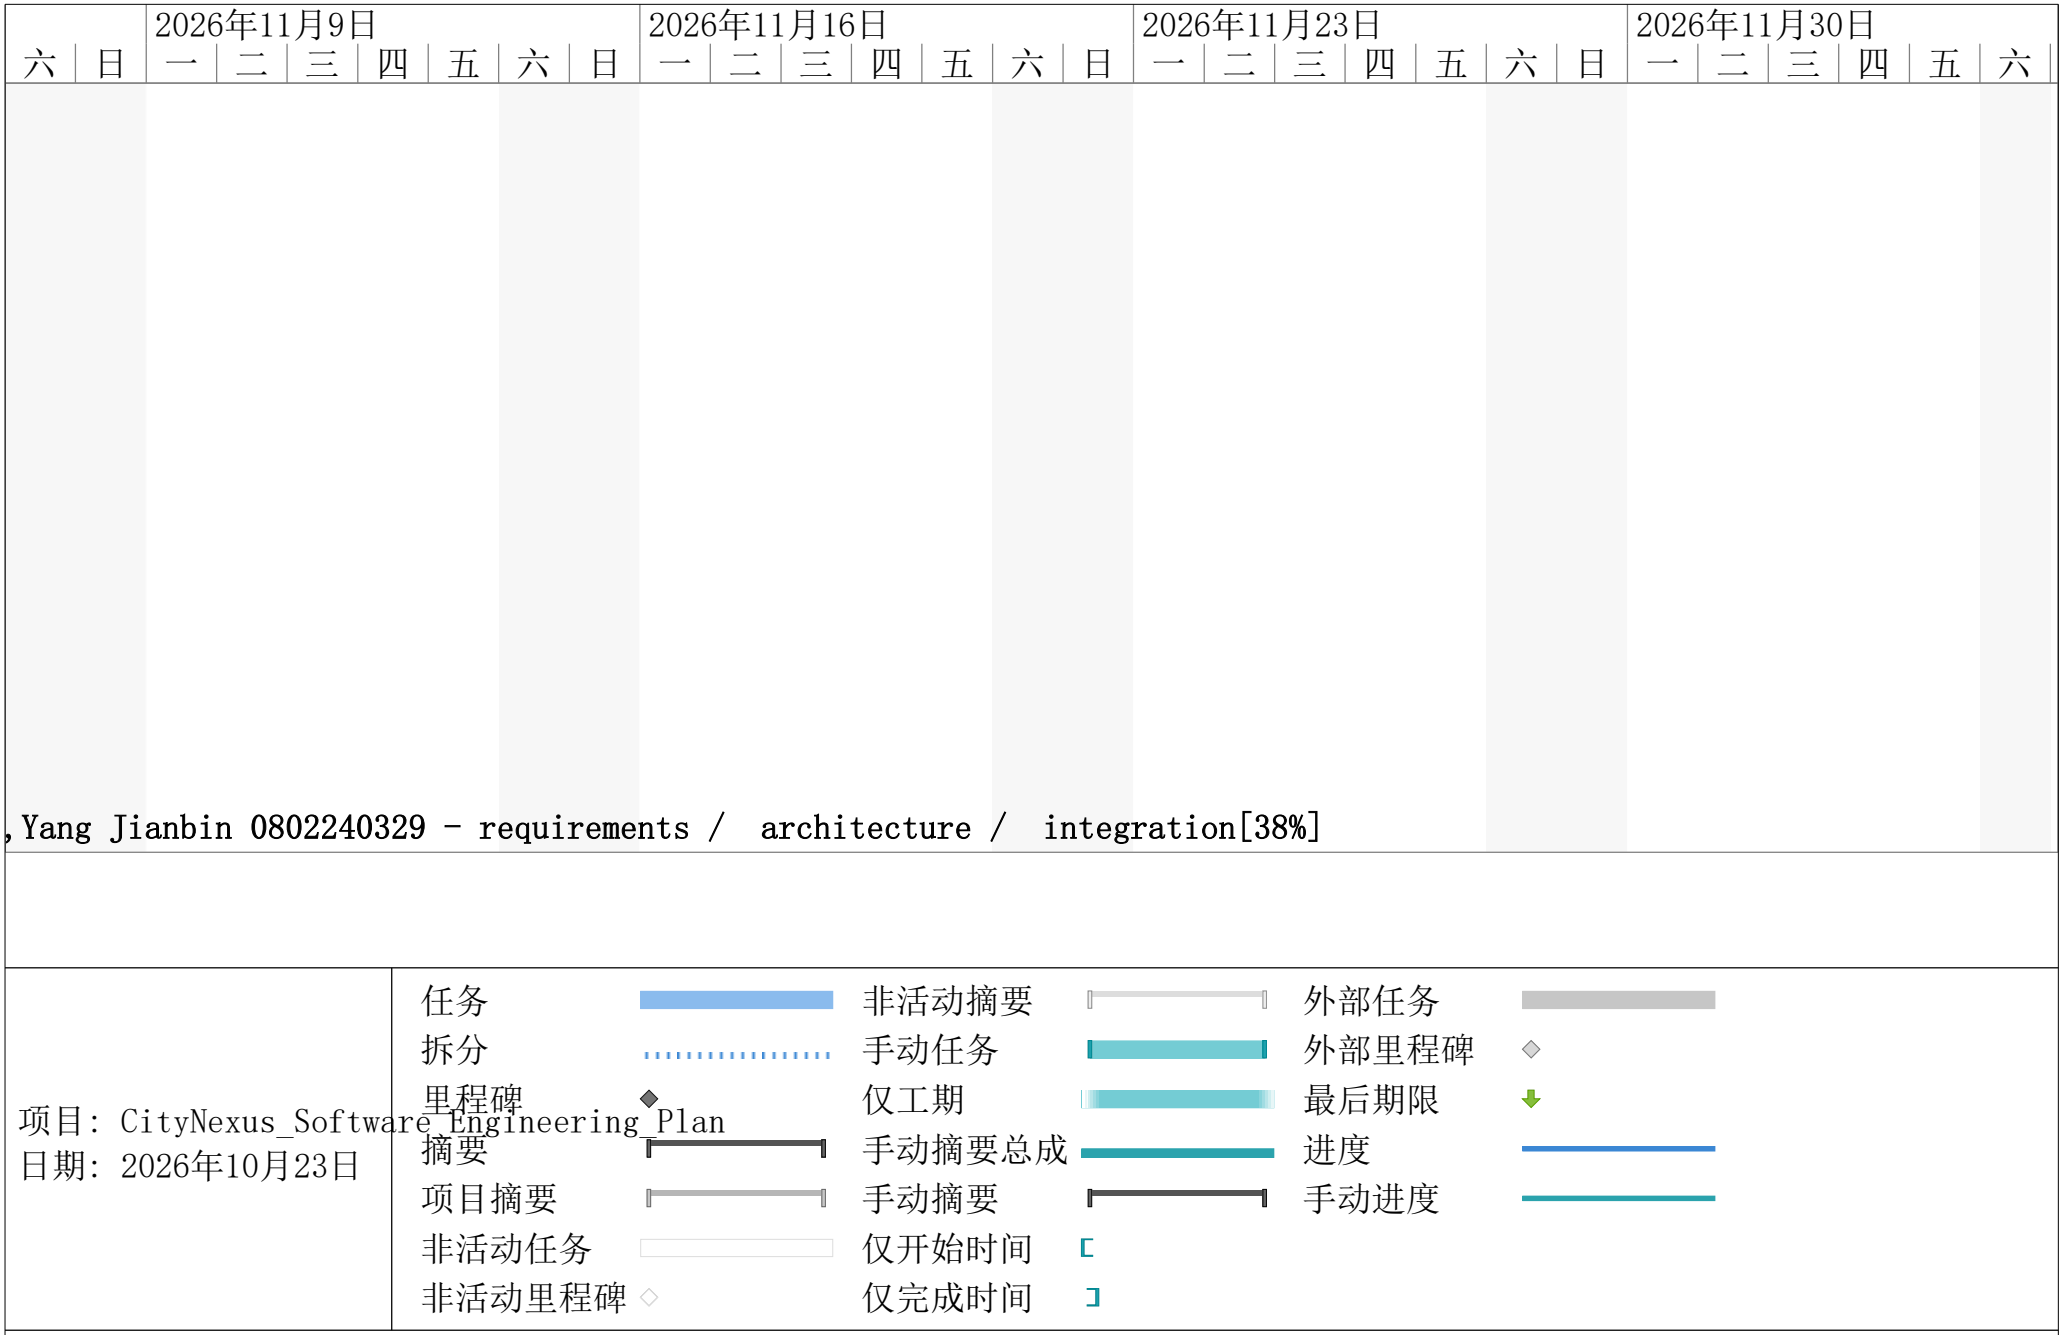
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
,Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration[38%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

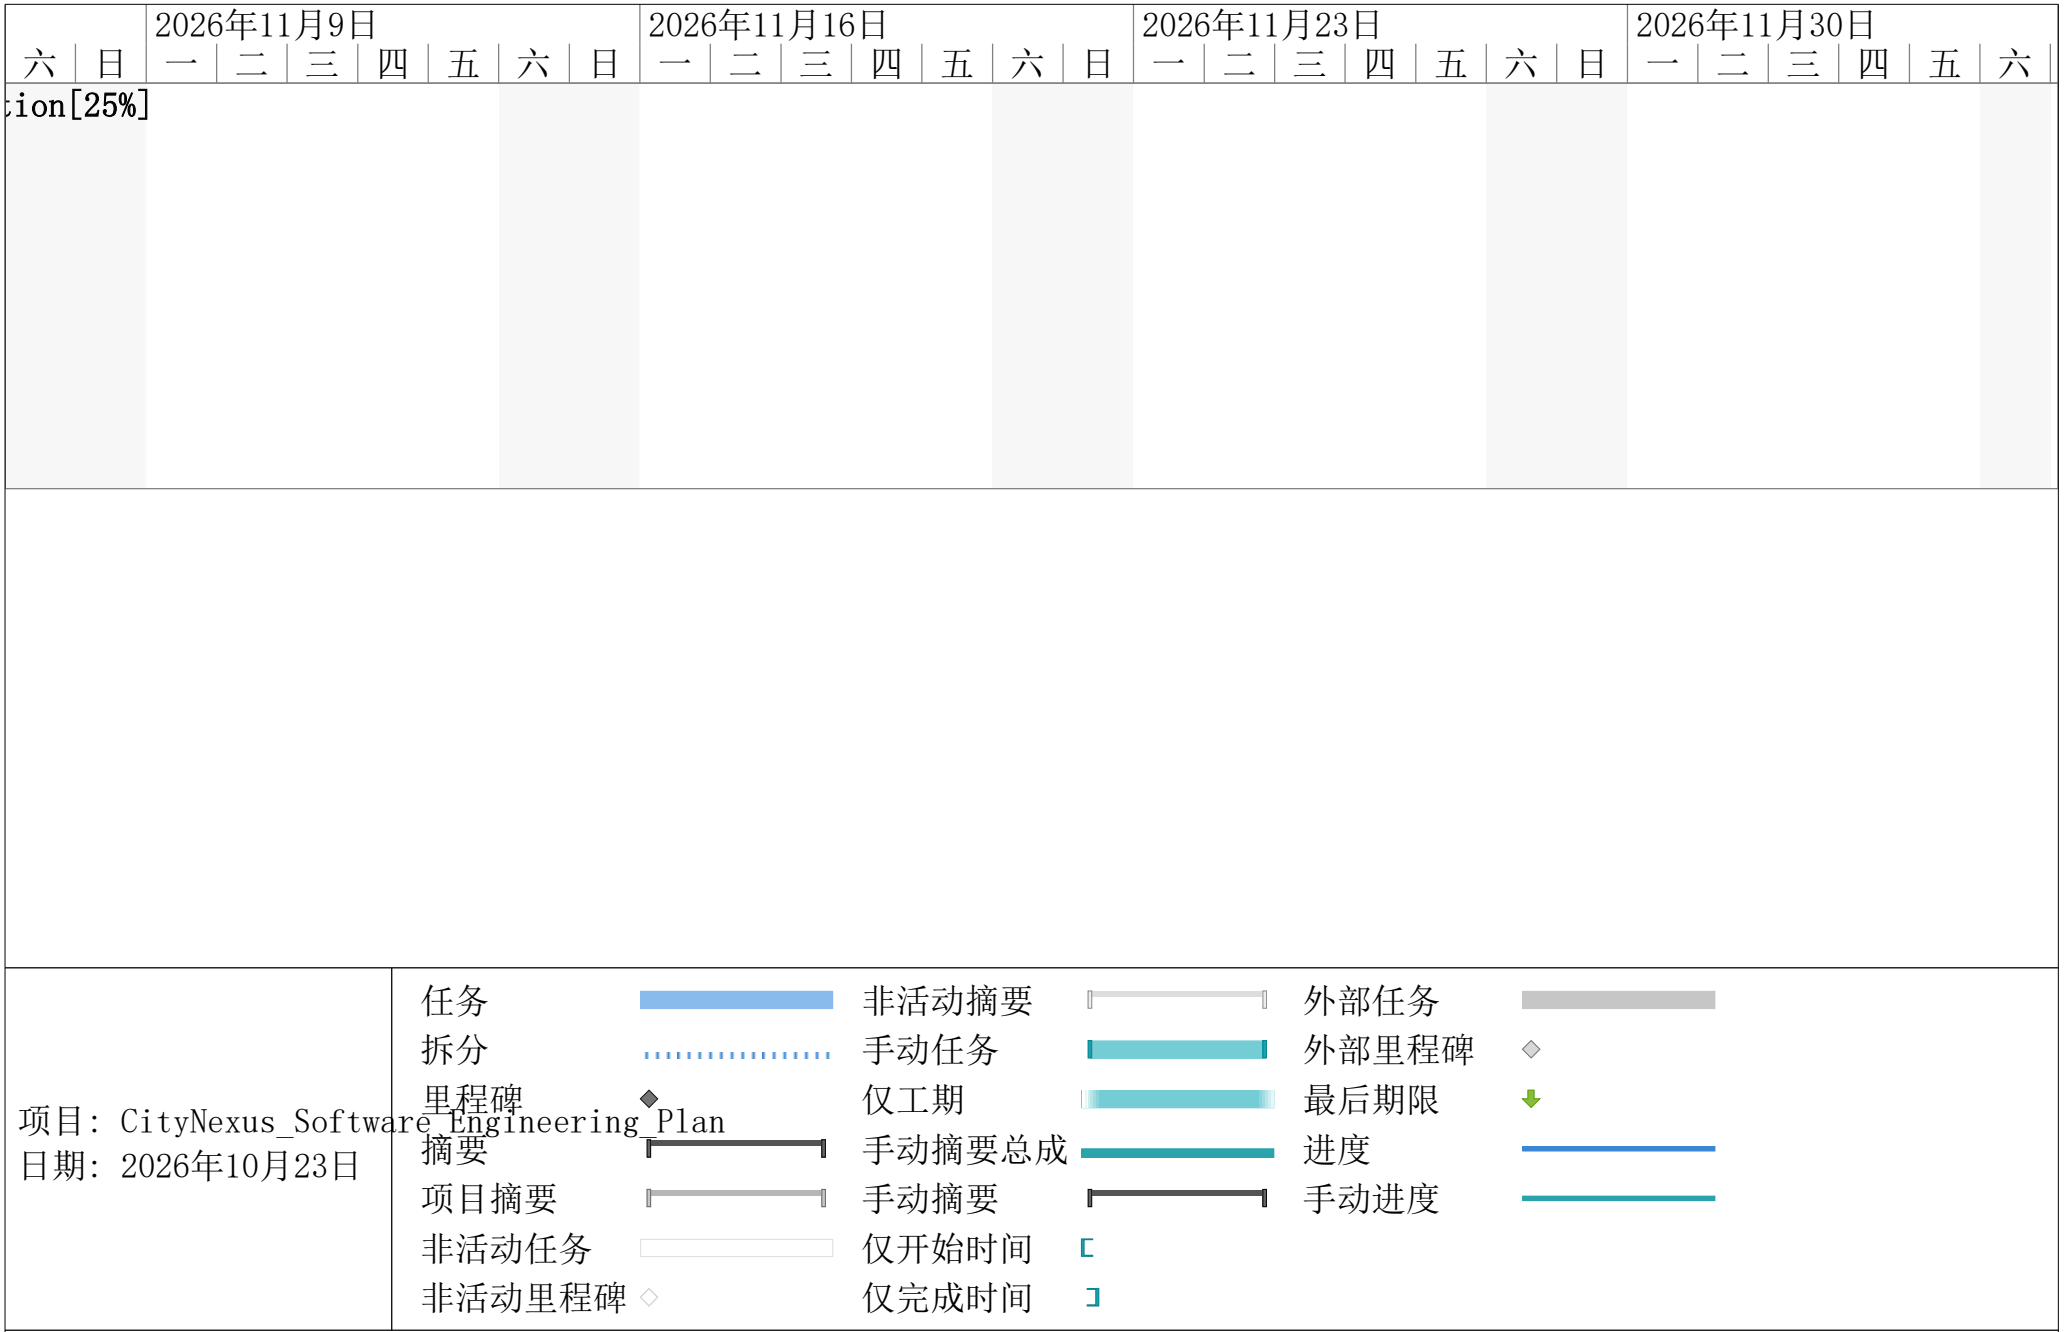
2026年11月9日
2026年11月16日
2026年11月23日
2026年11月30日
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
tion[25%]
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期: 2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

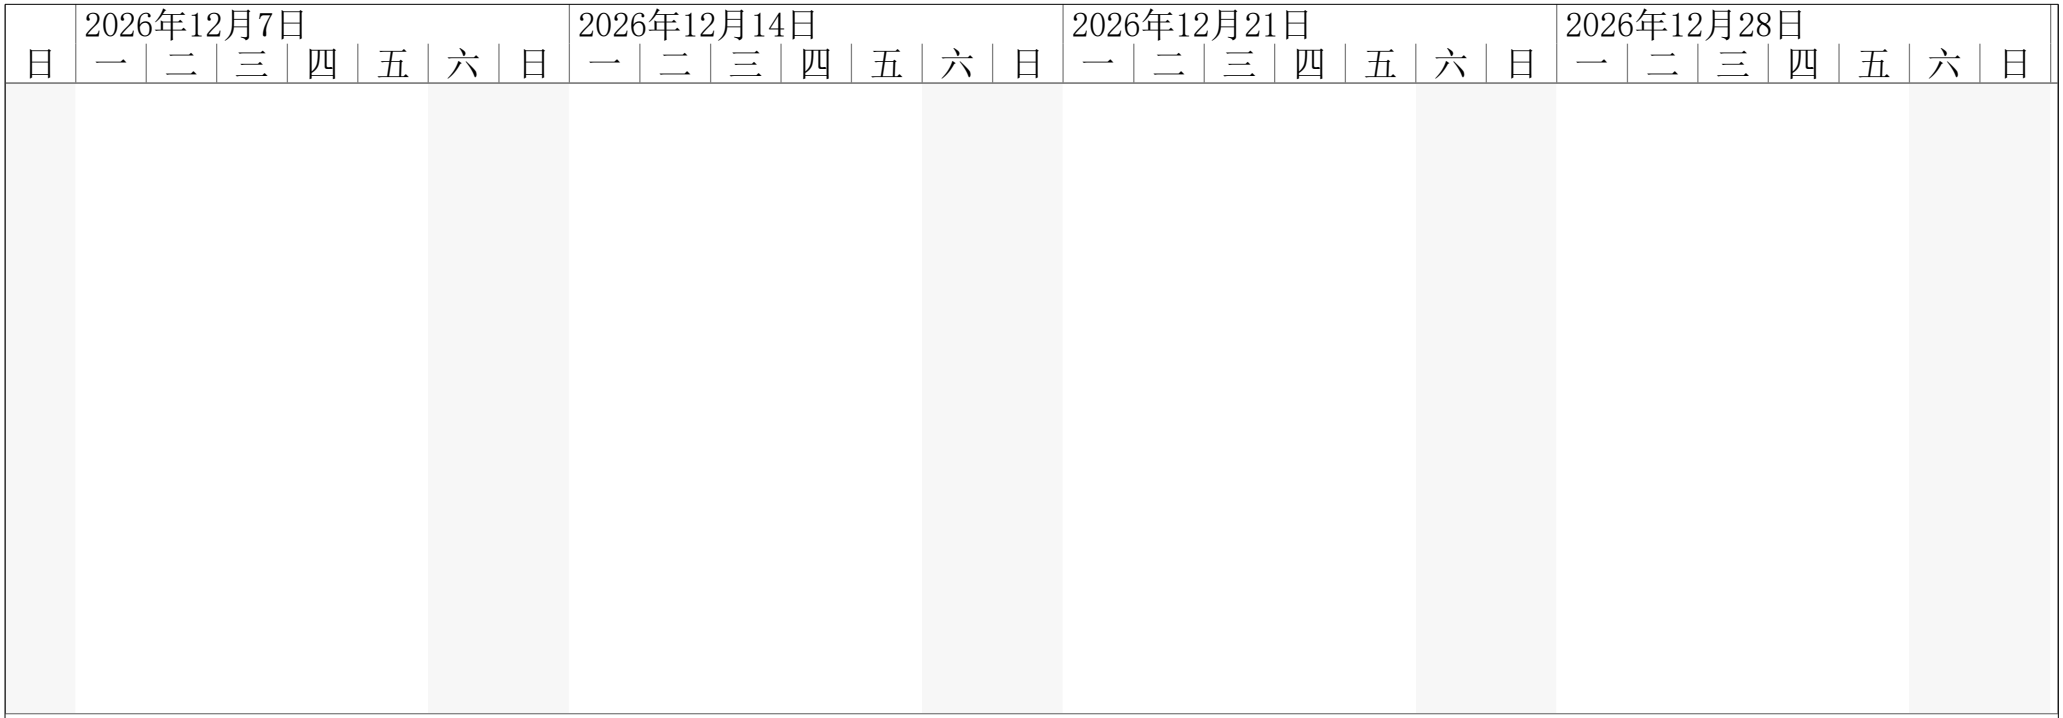


项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

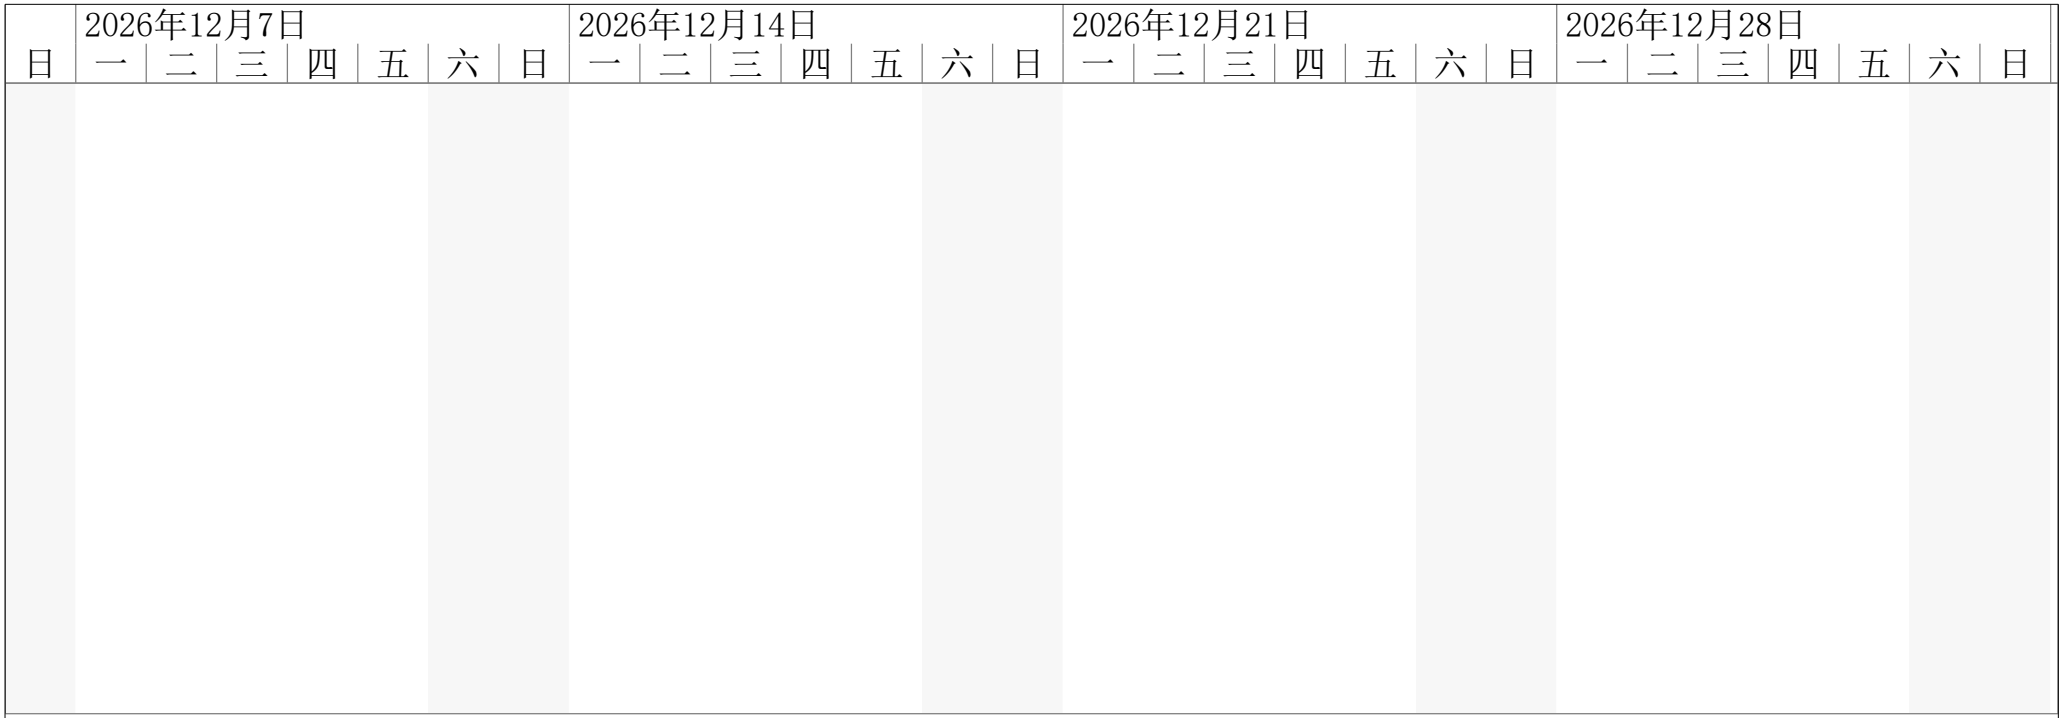

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

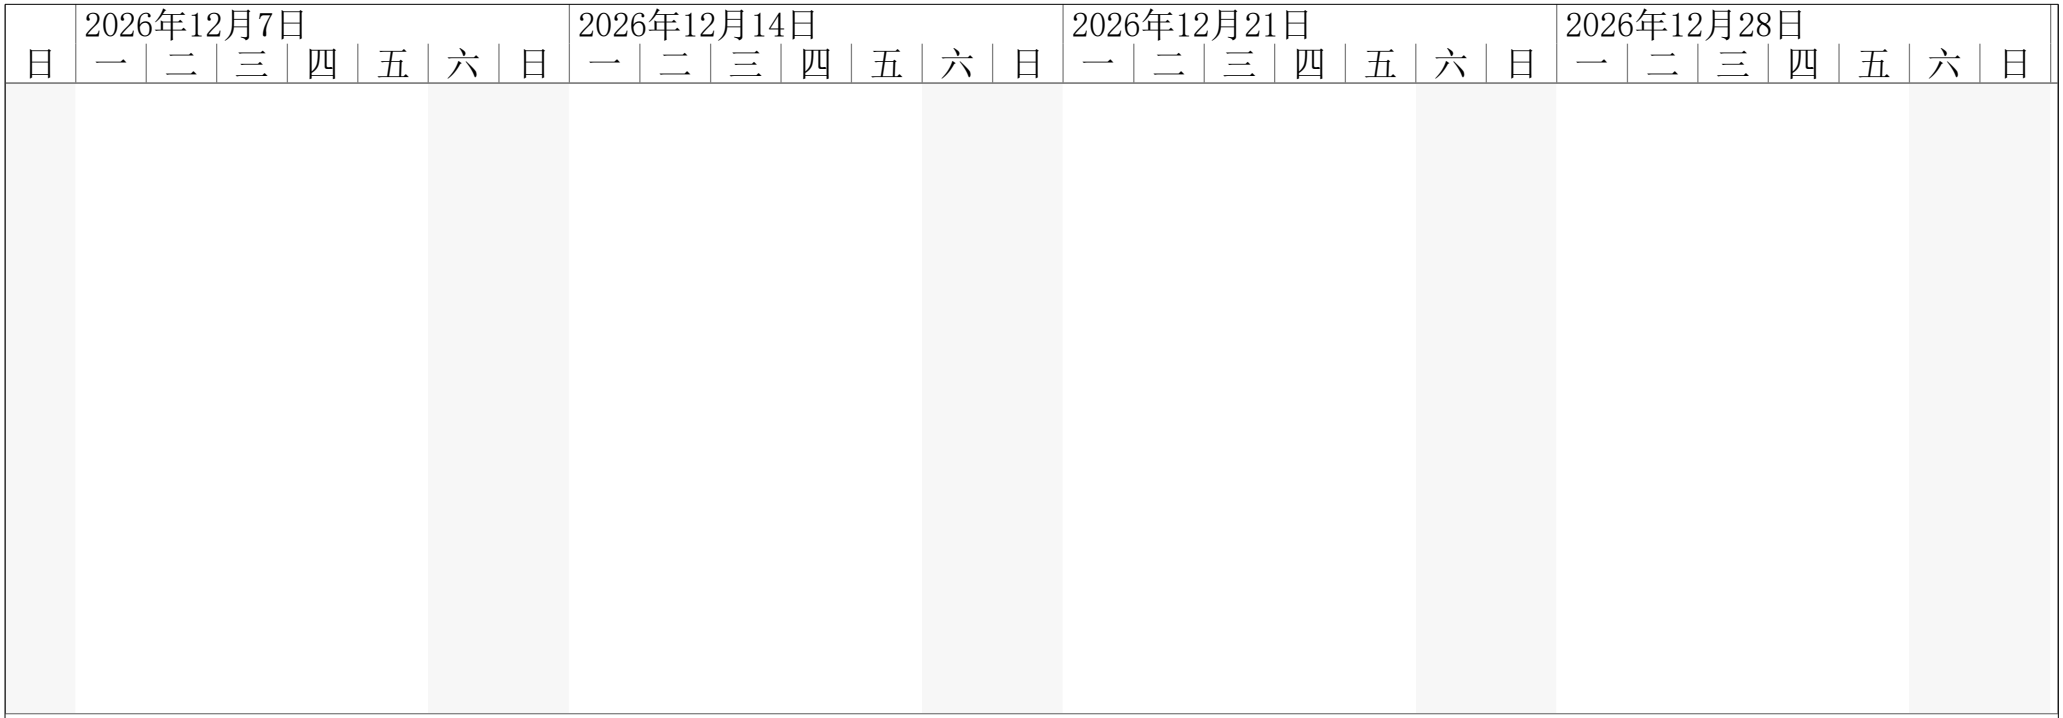

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

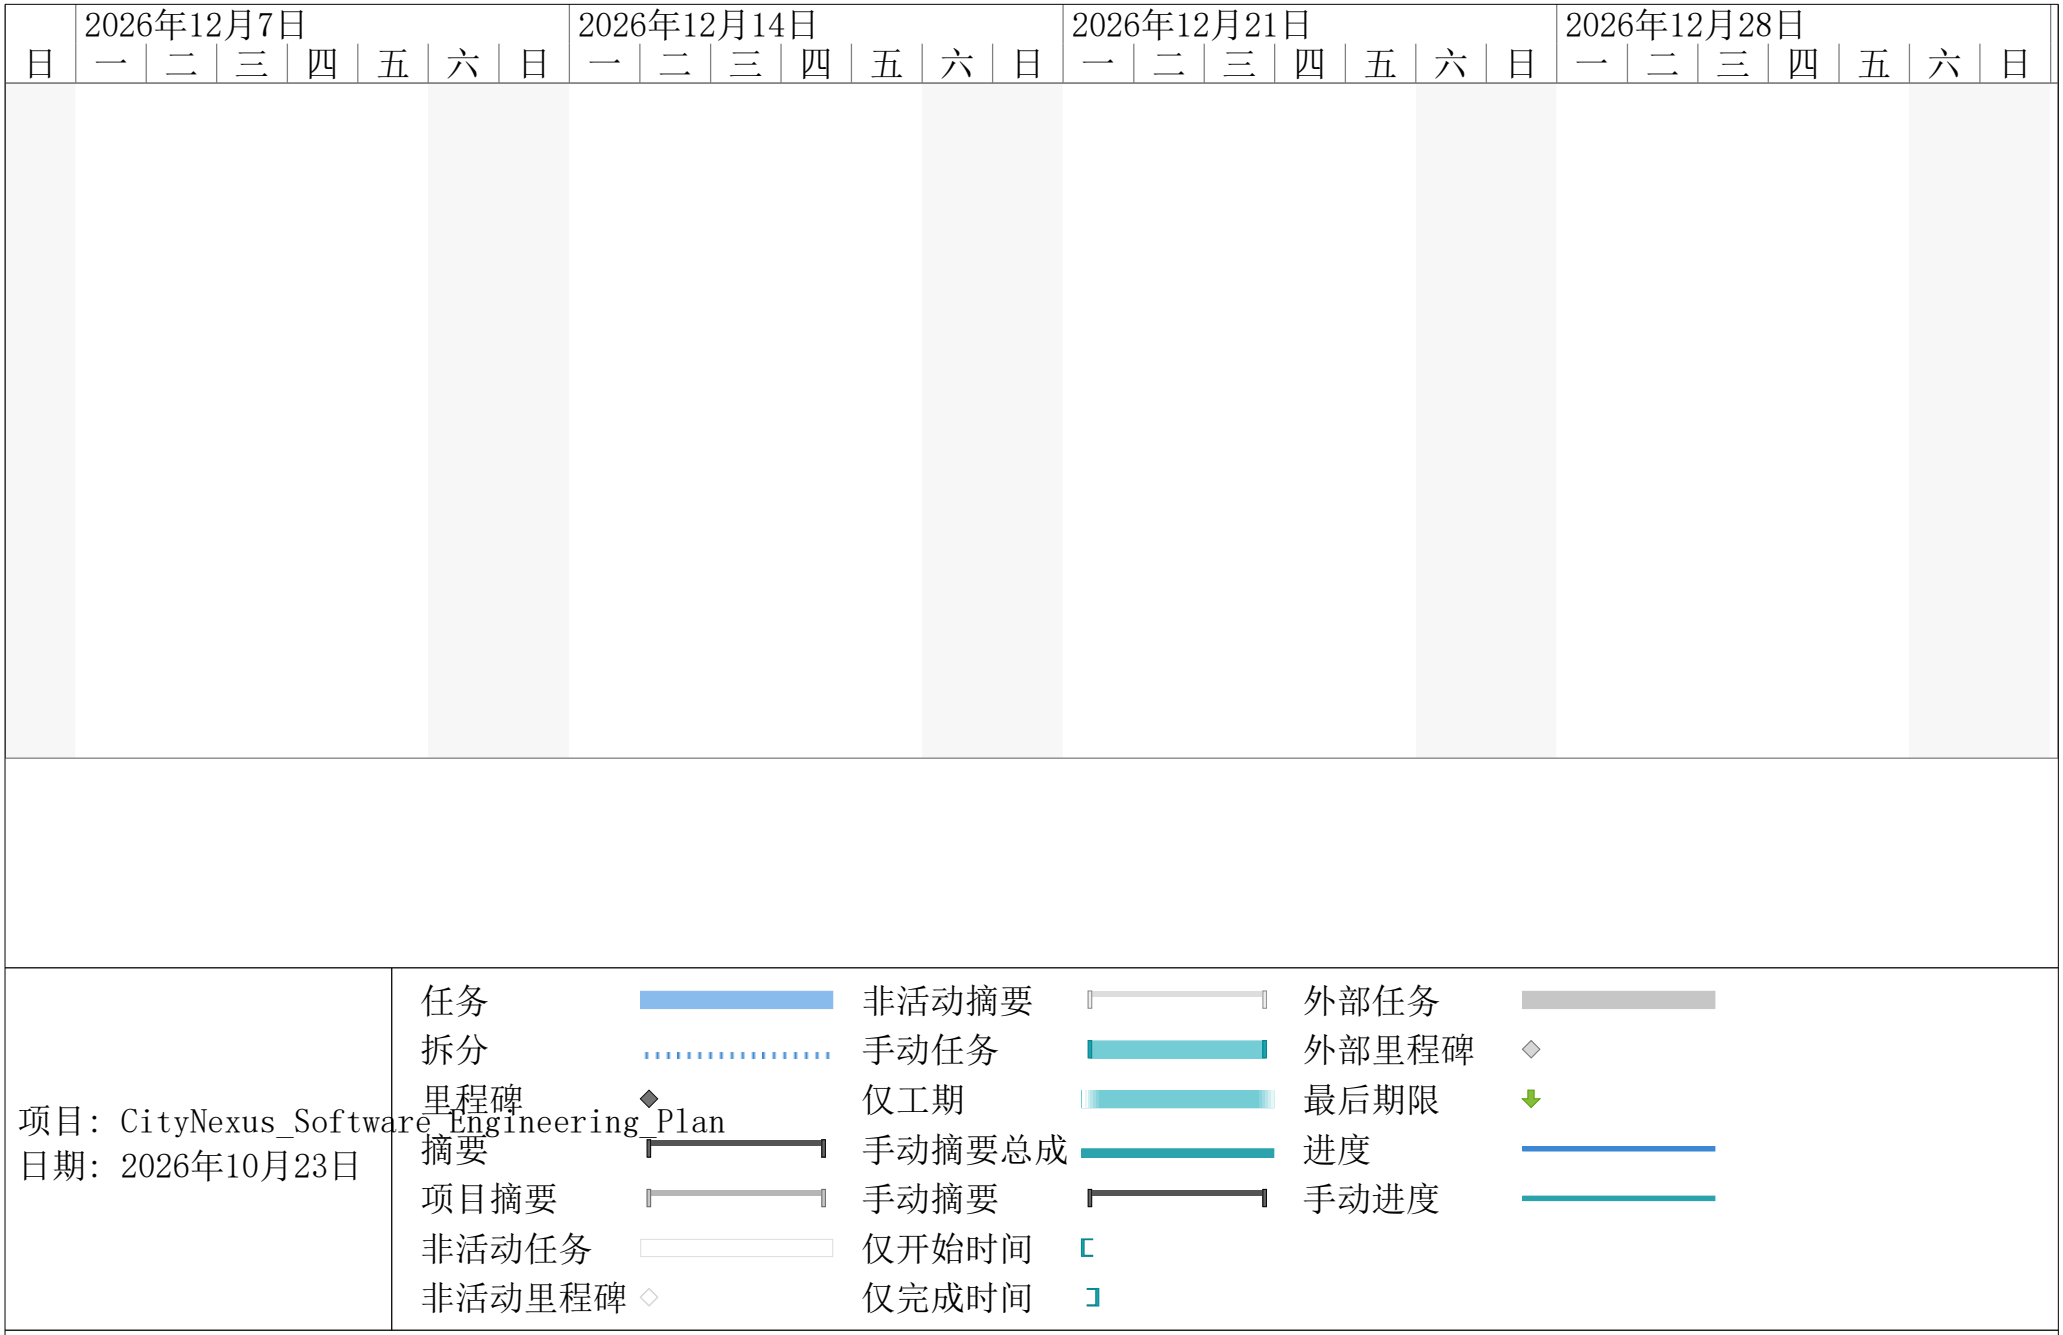

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

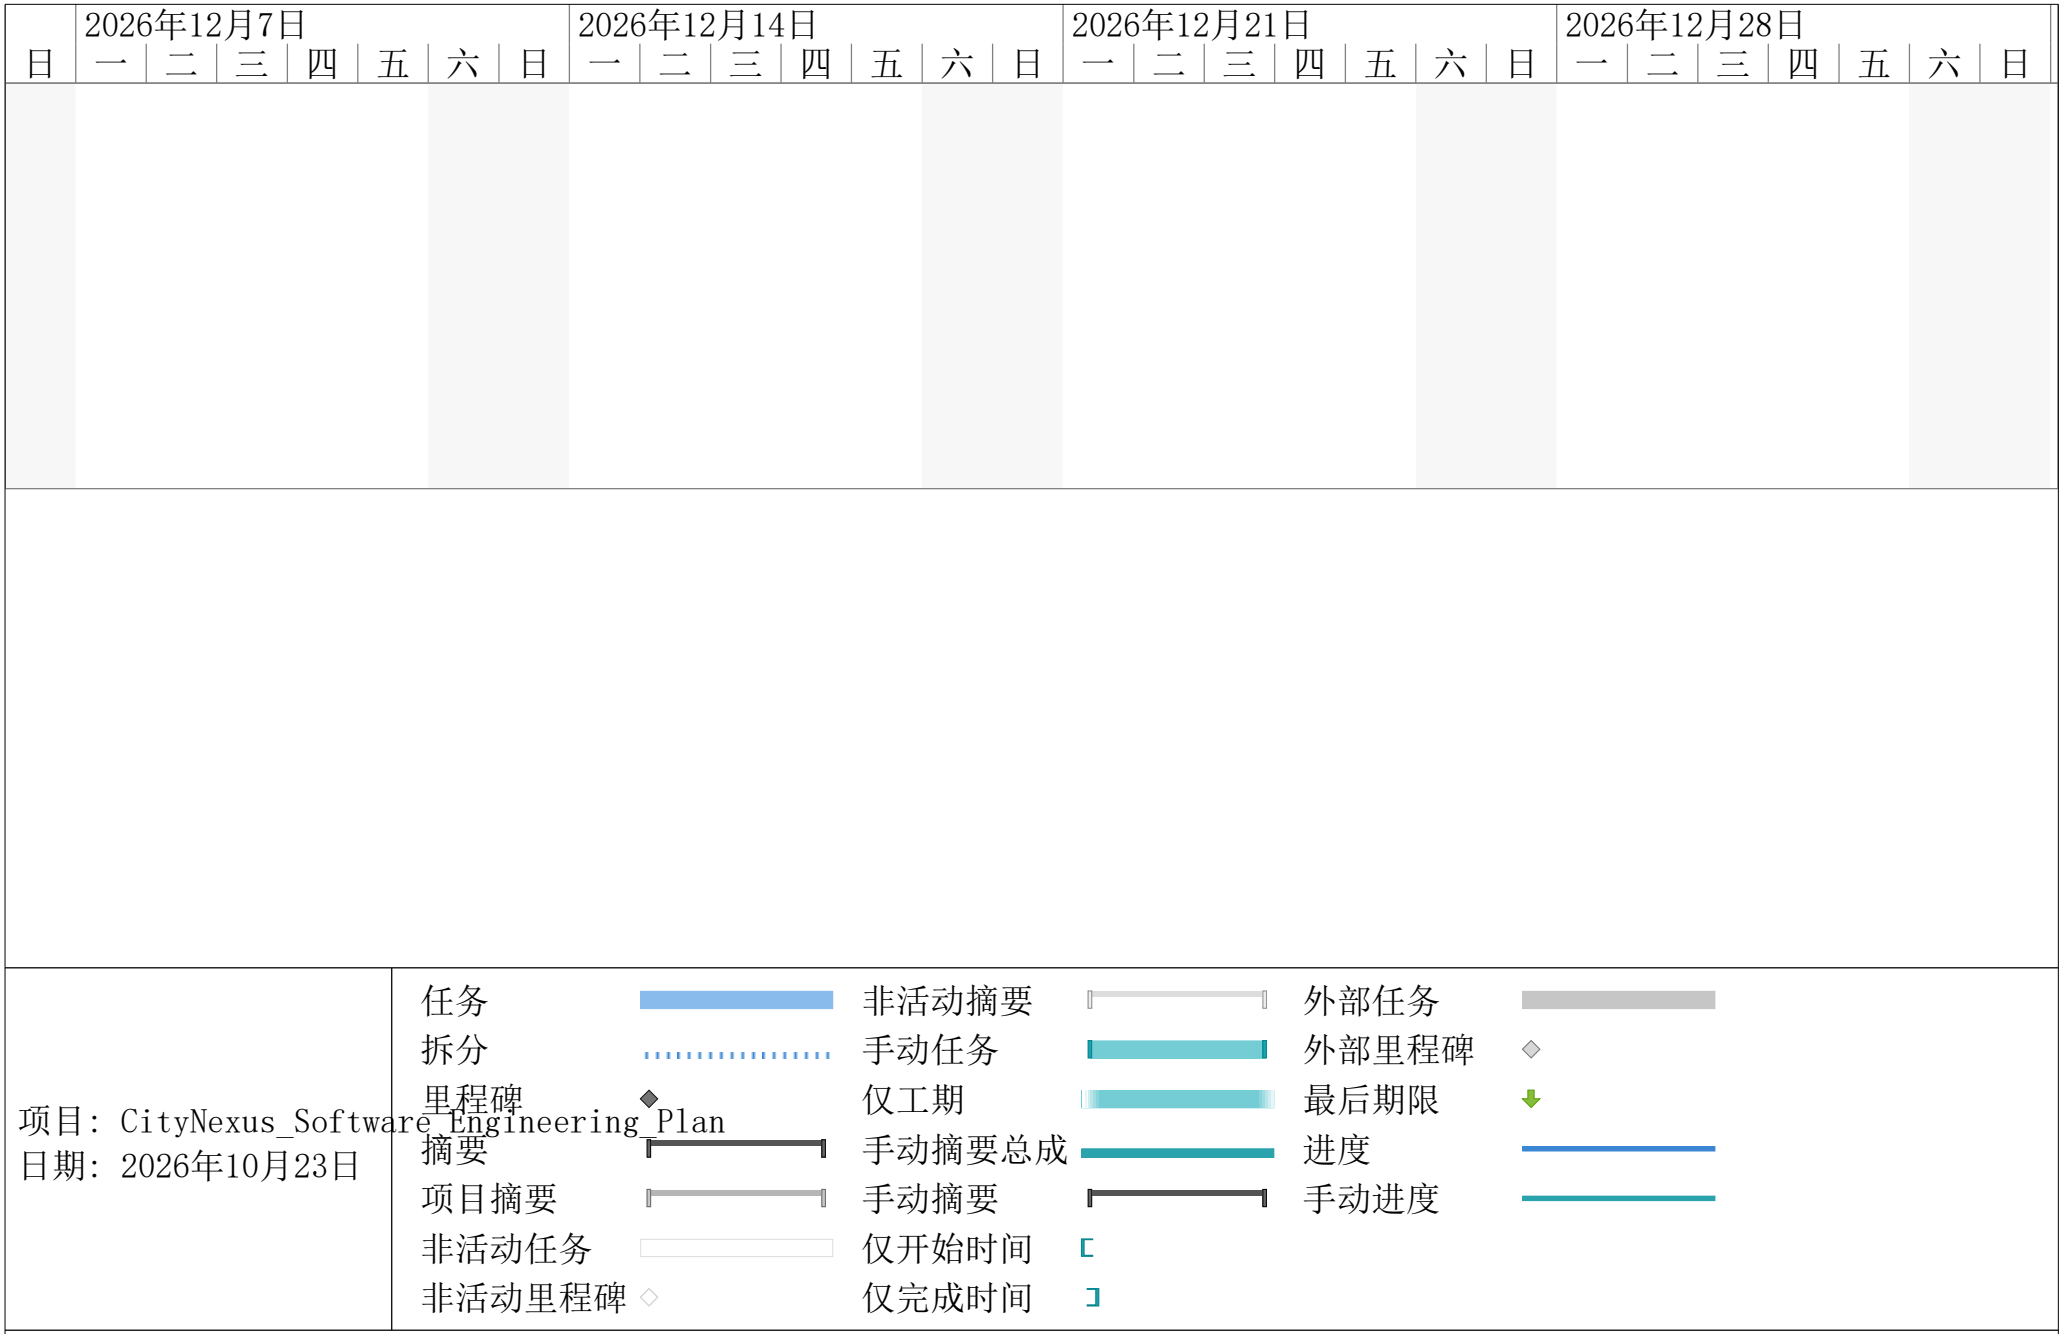
2026年12月7日
2026年12月14日
2026年12月21日
2026年12月28日
日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan
日期：2026年10月23日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度
